# Resumen · 6 de noviembre 2026

**El 6 de noviembre, Santa Rosa promedió 57.54 USD/MWh, 18.4% más que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -15% frente al mismo período de 2025. Para el 7 de noviembre se programan hasta 446 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).**

| Precio de referencia | Demanda máxima | Indisponibilidad | Próxima jornada · 7 de noviembre |
|---|---|---|---|
| **57.54 USD/MWh** | **8,598 MW** | **338 MW** | **446 MW** |
| Santa Rosa 220 · +18.4% diario | pico a las 17:00 h · +900 MW vs 2025 · mes +12.0% vs 2025 | máx. simultáneo · prog. 174 / forz. 17 MW prom. | Chimay · 150 MW · 08:00–12:00 |

## Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 57.54 USD/MWh: +18.4% frente a ayer y 19% sobre el promedio del mes (48.42).
- **Demanda.** Energía del mes 1,098 GWh, +12.0% frente a los mismos 6 días de 2025; máxima del 6 de noviembre 8,598 MW, +900 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,618 MW (+920 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -15% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: San Gaban III (-10.4 GWh), Chimay (-9.0 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 456 MW, -21% frente a 2025.
- **Operación.** Hasta 338 MW fuera de servicio a la vez (02:30 h), de los cuales 52 MW forzados.

## Qué vigilar · 7 de noviembre

**1.** Chimay fuera de servicio (150 MW): normalizacion de la redundancia de los sistema de comunicación de la… (08:00–12:00)

**2.** Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

**3.** Desde el 8 de noviembre: Ventanilla TV 150 MW en mantenimiento

■ **IEOD pendiente:** El IEOD del 06/11 aún no está publicado; se usa el del 05/11.

■ **CMg incompleto:** Solo 41 de 48 intervalos del día tienen CMg publicado.


## Huanchor

- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 46.31 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 98% de la energía; cobertura 98%). Promedio de la misma referencia: 46.55.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 7.4 m3/s (+1%), volumen 145 Hm3 (-16%) vs año anterior.

## Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


| Barra | Día 06/11 | Día anterior | Variación | Promedio mes |
|---|---|---|---|---|
| Santa Rosa 220 | 57.54 | 48.61 | +18.4% | 48.42 |
| Socabaya 220 | 60.77 | 51.85 | +17.2% | 51.35 |
| Piura 220 | 63.50 | 53.48 | +18.7% | 53.26 |


| Santa Rosa 220 kV · bloque | Día 06/11 | Promedio mes |
|---|---|---|
| Punta (18-23 h) | 54.66 | 53.86 |
| Media (6-18 h) | 59.54 | 45.99 |
| Base (23-6 h) | 55.41 | 48.70 |

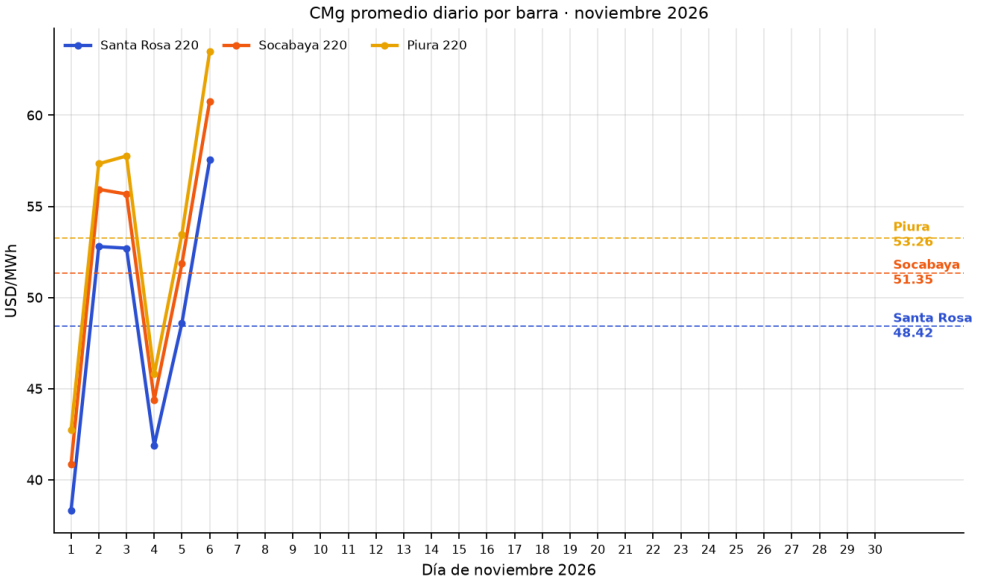



Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes


## Precios: detalle

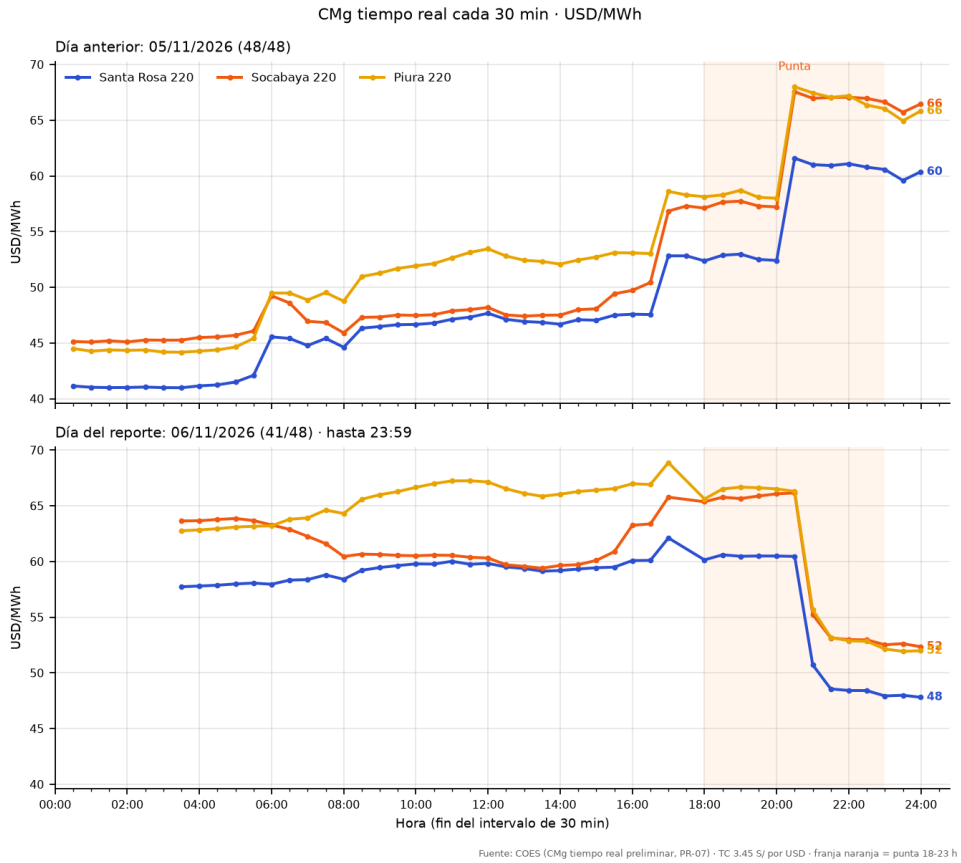

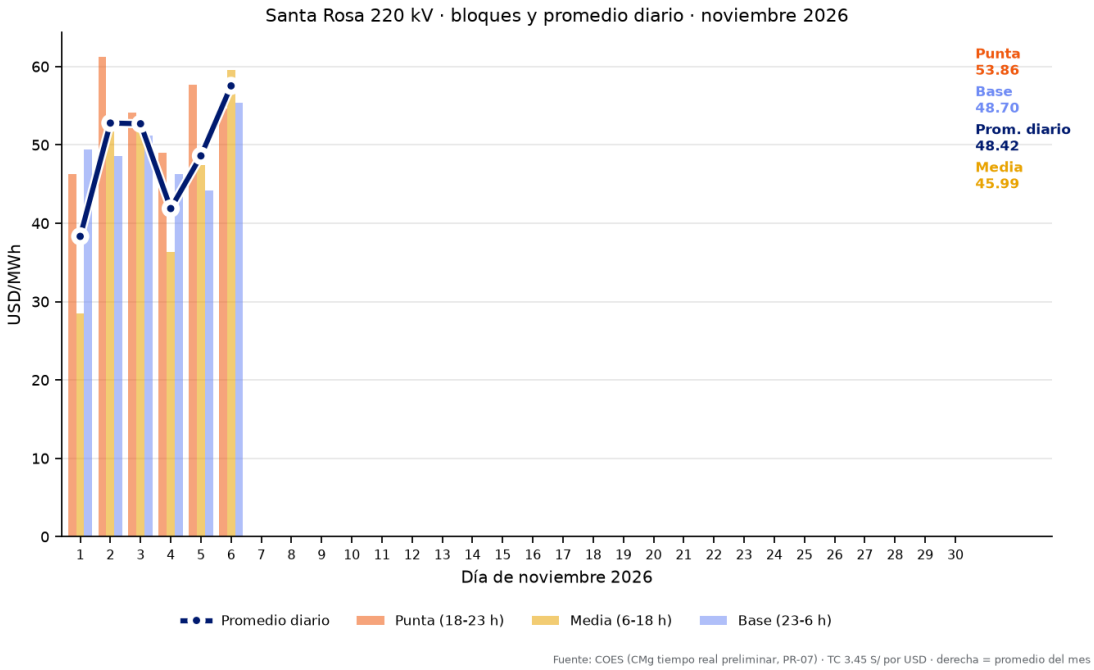



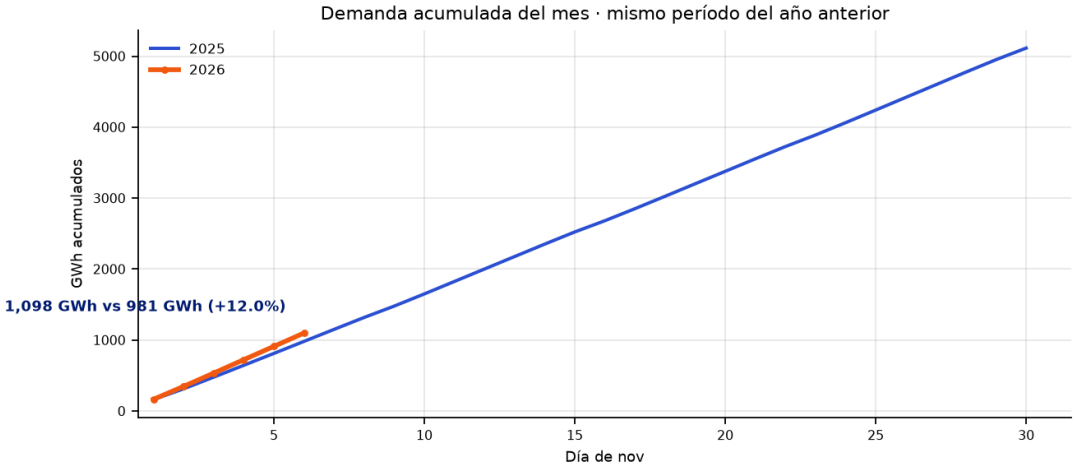
## Oferta y demanda

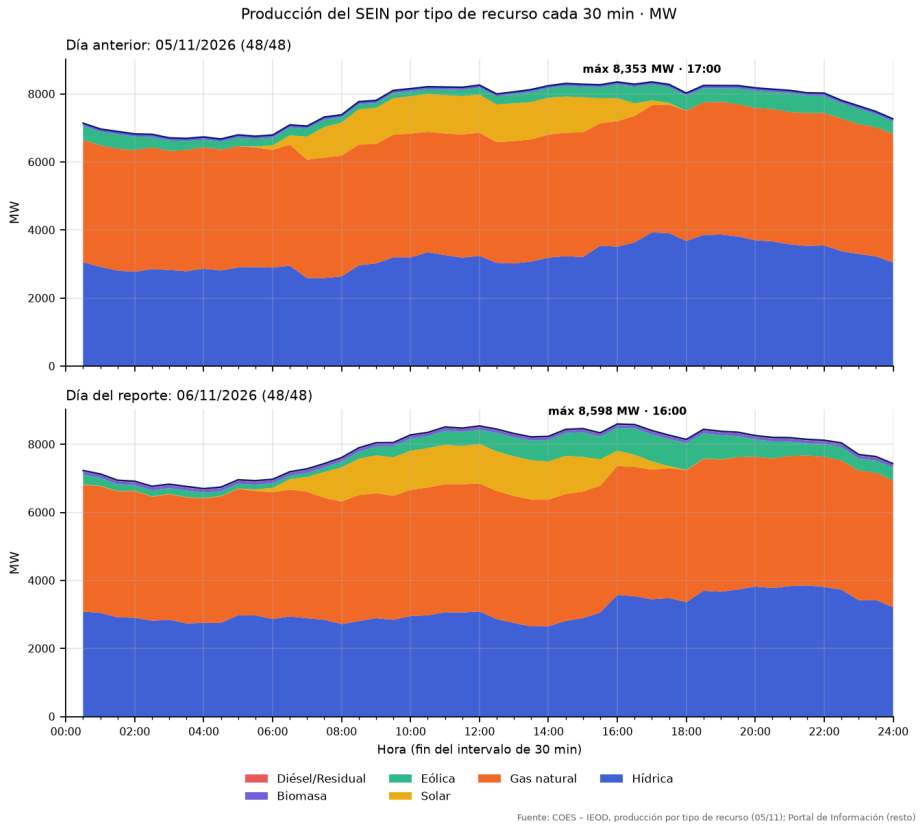

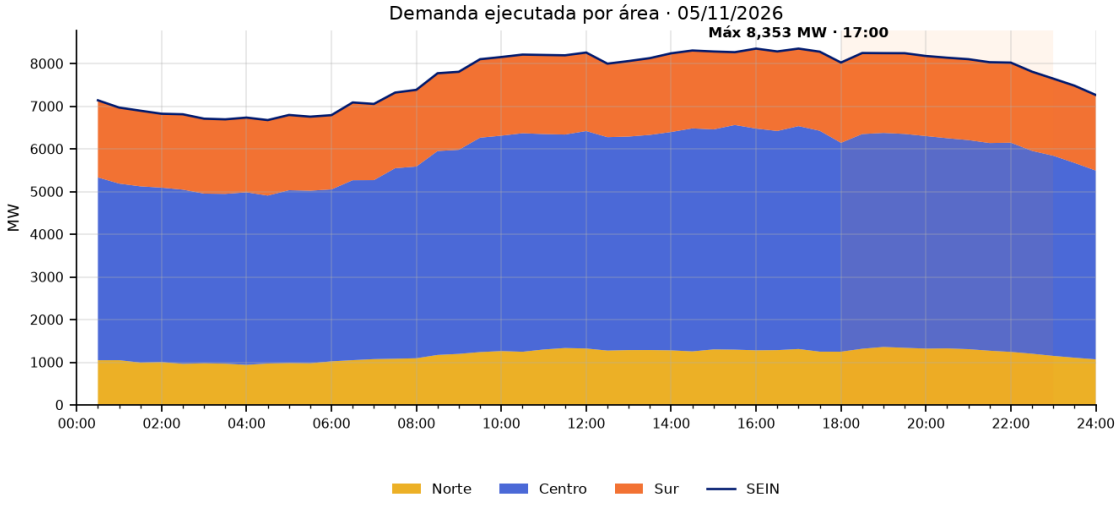



## Demanda vs. año anterior

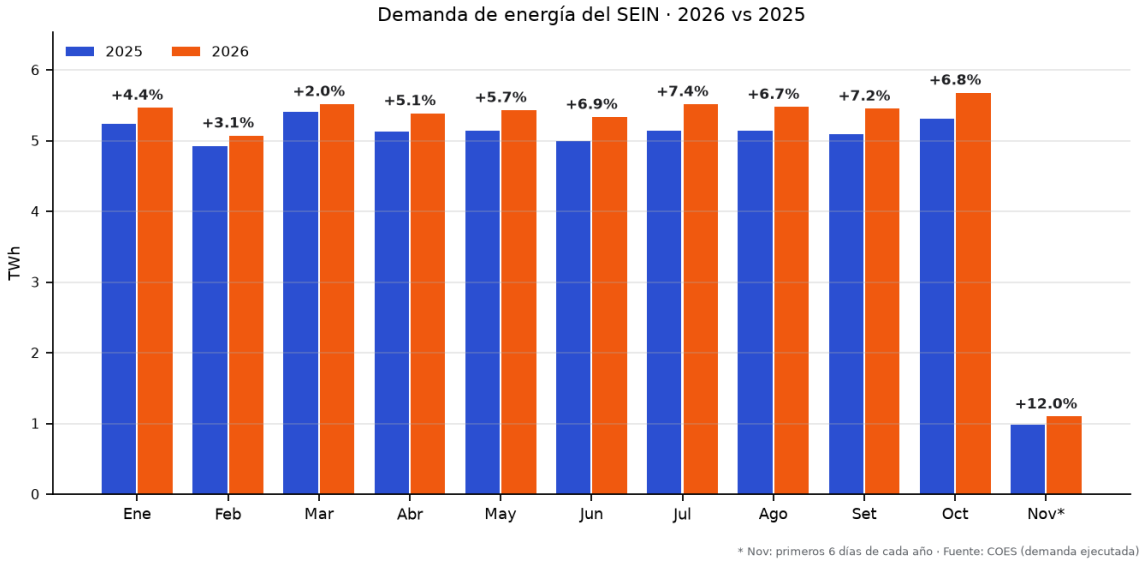



## Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

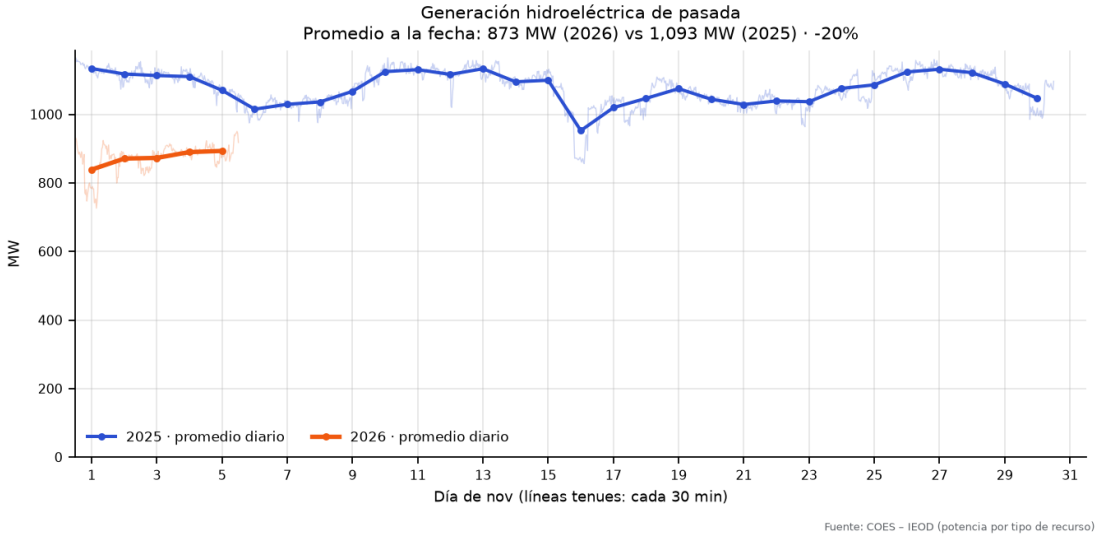


Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

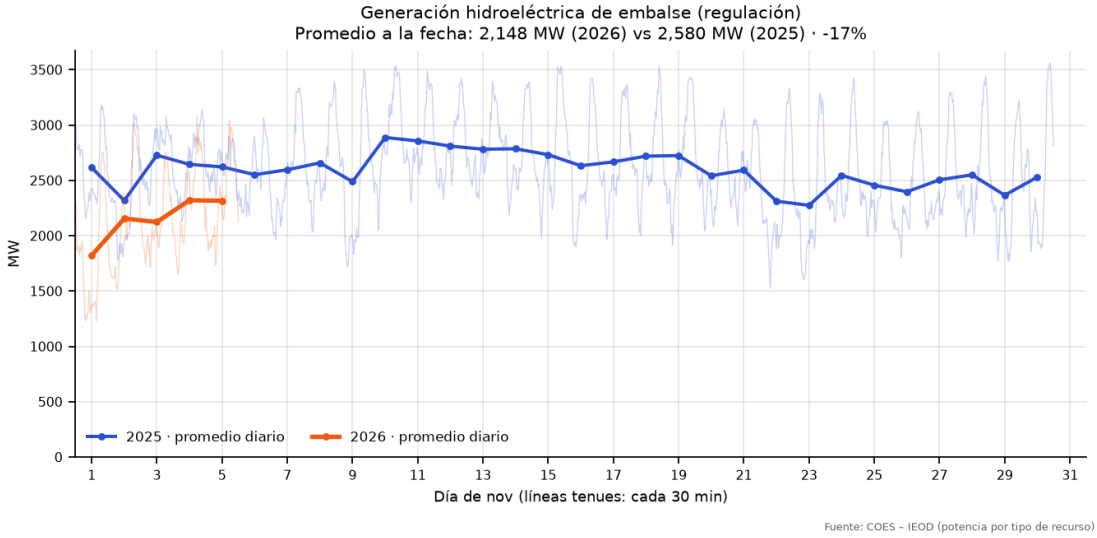


Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

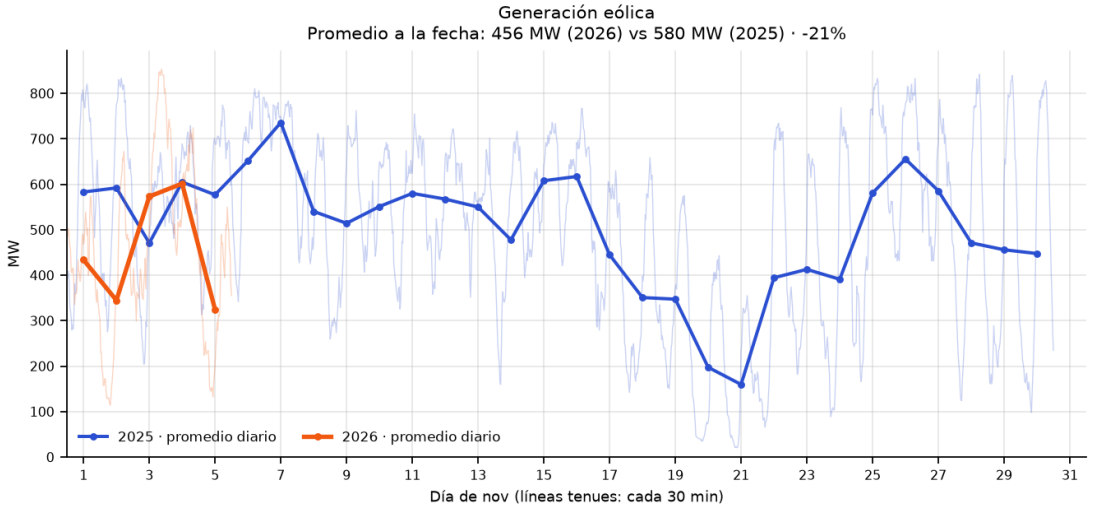


Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

## Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–5 de ambos años, IEOD)

| Central | Empresa | Tipo | GWh 2026 | GWh 2025 | Diferencia | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Gaban III | Hydro Global Perú S.A.C. | Regulación | 12.93 | 23.34 | -10.41 | -45% |
| Chimay | Chinango S.A.C. | Regulación | 8.02 | 17.06 | -9.04 | -53% |
| El Platanal | Celepsa | Regulación | 6.88 | 13.93 | -7.04 | -51% |
| Machupicchu | Egemsa | Pasada | 13.74 | 18.72 | -4.98 | -27% |
| Yaupi | Statkraft S.A | Pasada | 8.78 | 12.68 | -3.90 | -31% |
| Mantaro | Electroperu | Regulación | 70.51 | 74.37 | -3.87 | -5% |
| Yuncan | Engie Energia Peru S.A.A. | Regulación | 7.40 | 10.97 | -3.57 | -33% |
| San Gaban II | San Gaban | Regulación | 9.46 | 13.00 | -3.54 | -27% |
| La Virgen | La Virgen | Regulación | 3.50 | 6.69 | -3.19 | -48% |
| Santa Teresa | Inland Energy Sac | Pasada | 7.16 | 10.14 | -2.99 | -29% |
| Restitución | Electroperu | Pasada | 23.80 | 25.41 | -1.61 | -6% |
| Manta I | Celaris Energy S.A. | Pasada | 0.56 | 2.10 | -1.54 | -73% |
| Charcani IV | Egasa | Pasada | 0.00 | 1.46 | -1.46 | -100% |
| Yanango | Chinango S.A.C. | Pasada | 2.01 | 3.45 | -1.44 | -42% |
| Angel I | Generadora De Energía Del Perú | Pasada | 0.91 | 2.35 | -1.44 | -61% |
| Potrero | Empresa Electrica Agua Azul | Pasada | 0.97 | 2.40 | -1.43 | -60% |
| Angel II | Generadora De Energía Del Perú | Pasada | 1.00 | 2.39 | -1.39 | -58% |
| Angel III | Generadora De Energía Del Perú | Pasada | 1.02 | 2.36 | -1.34 | -57% |
| Cheves | Statkraft S.A | Regulación | 6.95 | 8.02 | -1.07 | -13% |
| Runatullo III | Egejunin | Pasada | 0.78 | 1.82 | -1.04 | -57% |
| Anashironi | Vari Energia S.A.C. | Pasada | 1.48 | 2.41 | -0.94 | -39% |
| Huasahuasi I | Egejunin | Pasada | 0.58 | 1.38 | -0.80 | -58% |
| Runatullo II | Egejunin | Pasada | 0.54 | 1.27 | -0.73 | -57% |
| Cahua | Statkraft S.A | Pasada | 4.13 | 4.86 | -0.73 | -15% |
| Rucuy | Sinersa | Pasada | 1.28 | 1.82 | -0.54 | -30% |

Total hidro: 325.5 GWh vs. 381.0 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

## Indisponibilidades de generación (IEOD del 05/11/2026)

| Máximo simultáneo sin diésel | Promedio del día | Programado / forzado (prom.) | Diésel (excluido, máx.) |
|---|---|---|---|
| **338 MW** | **192 MW** | **174** / **17** MW | **398 MW** |
| a las 02:30 h | 4,597 MWh de capacidad | | |

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (406 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 393 MW · Biomasa 7 MW · Eólica 6 MW

| Empresa | Central | Unidad | Tecnología | Horario | MW | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orygen Peru S.A.A. | Wayra Extension | CENTRAL | Hídrica | 02:26–04:35 | **170.0** | Prog. | Correctivo en Circuito 17 Wayra Extensión |
| Electroperu | Mantaro | G7 | Hídrica | 00:00–24:00 | **101.0** | Prog. | REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA |
| Egasa | Charcani V | G2 | Hídrica | 00:00–24:00 | **48.0** | Prog. | Instalación de repuestos de interruptor de potencia. |
| Egemsa | Machupicchu | G1 | Hídrica | 17:17–20:25 | **29.0** | Forzado | Mantenimiento correctivo del grupo G1, debido al cierre del inyector N°5, este se cerró intempestivamente, condición que |
| Egesur | Aricota I | G2 | Hídrica | 06:36–17:30 | **11.0** | Prog. | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 |
| Egesur | Aricota I | G2 | Hídrica | 17:30–19:31 | **11.0** | Forzado | Ampliación de Mantenimiento Electromecánico I. 19:28 se declara su disponibilidad. |
| Egesur | Aricota I | G2 | Hídrica | 21:00–22:08 | **11.0** | Forzado | Mantenimiento correctivo por incremento de temperatura del Cojinete de Apoyo de la unidad. |
| Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C. | Parque Eolico 3 Hermanas | CENTRAL | Eólica | 00:00–24:00 | **6.3** | Forzado | TH-11 y TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención |
| Energia Renovable Del Sur S.A. | San Juan | CENTRAL | Hídrica | 00:00–24:00 | **5.9** | Forzado | A7.3 Fuera de servicio hasta intervención |
| Energia Renovable Del Sur S.A. | San Juan | CENTRAL | Hídrica | 06:06–08:11 | **5.9** | Forzado | A6.1 - FE1404 YAW not ready stop - Se realizó revisión desde el bottom box y pruebas de funcionalidad. |
| Petramas | Huaycoloro | G1 | Biomasa | 00:00–24:00 | **1.5** | Prog. | MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR |
| Petramas | Huaycoloro | G2 | Biomasa | 00:00–17:52 | **1.5** | Prog. | MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR |
| Petramas | Huaycoloro | G3 | Biomasa | 00:00–24:00 | **1.5** | Prog. | MANTENIMIENTO DE 102000 HRS |
| Petramas | Ctb Callao | G1 CALLAO | Biomasa | 00:00–24:00 | **1.2** | Prog. | MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS |
| Petramas | Doña Catalina | G2 | Biomasa | 00:00–16:10 | **1.2** | Prog. | MANTENIMIENTO DE 48000 HRS |
| Egemsa | Machupicchu | G2 | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | Cambio de sistema de control G2 |
| Egemsa | Machupicchu | G3 | Hídrica | 17:13–24:00 | **0.0** | Forzado | Mantenimiento correctivo del grupo G3, debido a pérdida de comunicación con el gobernador y posterior falla del controla |
| Gr Paino Sociedad Anonima Cerrada | Central Eolica Huambos | CENTRAL | Eólica | 15:44–17:25 | **0.0** | Forzado | F/S por causas externas. |
| Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada | Central Eolica Duna | CENTRAL | Eólica | 15:44–17:25 | **0.0** | Forzado | F/S por causas externas. |
| Kallpa Generacion S.A. | Cerro Del Aguila | G2 | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | MANTENIMIENTO PARCIAL U2 |
| Orazul Energy Perú | Cañón Del Pato | G5 | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | OVERHAUL GENERADOR U5 |
| San Gaban | Pch Tupuri | CENTRAL | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | Mantenimiento Anual de la PCH Tupuri |
| Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A. | Reserva Fria De Generacion Eten | RF-ETE NGT1 | Diésel · excluido | 00:00–24:00 | 213.7 | Prog. | REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1 |
| Minera Cerro Verde | Recka | CENTRAL | Diésel · excluido | 00:00–24:00 | 175.9 | Prog. | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA |

| Empresa | Central | Unidad | Tecnología | Horario | MW | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electroperu | Tumbes | MAK2 | Diésel · excluido | 00:00–24:00 | 8.5 | Prog. | CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4 |

# Transmisión ≥220 kV y eventos

## Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

| Línea | kV | Empresa | Tramo | Horario | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-5033 | 500 | Transmantaro | Poroma - Yarabamba | 00:00–24:00 | E/S | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA. |
| L-2021 | 220 | Compa?Ia Minera Antapaccay S.A. | Tintaya Nueva - Antapacay | 07:04–17:45 | F/S | - Mantenimiento rutinario y Limpieza manual de aisladores y ferreteria de las estructuras. LT 2021 - 220kV (T2, T3, T4, |
| L-2037 | 220 | Atn S.A. | Rubi - Montalvo | 07:14–15:40 | E/S | Medicion SPAT |
| L-2091 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Desierto | 00:00–24:00 | F/S | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON |
| L-2120 | 220 | Inti Joya S.A.C. | San Jose - America | 00:00–24:00 | E/S | Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas |
| L-2130 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Huancavelica - Chiribamba | 00:00–24:00 | E/S | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS |
| L-2211 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Ica - Derivacion | 00:00–24:00 | E/S | SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE |
| L-2220 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Campo Armi?O - Huayucachi | 08:50–18:03 | E/S | SE CAMPO ARMI?O CL-2220: POA RENOVACION DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA OPLAT, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO ME |
| L-2242 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Ventanilla - Zapallal | 07:06–17:00 | F/S | REEMPLAZO DE FIBRA OPTICA OPGW ENTRE LAS TORRES T-12 A T-15 POR CORROSION G3, REQUIERE L-2243 CON RECIERRES DESHABILITAD |
| L-2254 | 220 | Isa Peru | Vizcarra - Paragsha 2 | 07:48–15:11 | F/S | POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679) |
| L-2280 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Alipio Rosales - Machala | 00:00–24:00 | E/S | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. |
| L-2283 | 220 | Atn S.A. | Cajamarca Norte - Pampa Honda | 07:48–12:22 | E/S | Tala de arboles |
| L-2287 | 220 | Atn S.A. | Cajamarca Norte - Pampa Honda | 07:48–12:22 | E/S | Tala de arboles |
| L-2303 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San Jose - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea. |
| L-2304 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San Jose - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea. |
| L-2305 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Independencia | 00:00–24:00 | E/S | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL |

## Eventos relevantes del día


| Tipo | Empresa | Equipo | Horario | kV | MW | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | Conelsur Lt Sac | SS.EE. · Portillo | 00:00–03:13 | | | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |
| Evento | Conelsur Lt Sac | SS.EE. · Portillo | 08:07–24:00 | | | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |
| Evento | Electro Oriente | L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto | 10:15–22:52 | | | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |
| Falla | Electroperu | L-6664 · Zorritos - Máncora | 03:22–03:35 | 60 | 4.0 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6664 (ZORRITOS - MÁNCORA) DE 60 kV |
| Falla | Gr Paino Sociedad Anonima Cerrada | TR-1011 · Duna Huambos | 15:44–17:25 | 138 | | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-1011 138/33 kV DE LA S.E. DUNA HUAMBOS |

## Restricciones operativas vigentes

| Empresa | Ubicación | Equipo | Horario | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Chinango S.A.C. | C.H. Chimay | CENTRAL | 00:00–24:00 | .Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en |
| Egasa | S.E. Convertidor | BARRA138 KV | 00:00–24:00 | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento. |
| Empresa De Generacion Huallaga | C.H. Chaglla | CENTRAL | 00:00–24:00 | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas | TG4 | 00:00–24:00 | Según correo del 03/11, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas | TG4 | 00:00–24:00 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18 |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas 1 | TG6 | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo informado por correo el 01.10.2026 la CT Malacas TG6 presenta una limitación de 40 MW por te |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Reserva Fria De Generacion Talara | TG5 | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas. |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Quitaracsa | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Yuncán | G2 | 00:00–24:00 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Yuncán | G3 | 00:00–24:00 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Yuncán | G3 | 00:00–24:00 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 1 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 1 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho. |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 1 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 2 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera |
| Fenix Power Perú | C.T. Fenix | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s |
| Kallpa Generacion S.A. | C.H. Cerro Del Aguila | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = |
| Kallpa Generacion S.A. | C.H. Mini Central Cerro Del Aguila | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T |
| Kallpa Generacion S.A. | C.H. Mini Central Cerro Del Aguila | CENTRAL | 00:00–24:00 | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre. |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Kallpa | CENTRAL | 00:00–24:00 | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Kallpa | CENTRAL | 00:00–24:00 | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Kallpa | CENTRAL | 00:00–24:00 | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho. |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Las Flores | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Las Flores | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h |
| … | | | | |

## Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 43 · 24/10 al 30/10/2026 · dato diario: IEOD)

| Cuenca | Semana | Caudal natural (m3/s) y var. | Volumen (Hm3) | Año ant. | Var. | Dato diario IEOD (Hm3) | Potencia instalada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa | sem. 43 | 57.3 -13% | 13.8 | 18.3 | -24% | solo semanal | 395.3 MW |
| Mantaro | sem. 43 | 76.9 -31% | 114.9 | 138.0 | -17% | 91.4 (05/11) -8% | 1,571.3 MW |
| Rímac | sem. 43 | 7.4 +1% | 144.9 | 173.3 | -16% | solo semanal | 738.3 MW |
| San Gabán | sem. 43 | 11.8 -38% | 19.4 | 11.2 | +73% | 19.2 (05/11) +69% | 387.2 MW |
| Chaglla | sem. 43 | 44.3 -35% | 2.5 | 7.8 | -67% | 7.0 (05/11) -9% | 456.4 MW |

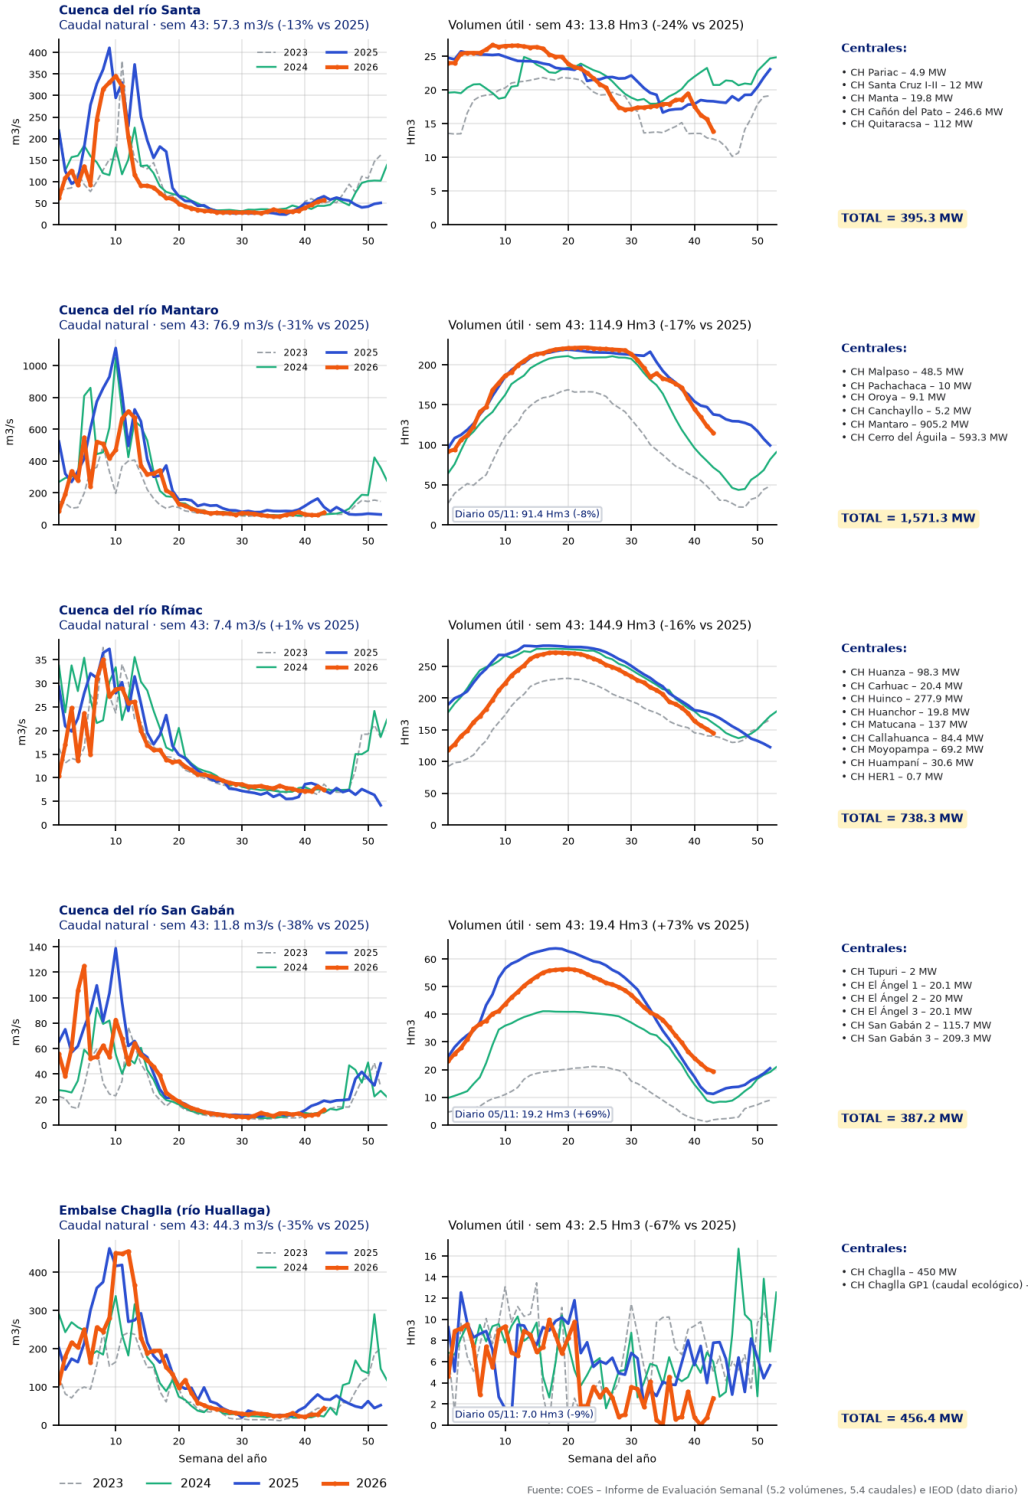


Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

# Programación · sábado 7 de noviembre de 2026

## Generación · intervenciones con MW indisponibles (11 sin MW no se muestran)

| Empresa | Central | Unidad | Horario | MW | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A. | Reserva Fria De Generacion Eten | RF-ETENG T1 | 00:00–24:00 | 217.1 | REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1 |
| Minera Cerro Verde | Recka | CENTRAL | 00:00–24:00 | 175.9 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA |
| Chinango S.A.C. | Chimay | CENTRAL | 08:00–12:00 | 150.0 | NORMALIZACION DE LA REDUNDANCIA DE LOS SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA TARJETAS DE CONTROL |
| Electroperu | Mantaro | G7 | 00:00–24:00 | 101.0 | REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA |
| Electroperu | Mantaro | G1 | 07:00–17:30 | 101.0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS |
| Chinango S.A.C. | Chimay | G2 | 08:00–16:00 | 75.0 | ALISADO DE ANILLOS ROTORICOS DEL GENERADOR |
| Egasa | Charcani V | G3 | 00:00–24:00 | 48.0 | Instalación de repuestos de interruptor de potencia. |
| Egasa | Charcani V | G3 | 07:00–15:00 | 48.0 | Mantenimiento Electromecánico Plan 3 (Primera parte) |
| Engie Energia Peru S.A.A. | Punta Lomitas | CENTRAL | 00:00–24:00 | 23.4 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS |
| Egasa | Chilina D | CENTRAL | 07:00–16:00 | 22.7 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves |
| Egesur | Aricota II | G1 | 06:30–13:30 | 10.6 | UNIDAD INDISPONIBLE - RESERVA / MANTENIMIENTO DE SUB ESTACIÓN ARICOTA II |
| Electroperu | Tumbes | MAK2 | 00:00–24:00 | 8.5 | Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026) |
| Empresa De Generacion Huallaga | Pch Chaglla | GP1 | 06:00–18:00 | 6.4 | F/S POR LIMPIEZA DE ASILADORES POSTES EXTERIOR PCH (previo a AVENIDA) |
| Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada | Central Eolica Duna | CENTRAL | 00:00–24:00 | 2.6 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR |
| Infraestructuras Y Energias Del Peru S.A.C. | Reserva Fria Pto Maldonado | G1-G11 | 09:00–10:00 | 1.8 | Pruebas con carga a 1.8MW con la unidad G-11, después de su mantenimiento anual |
| Petramas | Huaycoloro | G1 | 00:00–24:00 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR |
| Petramas | Ctb Callao | G1 CALLAO | 00:00–24:00 | 1.2 | MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS |

## Líneas de transmisión ≥220 kV

| Línea | kV | Empresa | Tramo | Horario | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-5031 | 500 | Transmantaro | Colcabamba - Poroma | 08:00–16:00 | F/S | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR R-35. (R0105039) |
| L-5031 | 500 | Transmantaro | Colcabamba - Poroma | 08:00–16:00 | F/S | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA CL-R35. (R0112497) |
| L-5031 | 500 | Transmantaro | Colcabamba - Poroma | 08:00–16:00 | F/S | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR -R29. (R0124583) |
| L-5033 | 500 | Transmantaro | Poroma - Yarabamba | 00:00–24:00 | E/S | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA. |
| L-2020 | 220 | Compañia Minera Antapaccay S.A. | Tintaya Nueva - Antapacay | 07:00–17:00 | F/S | - Mantenimiento rutinario y Limpieza manual de aisladores y ferretería de las estructuras. LT 2020 - 220kV (T3, T4, T6, |
| L-2091 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Desierto | 00:00–24:00 | F/S | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON |
| L-2120 | 220 | Inti Joya S.A.C. | San Jose - America | 00:00–24:00 | E/S | Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas |
| L-2130 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Huancavelica - Chiribamba | 00:00–24:00 | E/S | RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS |
| L-2211 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Ica - Derivacion | 00:00–24:00 | E/S | SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE |

| Línea | kV | Empresa | Tramo | Horario | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-2232 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chimu - Chimbote 1 | 08:00–24:00 | F/S | POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE |
| L-2242 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Ventanilla - Zapallal | 07:00–17:00 | F/S | REEMPLAZO DE FIBRA ÓPTICA OPGW ENTRE LAS TORRES T-12 A T-15 POR CORROSION G3, REQUIERE L-2243 CON RECIERRES DESHABILITAD |
| L-2254 | 220 | Isa Peru | Vizcarra - Paragsha 2 | 08:00–17:00 | F/S | POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679) |
| L-2260 | 220 | Conelsur Lt Sac | Trujillo Norte - Cajamarca Norte | 07:30–24:00 | F/S | CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERÍA, SPAT Y PINTADOT47 A T82 |
| L-2260 | 220 | Conelsur Lt Sac | Trujillo Norte - Cajamarca Norte | 07:30–17:30 | F/S | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES |
| L-2280 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Alipio Rosales - Machala | 00:00–24:00 | E/S | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. |
| L-2303 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San José - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea. |
| L-2304 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San José - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea. |
| L-2305 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Independencia | 00:00–24:00 | E/S | BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL |
