Resumen · 4 de noviembre 2026

El 4 de noviembre, Santa Rosa promedió 41.89 USD/MWh, 20.5% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -15% frente al mismo período de 2025. Para el 5 de noviembre se programan hasta 357 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 02:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 5 de noviembre
41.89 USD/MWh	**8,618 MW**	**308 MW**	**357 MW**
Santa Rosa 220 · -20.5% diario	pico a las 11:30 h · +1,030 MW vs 2025 · mes +12.3% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 207 / forz. 63 MW prom.	Wayra Extension · 170 MW · 02:00–06:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 41.89 USD/MWh: -20.5% frente a ayer y 10% bajo el promedio del mes (46.43).
- **Demanda.** Energía del mes 723 GWh, +12.3% frente a los mismos 4 días de 2025; máxima del 4 de noviembre 8,618 MW, +1,030 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,618 MW (+1,030 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -15% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: San Gaban III (-8.7 GWh), Chimay (-7.7 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 488 MW, -13% frente a 2025; el 4 de noviembre promedió 602 MW.
- **Operación.** Hasta 308 MW fuera de servicio a la vez (07:30 h), de los cuales 80 MW forzados.

Qué vigilar · 5 de noviembre

1. Wayra Extension fuera de servicio (170 MW): correctivo en circuito 17 wayra extensión (02:00–06:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. Desde el 7 de noviembre: Santa Rosa II TG8 190 MW en mantenimiento


Huanchor

- Huanchor generó **393.6 MWh** (-3% vs mismo día 2025); en el mes 1,455 MWh (-14.9%).
- Precio capturado del día 41.33 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 15,952 USD, cobertura 98% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 45.88 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 98% de la energía; cobertura 98%). Promedio de la misma referencia: 46.10.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 7.4 m3/s (+1%), volumen 145 Hm3 (-16%) vs año anterior.

Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 04/11	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	41.89	52.71	-20.5%	46.43
Socabaya 220	44.39	55.67	-20.3%	49.22
Piura 220	45.79	57.76	-20.7%	50.99


Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 04/11	Promedio mes
Punta (18-23 h)	49.05	52.71
Media (6-18 h)	36.35	42.39
Base (23-6 h)	46.26	48.88

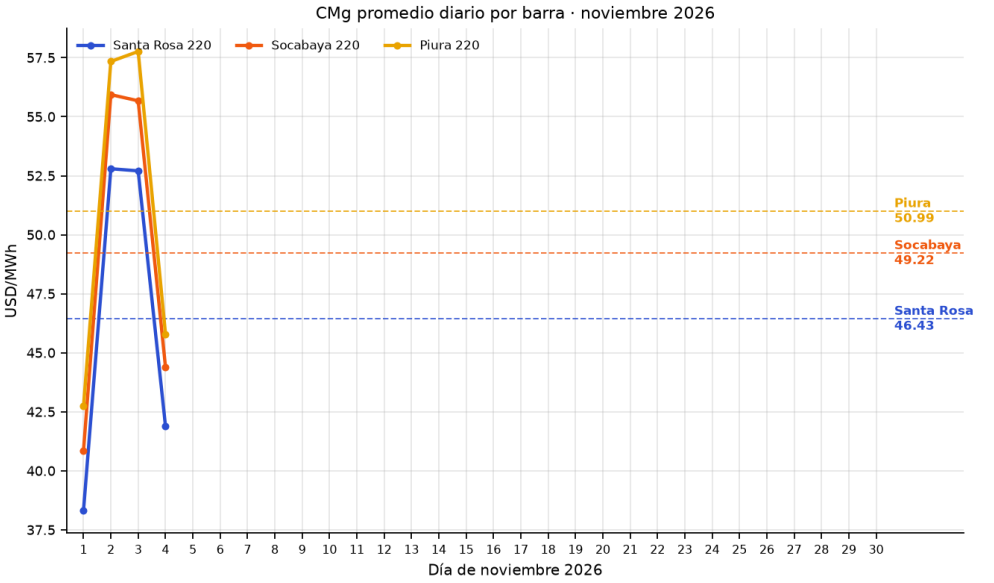


Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Precios: detalle

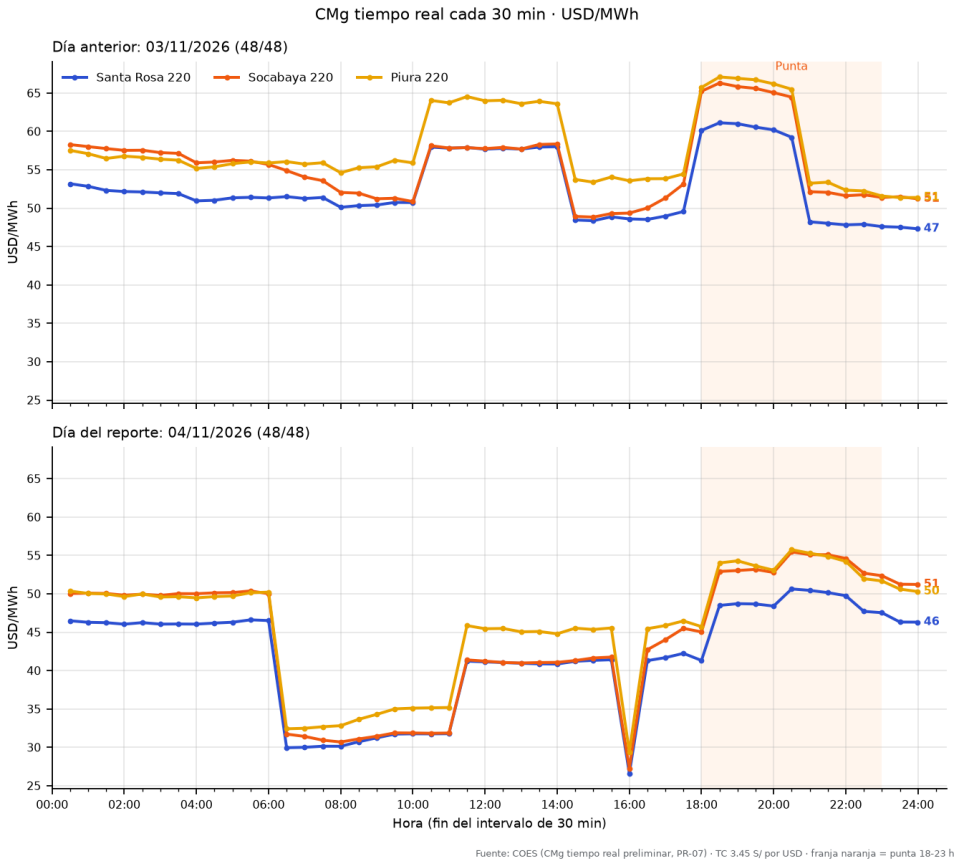


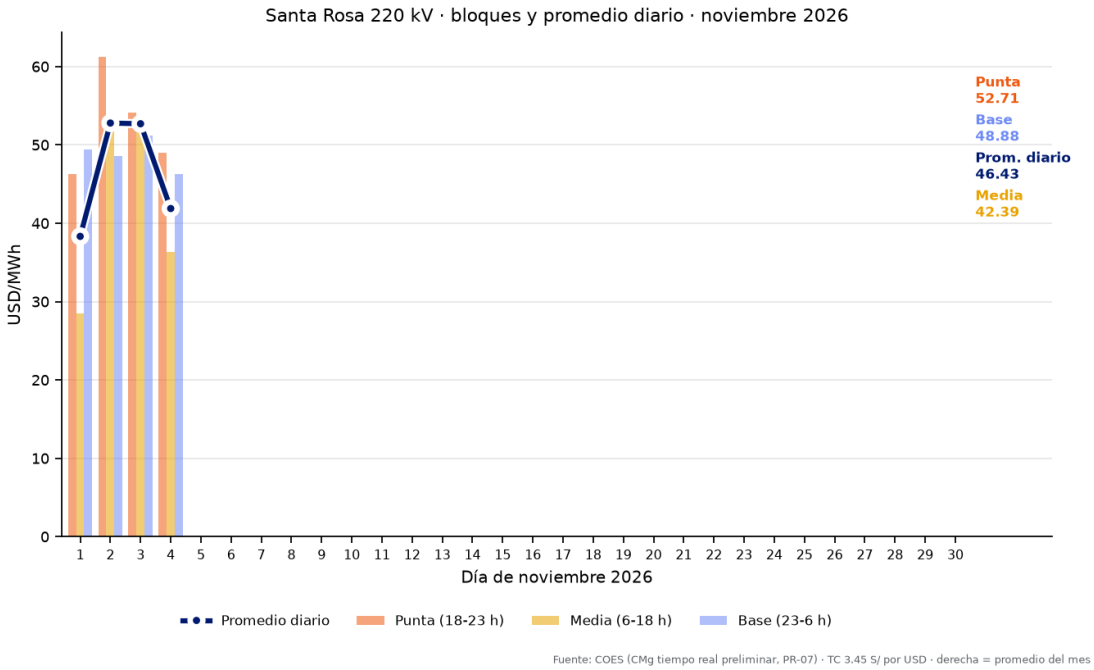

Oferta y demanda

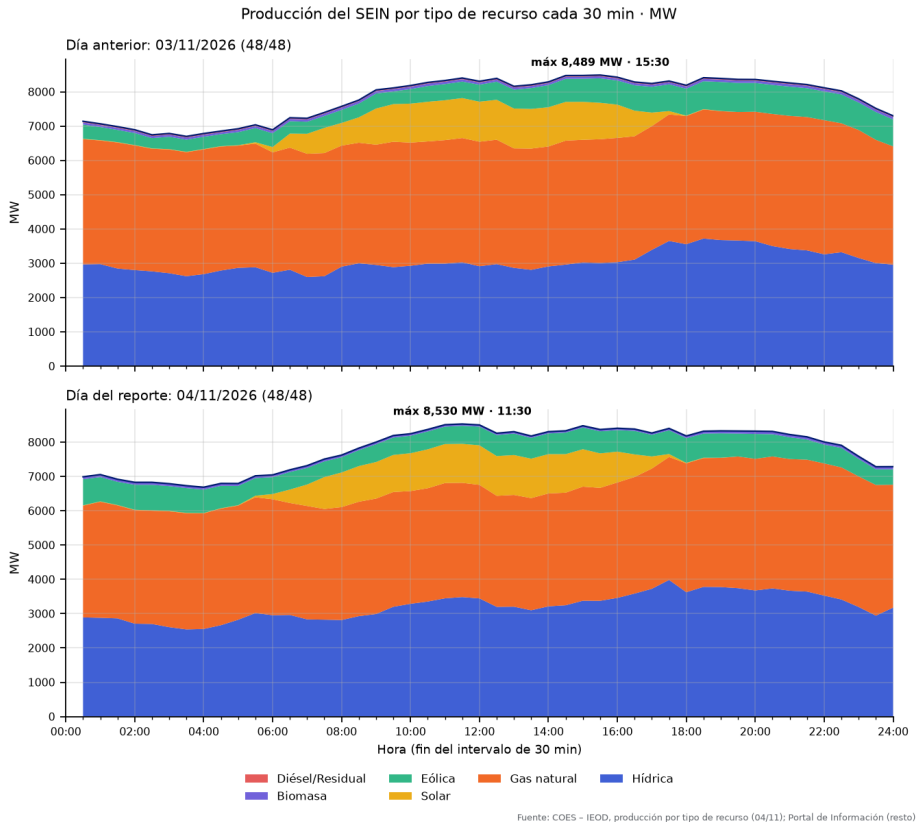



Fuente: COES – IEOD, producción por tipo de recurso (04/11); Portal de Información (resto)

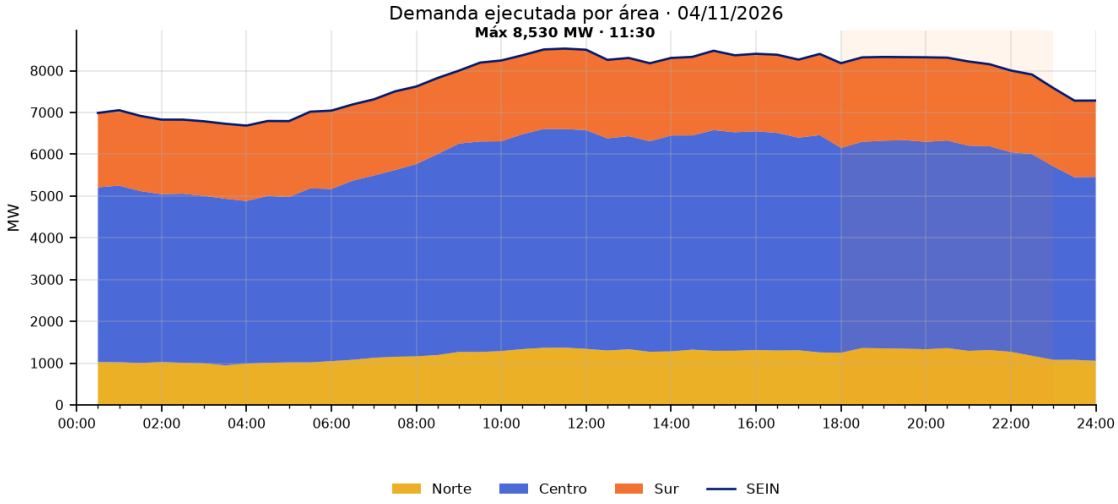


Fuente: COES – IEOD (Anexo A)

Demanda vs. año anterior

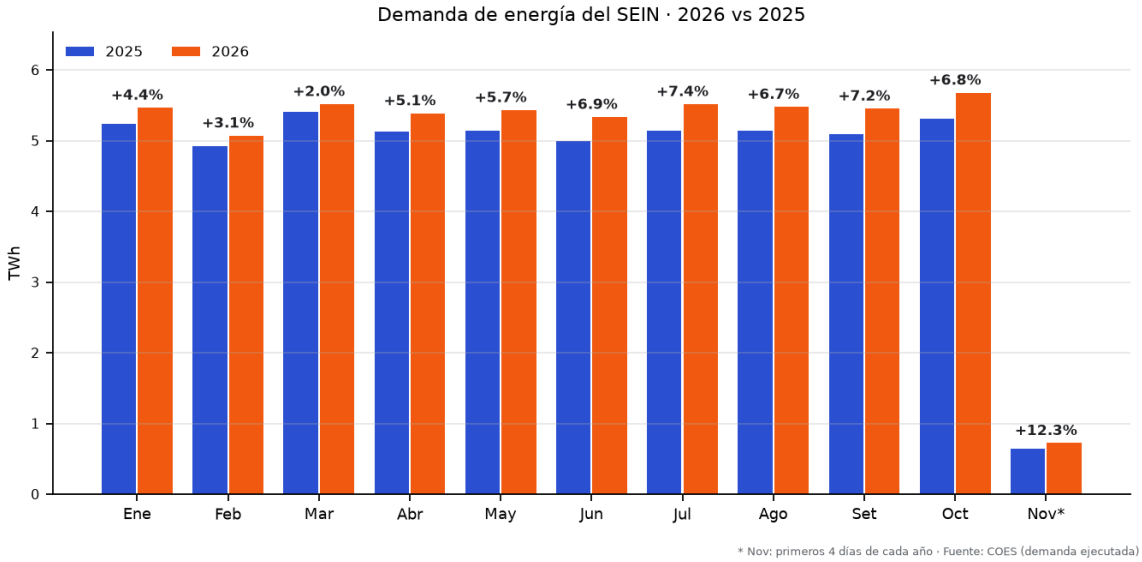


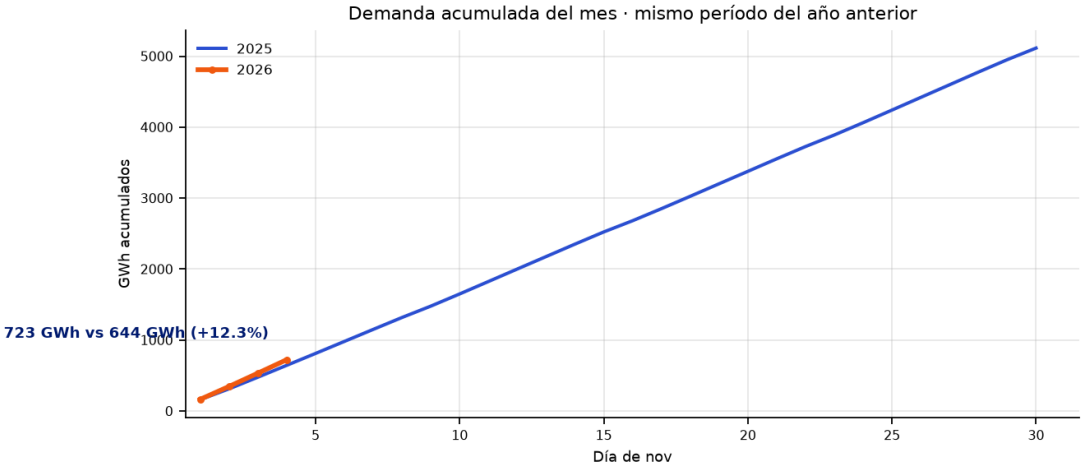


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

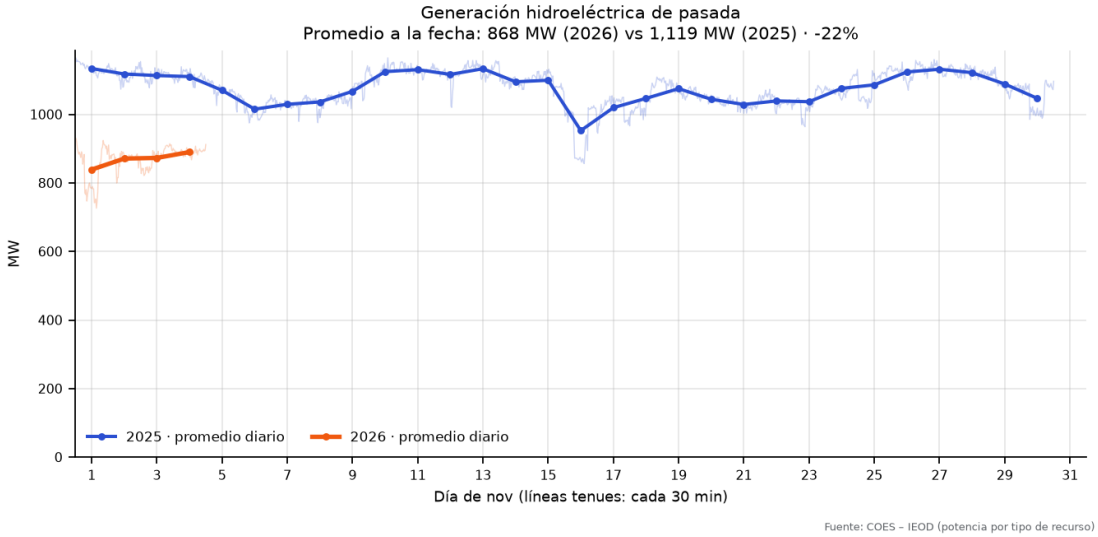

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

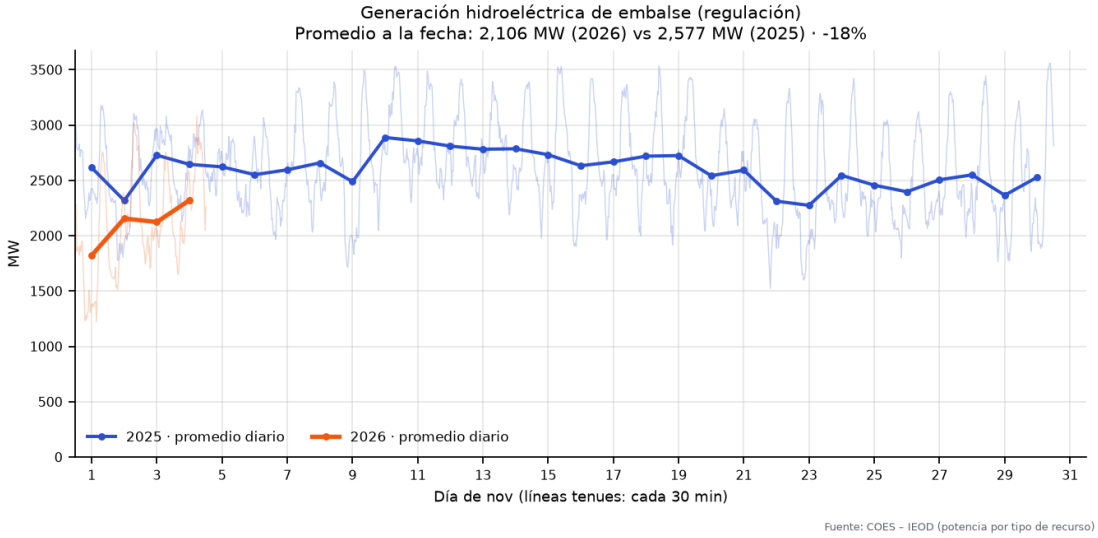

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

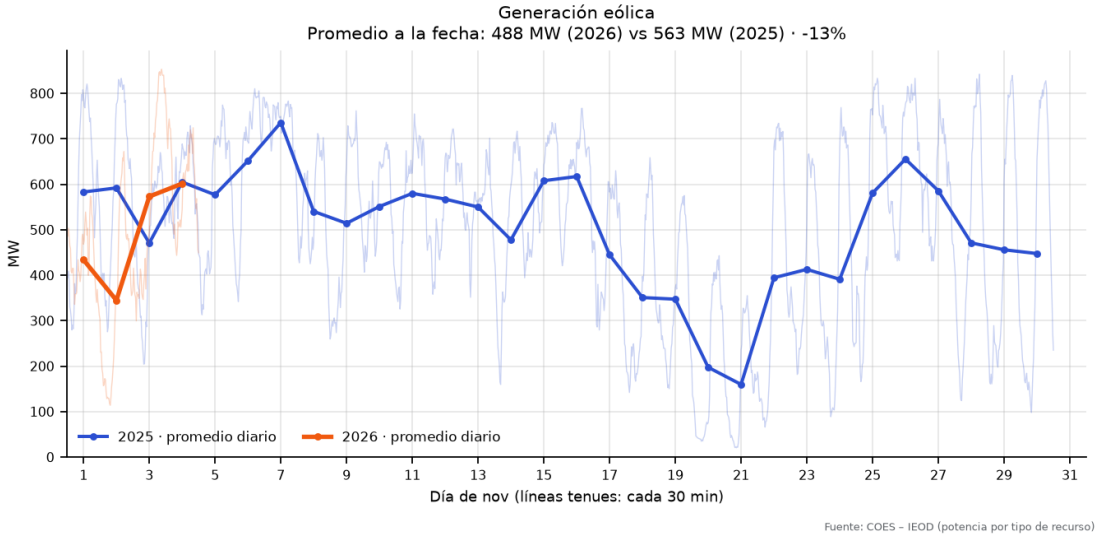

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–4 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	10.61	19.31	-8.71	-45%
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	6.53	14.24	-7.70	-54%
El Platanal	Celepsa	Regulación	5.53	11.20	-5.67	-51%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	11.11	15.31	-4.20	-27%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	6.63	10.09	-3.46	-34%
Mantaro	Electroperu	Regulación	56.09	59.34	-3.25	-5%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	5.55	8.75	-3.20	-37%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	7.62	10.61	-2.99	-28%
La Virgen	La Virgen	Regulación	2.77	5.52	-2.74	-50%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	5.77	8.32	-2.55	-31%
Manta I	Celaris Energy S.A.	Pasada	0.43	1.81	-1.38	-76%
Restitución	Electroperu	Pasada	18.91	20.26	-1.36	-7%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	1.59	2.83	-1.24	-44%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	0.69	1.92	-1.24	-64%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.76	1.93	-1.18	-61%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	1.16	-1.16	-100%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.83	1.95	-1.12	-57%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.85	1.92	-1.07	-56%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	5.41	6.39	-0.98	-15%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	0.62	1.48	-0.86	-58%
Huasahuasi I	Egejunin	Pasada	0.46	1.15	-0.68	-60%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	1.39	1.99	-0.59	-30%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	0.43	1.03	-0.59	-58%
Cahua	Statkraft S.A	Pasada	3.27	3.79	-0.53	-14%
Poechos II	Sinersa	Pasada	0.16	0.61	-0.45	-74%

Total hidro: 259.2 GWh vs. 304.7 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 04/11/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
308 MW	**270 MW**	**207** / **63** MW	**398 MW**
a las 07:30 h	6,493 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (332 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 301 MW · Biomasa 21 MW · Eólica 9 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Orygen Peru S.A.A.	Huinco	G4	Hídrica	00:00–18:10	**68.0**	Forzado	REPARACIÓN DE RODETE POR CAVITACIÓN
Egasa	Charcani V	G2	Hídrica	00:00–24:00	**48.0**	Prog.	Instalación de repuestos de interruptor de potencia.
Statkraft S.A	Yaupi	G5	Hídrica	00:00–18:19	**21.0**	Prog.	MANTENIMIENTO UH G5
Empresa De Generacion Electrica Santa Ana S.A.C.	Renovandes H1	G1	Hídrica	00:00–22:10	**20.0**	Prog.	Mantenimiento del generador del grupo G1 de Renovandes H1: inspección de las descargas parciales y pruebas eléctricas en
Empresa De Generacion Electrica Santa Ana S.A.C.	Renovandes H1	G1	Hídrica	00:00–22:10	**20.0**	Prog.	Mantenimiento del Generador grupo G1 Renovandes H1: pulido rueda Pelton.
Agro Industrial Paramonga S.A.	Paramonga	CENTRAL	Biomasa	00:00–17:01	**14.0**	Prog.	Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, e
Egesur	Aricota I	G1	Hídrica	06:44–17:30	**11.1**	Prog.	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-11 y TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Egasa	Charcani III	CENTRAL	Hídrica	07:16–16:20	**4.7**	Prog.	Mantenimiento Canal CH III a CH I
Parque Eolico Marcona S.A.C.	Parque Eolico Marcona	CENTRAL	Eólica	07:03–07:09	**3.1**	Forzado	M-01 Profinet device hub offline Reset
Egasa	Charcani I	CENTRAL	Hídrica	00:00–16:55	**1.6**	Prog.	Mantenimiento Canal CH III a CH I
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G3	Biomasa	06:14–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 102000 HRS
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	Biomasa	06:07–24:00	**1.2**	Prog.	MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS
Petramas	Doña Catalina	G2	Biomasa	06:08–24:00	**1.2**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 48000 HRS
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G2
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
San Gaban	Pch Tupuri	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Mantenimiento Anual de la PCH Tupuri
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2037	220	Atn S.A.	Rubi - Montalvo	07:26–15:55	E/S	Medida de la Resistencia de Puesta a tierra
L-2076	220	Minera Cerro Verde	San Luis - San Carlos	08:27–17:38	F/S	DESCONEXION DE LT-2076 POR SEGURIDAD DURANTE TENDIDO DE CONDUCTORES DE NUEVO TRAZO DE LINEA 2075/2076
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2178	220	Concesionaria Linea De Transmision La Ni?A S.A.C.	Alipio Rosales - Pari?As	07:00–17:00	F/S	Revision funcion 79 Recierre del sistema de proteccion y Pruebas Endo To End.
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2220	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Campo Armi?O - Huayucachi	10:43–17:46	E/S	SE CAMPO ARMI?O CL-2220: POA RENOVACION DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA OPLAT, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO ME
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:13–16:10	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679)
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–17:11	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2283	220	Atn S.A.	Cajamarca Norte - Pampa Honda	07:49–15:08	E/S	Tala de arboles
L-2287	220	Atn S.A.	Cajamarca Norte - Pampa Honda	07:49–15:08	E/S	Tala de arboles
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL

Eventos relevantes del día


Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	09:30–24:00			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	08:40–22:20			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	11:02–17:15			RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DE LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	18:28–21:41			RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DE LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Electro Puno	L-6024 · Azángaro - Putina	14:32–14:34	60	10.4	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6024 (AZÁNGARO – PUTINA) DE 60 kV
Evento	Red De Energia Del Peru S.A.	T47-131 · Quencoro	15:53–22:06			RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO

Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 03/11, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 43 · 24/10 al 30/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 43	57.3 -13%	13.8	18.3	-24%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 43	76.9 -31%	114.9	138.0	-17%	95.5 (04/11) -6%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 43	7.4 +1%	144.9	173.3	-16%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 43	11.8 -38%	19.4	11.2	+73%	19.2 (04/11) +68%	387.2 MW
Chaglla	sem. 43	44.3 -35%	2.5	7.8	-67%	7.2 (04/11) -8%	456.4 MW

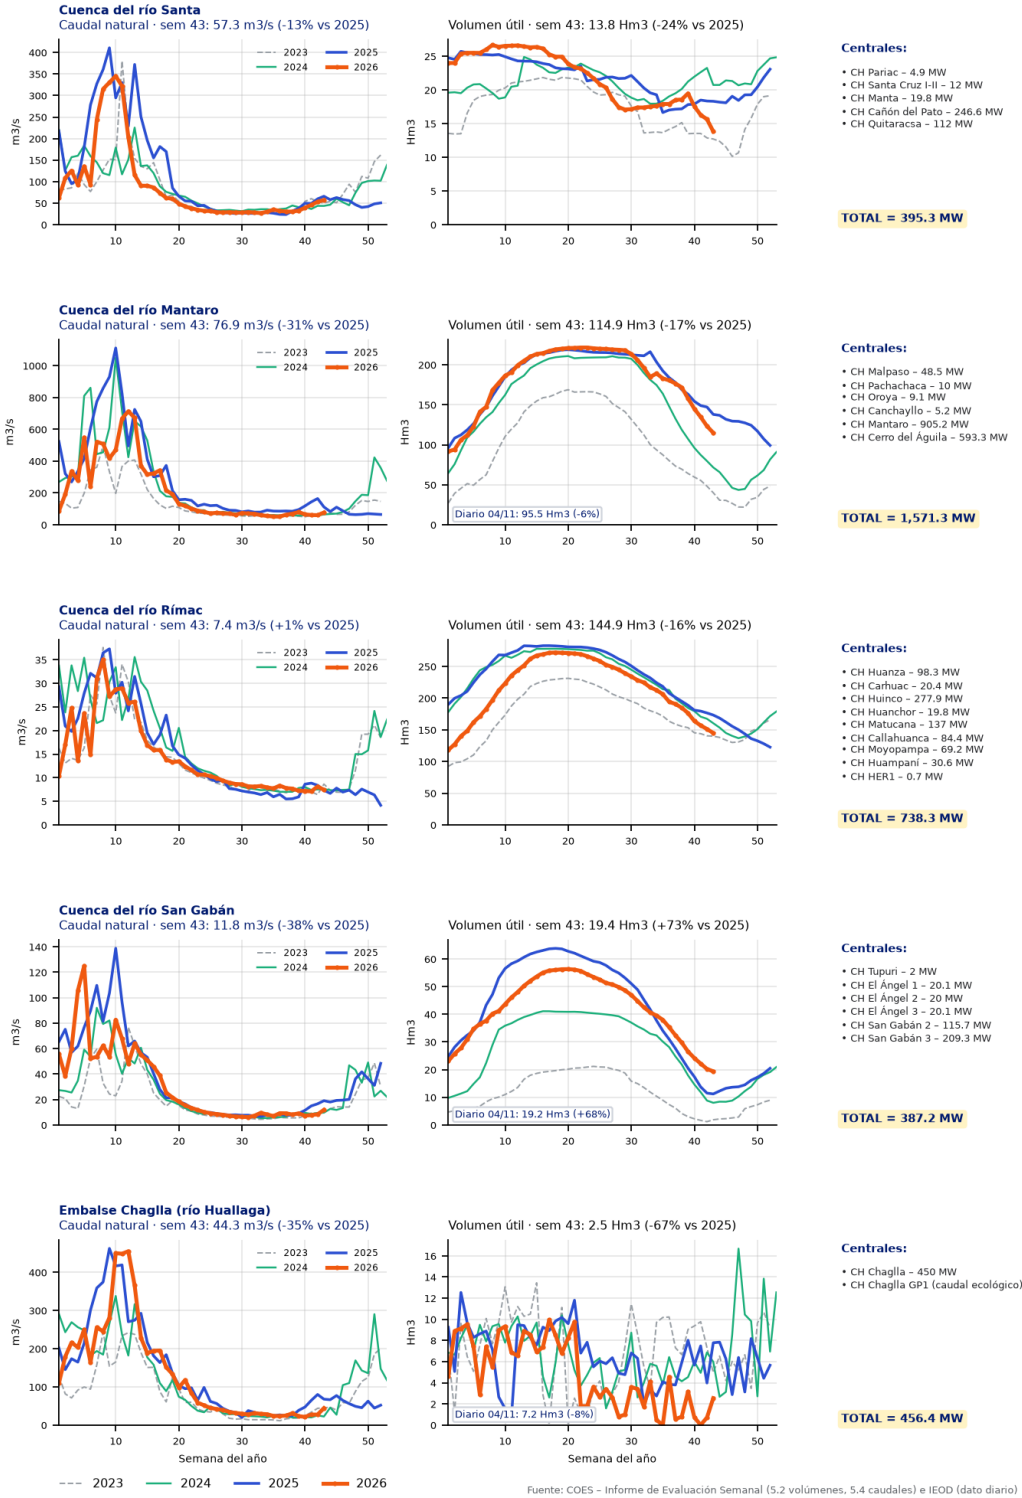

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · jueves 5 de noviembre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (14 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	217.1	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Orygen Peru S.A.A.	Wayra Extension	CENTRAL	02:00–06:00	170.0	Correctivo en Circuito 17 Wayra Extensión
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G2	00:00–24:00	48.0	Instalación de repuestos de interruptor de potencia.
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Egesur	Aricota I	G2	06:30–17:30	11.0	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G3	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 102000 HRS
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	00:00–24:00	1.2	MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS
Petramas	Doña Catalina	G2	00:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 48000 HRS

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2021	220	Compañia Minera Antapaccay S.A.	Tintaya Nueva - Antapacay	07:00–17:00	F/S	- Mantenimiento rutinario y Limpieza manual de aisladores y ferretería de las estructuras. LT 2021 - 220kV (T2, T3, T4,
L-2076	220	Minera Cerro Verde	San Luis - San Carlos	08:00–18:00	F/S	DESCONEXION DE LT-2076 POR SEGURIDAD DURANTE TENDIDO DE CONDUCTORES DE NUEVO TRAZO DE LINEA 2075/2076
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2220	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Campo Armiño - Huayucachi	07:30–17:00	E/S	SE CAMPO ARMIÑO CL-2220: POA RENOVACIÓN DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA OPLAT, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO ME
L-2242	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ventanilla - Zapallal	07:00–17:00	F/S	REEMPLAZO DE FIBRA ÓPTICA OPGW ENTRE LAS TORRES T-12 A T-15 POR CORROSION G3, REQUIERE L-2243 CON RECIERRES DESHABILITAD
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679)
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	07:30–24:00	F/S	CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERÍA, SPAT Y PINTADOT47 A T82

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	07:30–17:30	F/S	TRASLADO DE CONDUCTORES A T116N INSTALADA Y RETIRO DE TORRETAS POR NTERFERENCIA DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO DEN
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
