Resumen · 12 de noviembre 2026

El 12 de noviembre, Santa Rosa promedió 301.81 USD/MWh, 1.4% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025. Para el 13 de noviembre se programan hasta 137 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 00:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 13 de noviembre
301.81 USD/MWh	**8,688 MW**	**176 MW**	**137 MW**
Santa Rosa 220 · -1.4% diario	pico a las 12:00 h · +743 MW vs 2025 · mes +10.8% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 122 / forz. 18 MW prom.	Mantaro G7 · 101 MW · 00:00–24:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 301.81 USD/MWh: -1.4% frente a ayer y 225% sobre el promedio del mes (92.97).
- **Demanda.** Energía del mes 2,217 GWh, +10.8% frente a los mismos 12 días de 2025; máxima del 12 de noviembre 8,688 MW, +743 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,752 MW (+808 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: San Gaban III (-23.6 GWh), El Platanal (-14.4 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 398 MW, -32% frente a 2025; el 12 de noviembre promedió 244 MW.
- **Operación.** Desacople entre Piura 220 y Santa Rosa 220: 28.35 USD/MWh de diferencia; revisar transmisión.

Qué vigilar · 13 de noviembre

1. Desde el 20 de noviembre: Huinco 270 MW en mantenimiento

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. 17 líneas ≥220 kV intervenidas; la de mayor tensión: L-5033 (Poroma – Yarabamba) (00:00–24:00)

■ **CMg alto:** CMg Santa Rosa 220 del día 301.81 USD/MWh ≥ umbral 150.

■ **Desacople entre barras:** Piura 220 – Santa Rosa 220 = 28.35 USD/MWh ≥ 15.


Huanchor

- Huanchor generó **364.7 MWh** (-17% vs mismo día 2025); en el mes 4,367 MWh (-16.2%).
- Precio capturado del día 299.68 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 107,049 USD, cobertura 98% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 94.16 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 98% de la energía; cobertura 98%). Promedio de la misma referencia: 92.36.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 7.3 m3/s (+9%), volumen 135 Hm3 (-20%) vs año anterior.

Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 12/11	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	301.81	306.22	-1.4%	92.97
Socabaya 220	314.04	321.81	-2.4%	97.93
Piura 220	330.16	334.49	-1.3%	101.74

Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 12/11	Promedio mes
Punta (18-23 h)	311.79	103.13
Media (6-18 h)	298.85	88.35
Base (23-6 h)	299.75	93.63

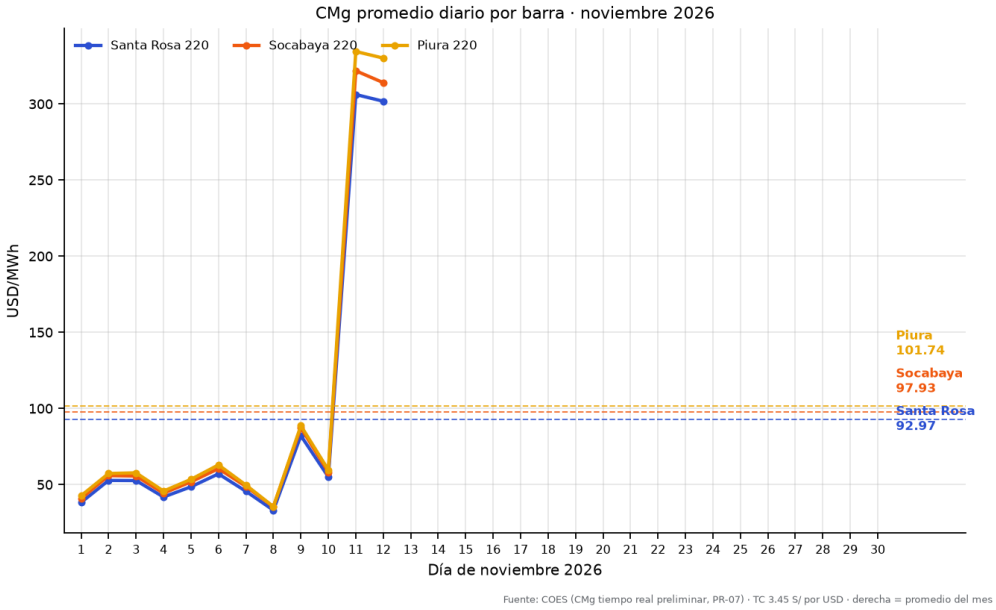


Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Precios: detalle

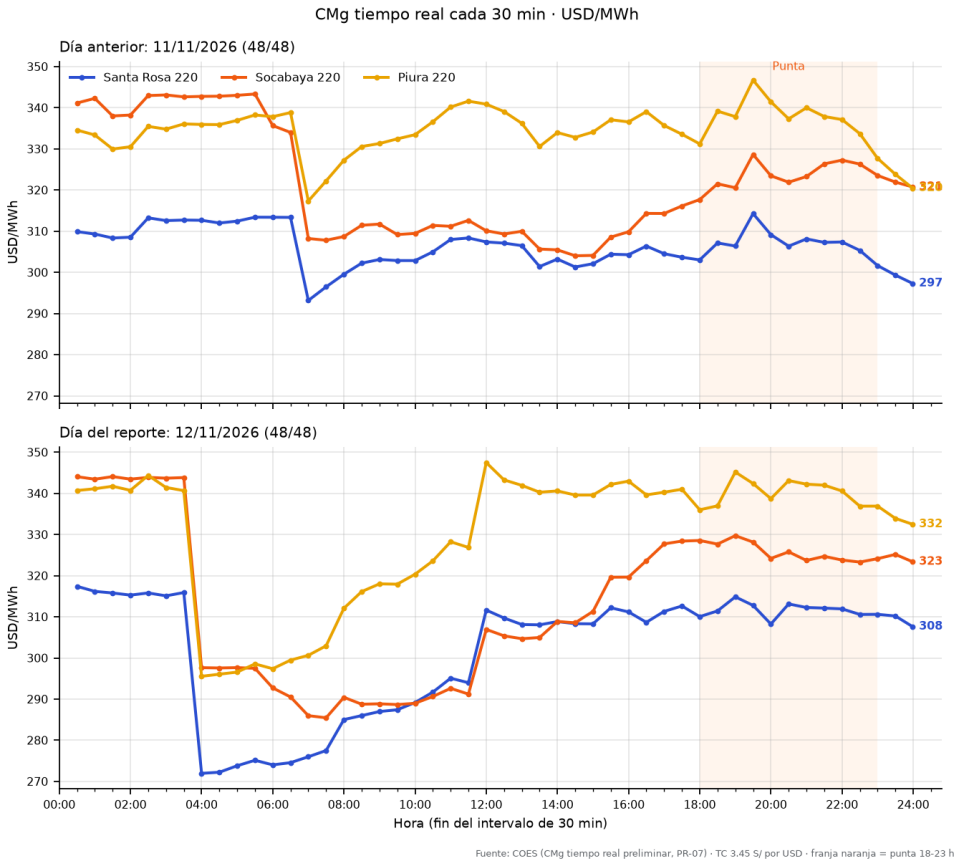



Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · franja naranja = punta 18-23 h

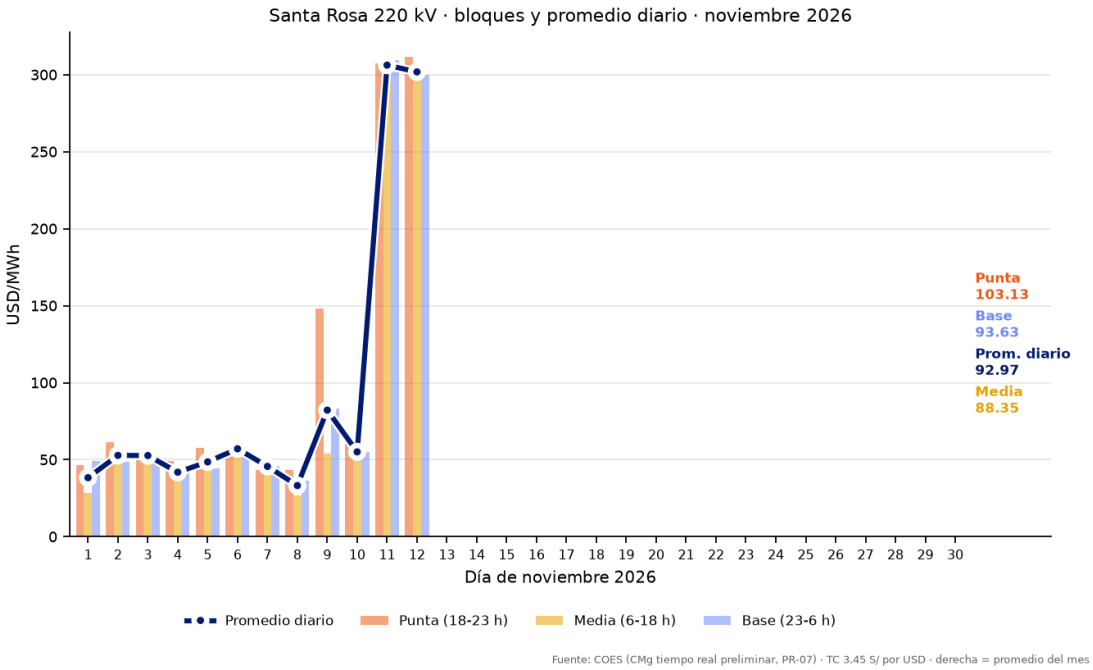

Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Oferta y demanda

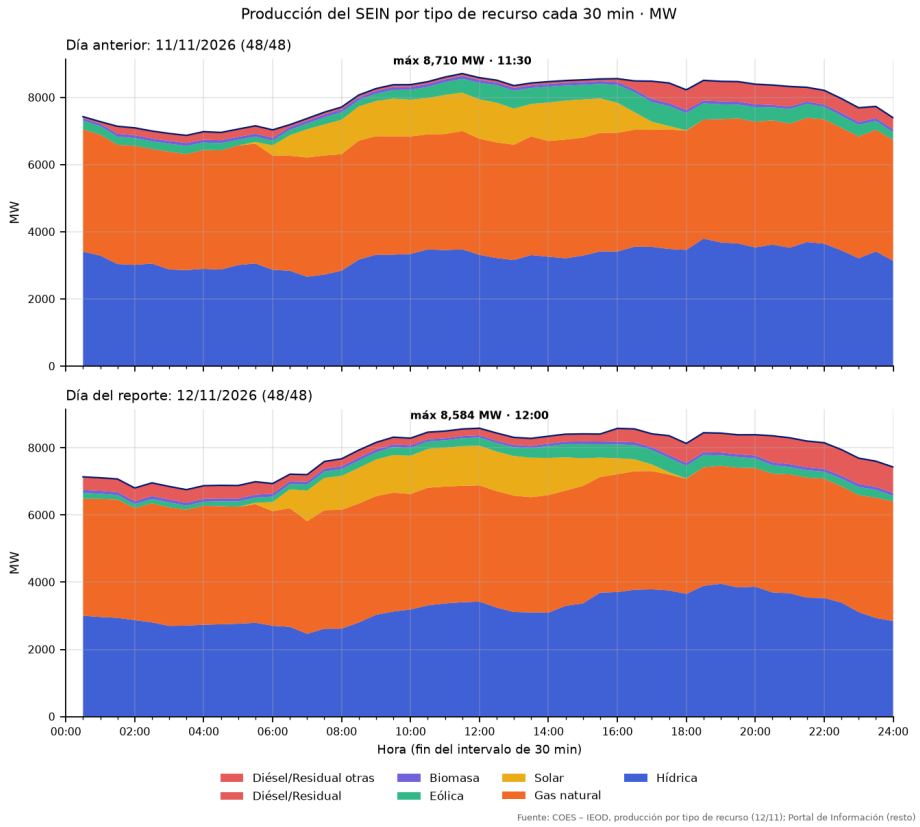


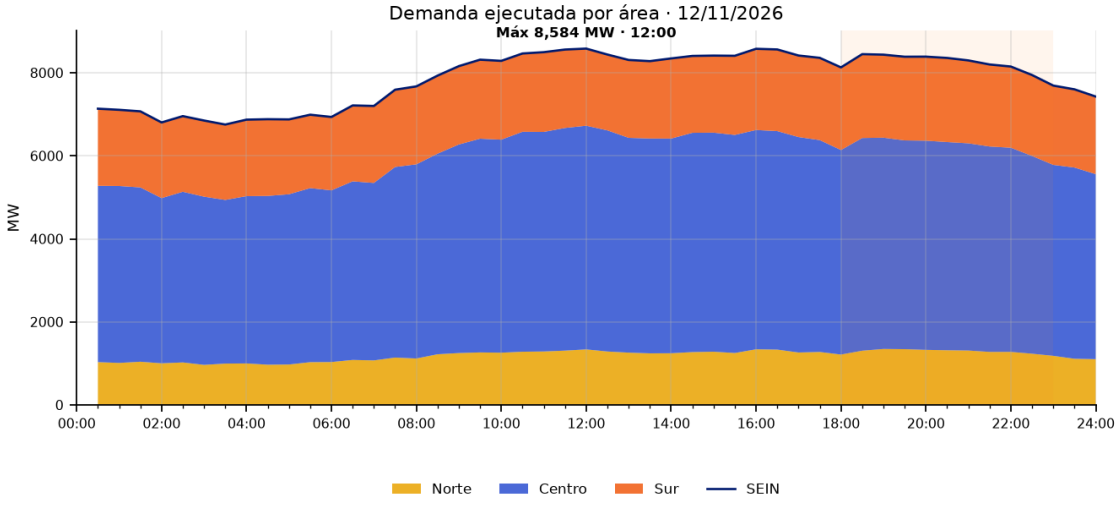


Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 12/11/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Rf De Generacion Eten RF-ETENGT1	Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fría	Diésel D2 (D2)	12:25–12:52	–	–	Por pruebas
Nepi TG41	Engie Energia Peru S.A.A.	Otra	Diésel D2 (D2)	00:00–00:00	196.9	4,696	Por potencia o energia
Puerto Bravo TG1	Samay I S.A.C	Otra	Diésel D2 (D2)	00:00–00:00	176.3	2,486	A minima carga
Puerto Bravo TG3	Samay I S.A.C	Otra	Diésel D2 (D2)	17:14–00:00	176.8	1,227	Por potencia o energia
Nepi TG42	Engie Energia Peru S.A.A.	Otra	Diésel D2 (D2)	19:52–00:00	197.3	807	Por potencia o energia
Tumbes MAK1	Electroperu	Otra	Diésel D2 (D2)	01:28–23:59	7.6	76	Por potencia o energia
Chilina Diesel SLZ2	Egasa	Otra	Diésel D2 (D2)	00:00–09:24	–	–	Por potencia o energia
Chilina Diesel	Egasa	Otra	Diésel D2 (D2)	12:11–00:00	–	–	Por potencia o energia
Chilina Diesel SLZ1	Egasa	Otra	Diésel D2 (D2)	16:43–17:30	–	–	Por pruebas
Mollendo Diesel	Egasa	Otra	Diésel D2 (D2)	07:26–00:00	–	–	Por pruebas
San Nicolas TV1	Shougesa	–	Residual (R500)	00:00–22:42	–	–	Por potencia o energia
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	43.3	1,013	Por cogeneracion
Refineria Talara TV2	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	12.5	285	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

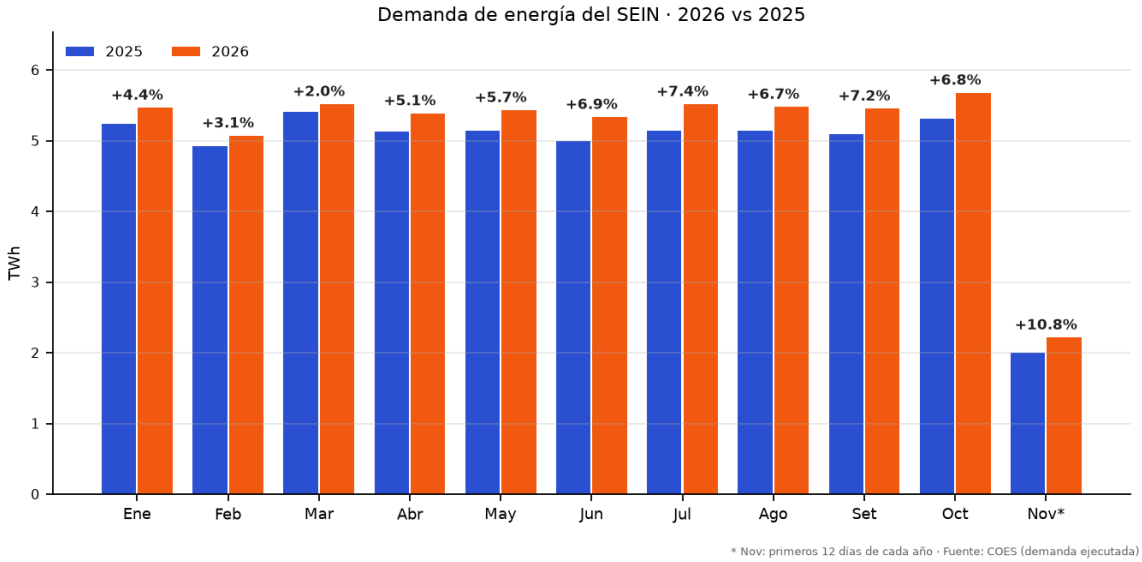


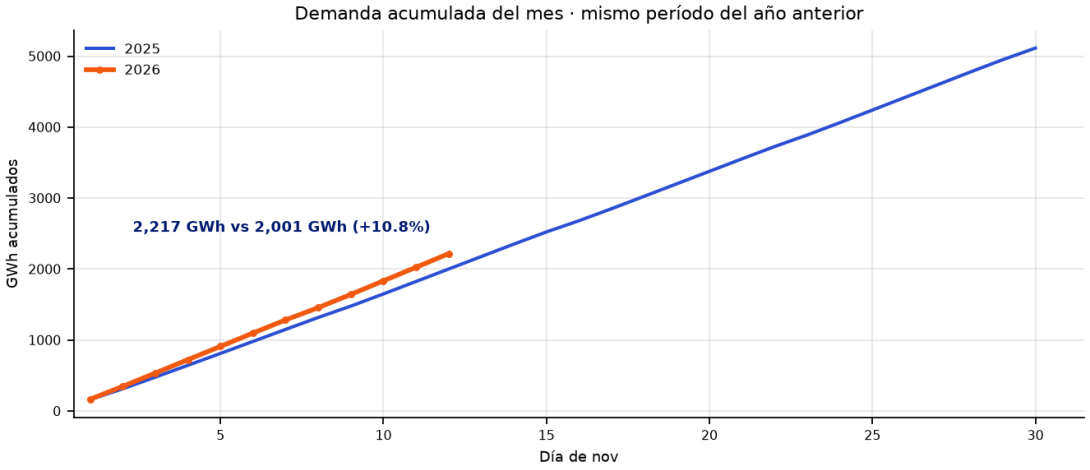
Demanda acumulada del mes · mismo período del año anterior
2025
2026
2,217 GWh vs 2,001 GWh (+10.8%)
GWh acumulados
Día de nov
0
1000
2000
3000
4000
5000
5
10
15
20
25
30


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

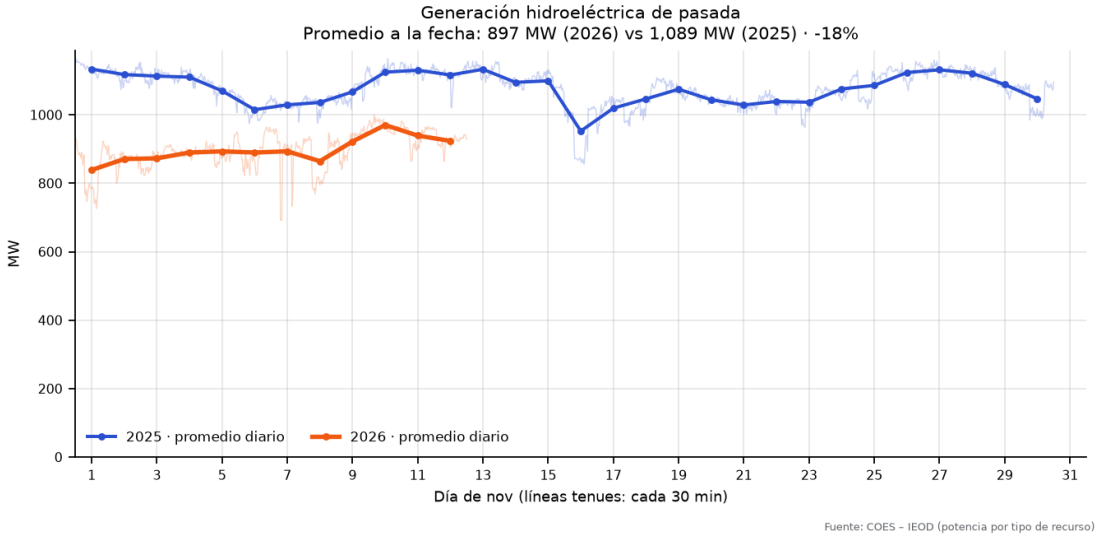

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

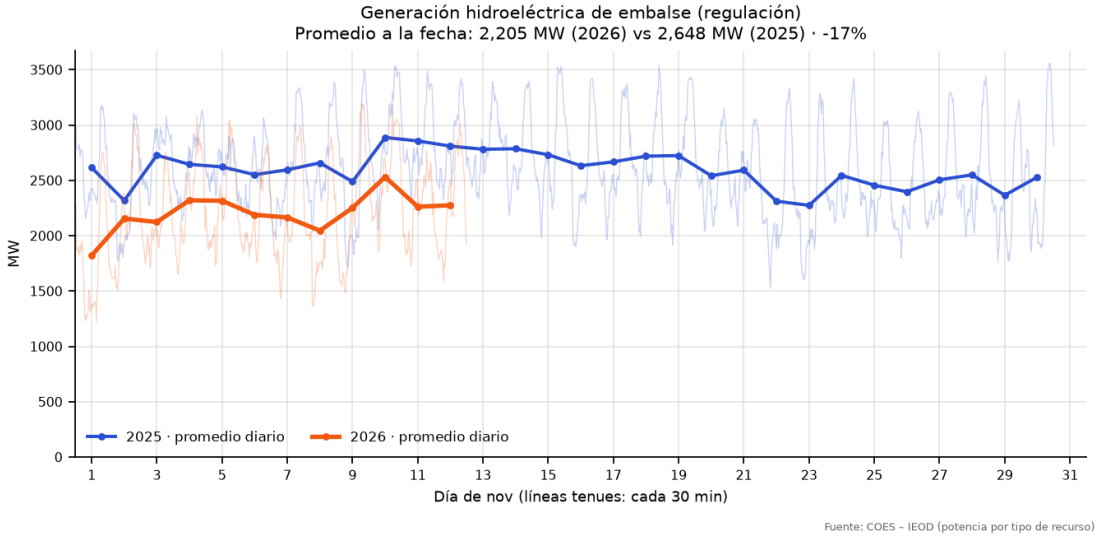

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

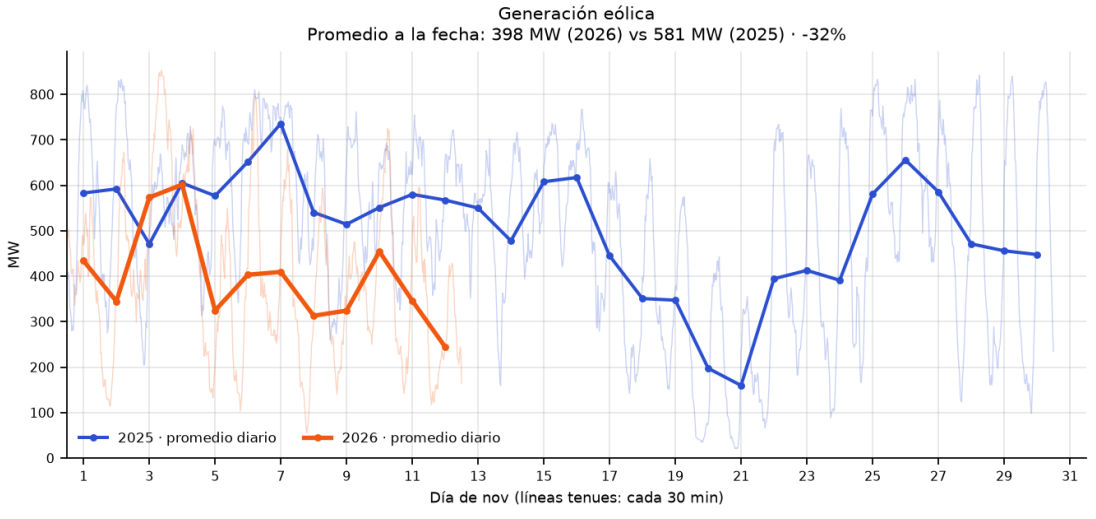

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–12 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	29.56	53.12	-23.57	-44%
El Platanal	Celepsa	Regulación	20.40	34.78	-14.37	-41%
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	24.86	38.70	-13.85	-36%
Mantaro	Electroperu	Regulación	166.46	178.46	-12.00	-7%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	34.75	43.76	-9.02	-21%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	22.08	30.76	-8.69	-28%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	20.67	28.32	-7.66	-27%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	23.94	30.68	-6.74	-22%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	17.38	23.34	-5.96	-26%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	18.13	23.56	-5.43	-23%
Restitución	Electroperu	Pasada	56.08	61.06	-4.98	-8%
La Virgen	La Virgen	Regulación	9.88	14.47	-4.59	-32%
Manta I	Celaris Energy S.A.	Pasada	1.60	5.23	-3.63	-69%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	2.02	5.43	-3.41	-63%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	3.37	-3.37	-100%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	2.18	5.52	-3.34	-61%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	2.16	5.44	-3.28	-60%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	2.47	5.51	-3.04	-55%
Matucana	Orygen Peru S.A.A.	Regulación	21.08	23.33	-2.25	-10%
Cahua	Statkraft S.A	Pasada	9.85	11.96	-2.11	-18%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	2.40	4.43	-2.04	-46%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	5.68	7.66	-1.98	-26%
Malpaso	Statkraft S.A	Regulación	5.84	7.79	-1.94	-25%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	1.69	3.17	-1.48	-47%
Rucuy	Sinersa	Pasada	2.92	4.28	-1.36	-32%

Total hidro: 796.2 GWh vs. 925.5 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 12/11/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
176 MW	**140 MW**	**122** / **18** MW	**435 MW**
a las 08:00 h	3,357 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (224 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 203 MW · Eólica 12 MW · Gas natural 6 MW · Biomasa 4 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA - OPERACIÓN EXPERIMENTAL
Egasa	Charcani V	G2	Hídrica	07:47–11:09	**48.0**	Prog.	Mantenimiento Preventivo Eléctrico LLTT
Egasa	Charcani V	G3	Hídrica	11:21–14:39	**48.0**	Prog.	Mantenimiento Preventivo Eléctrico LLTT
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**9.4**	Forzado	TH-04, TH-05 y TH-11 - TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	00:00–24:00	**5.7**	Prog.	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Parque Eolico Marcona S.A.C.	Parque Eolico Marcona	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**2.3**	Forzado	M-04 fuera de servicio por alarma GrdInv: 241 Delta 1 DIB +15v.
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	Biomasa	00:00–24:00	**1.2**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1
Petramas	Ctb Callao	G2 CALLAO	Biomasa	00:00–15:36	**1.2**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 44250/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control G2
Egemsa	Machupicchu	G3	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G3
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–18:25	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL (MENOR) U2
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	19:27–23:22	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL (MENOR) U2
Kallpa Generacion S.A.	Kallpa	TG2	Gas natural	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Mantenimiento correctivo de la TG2
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Statkraft S.A	Cheves	CENTRAL	Hídrica	06:14–15:43	**0.0**	Prog.	CENTRAL INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA SE CHEVES Y LT 2281
Statkraft S.A	Cheves	G2	Hídrica	08:00–24:00	**0.0**	Prog.	CAMBIO DE TURBINA UG2
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Shougesa	San Nicolás	TV2	Diésel · excluido	00:00–24:00	18.6	Prog.	Alta temperatura en las chumaceras del ventilador de cola
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Egasa	Mollendo D	GD2	Diésel · excluido	08:41–24:00	7.9	Prog.	Revisión del Bushing interno de la celda de 13.8 kV
Egasa	Chilina D	SLZ2	Diésel · excluido	05:29–09:09	5.1	Forzado	Revisión del sistema de combustible del motor por fuga de Diesel
Egasa	Chilina D	SLZ2	Diésel · excluido	20:46–24:00	5.1	Forzado	revisión del sensor de alta temperatura del cojinete de bancada 5
Egasa	Chilina D	SLZ1	Diésel · excluido	00:00–16:43	5.1	Forzado	Revisión del sistema de protección del generador

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Egasa	Chilina D	SLZ1	Diésel · excluido	16:47–17:17	5.1	Forzado	Revisión del sistema de protección del generador
Egasa	Mollendo D	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–08:41	0.0	Forzado	Revisión del sistema de barras en 13.8 kV
Shougesa	San Nicolás	TV1	Diésel · excluido	22:42–24:00	0.0	Forzado	Por inconvenientes en el abastecimiento de combustible R-500 a nuestros Tanques

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5006	500	Transmantaro	Carabayllo - Chimbote 1	06:46–12:02	E/S	LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES FOGONEADOS, CON ALTA CONTAMINACION EN LAS TORRES T241, T279, T281, T282, T379, T380, T3
L-5022	500	Transmantaro	Campas-Carapongo	08:31–15:48	F/S	LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS DE TORRES T-397 Y T398. (R0139044)
L-5022	500	Transmantaro	Campas-Carapongo	09:36–15:53	F/S	FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR R-38. (R0124582)
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2061	220	Minera Cerro Verde	Socabaya - Cerro Verde	07:58–17:28	F/S	LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062
L-2062	220	Minera Cerro Verde	Socabaya - Cerro Verde	08:00–17:27	F/S	LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062
L-2063	220	Atn S.A.	Ishcayucro - Paragsha II	06:03–17:33	E/S	Tala de arboles
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2232	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chimu - Chimbote 1	07:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:54–16:22	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679)
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	F/S	CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERIA, SPAT Y PINTADOT47 A T82
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2281	220	Statkraft S.A	Huacho - Cheves	05:00–14:00	F/S	INSPECCION LT PRE AVENIDA
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2313	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2313 (E144 A E001)
L-2314	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2314 (E144 A E001)

Eventos relevantes del día

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Casa Grande S.A.A.	TV3 · Casa Grande	10:16–12:39	14		DESCONEXION DEL GENERADOR TV3 DE LA C.T. CASA GRANDE
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	00:00–02:34			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	07:22–23:41			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Egasa	SLZ2 · Chilina D	20:46–24:00			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR SULZER 2 DE LA C.T. CHILINA
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	09:01–22:11			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV


Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
P.Energ	Electro Sur Este	T37-131 · Quencoro	17:22–17:22			PRIMERA ENERGIZACION DEL TRANFORMADOR T37-131 DE 138/34.5/10 KV
Falla	Electroperu	MAK1 · Tumbes	02:01–12:17	11		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK1 DE LA C.T. TUMBES POR FALLA
Falla	Electroperu	MAK1 · Tumbes	21:33–23:34	11		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK1 DE LA C.T. TUMBES

Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 03/11, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas 1	TG6	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por correo el 01.10.2026 la CT Malacas TG6 presenta una limitación de 40 MW por te
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 44 · 31/10 al 06/11/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 44	52.8 -9%	13.4	18.2	-26%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 44	55.6 -33%	116.4	136.8	-15%	70.8 (12/11) -18%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 44	7.3 +9%	135.1	168.5	-20%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 44	11.0 -39%	18.5	12.3	+51%	18.3 (12/11) +43%	387.2 MW
Chaglla	sem. 44	30.4 -54%	6.0	7.8	-23%	1.4 (12/11) -82%	456.4 MW

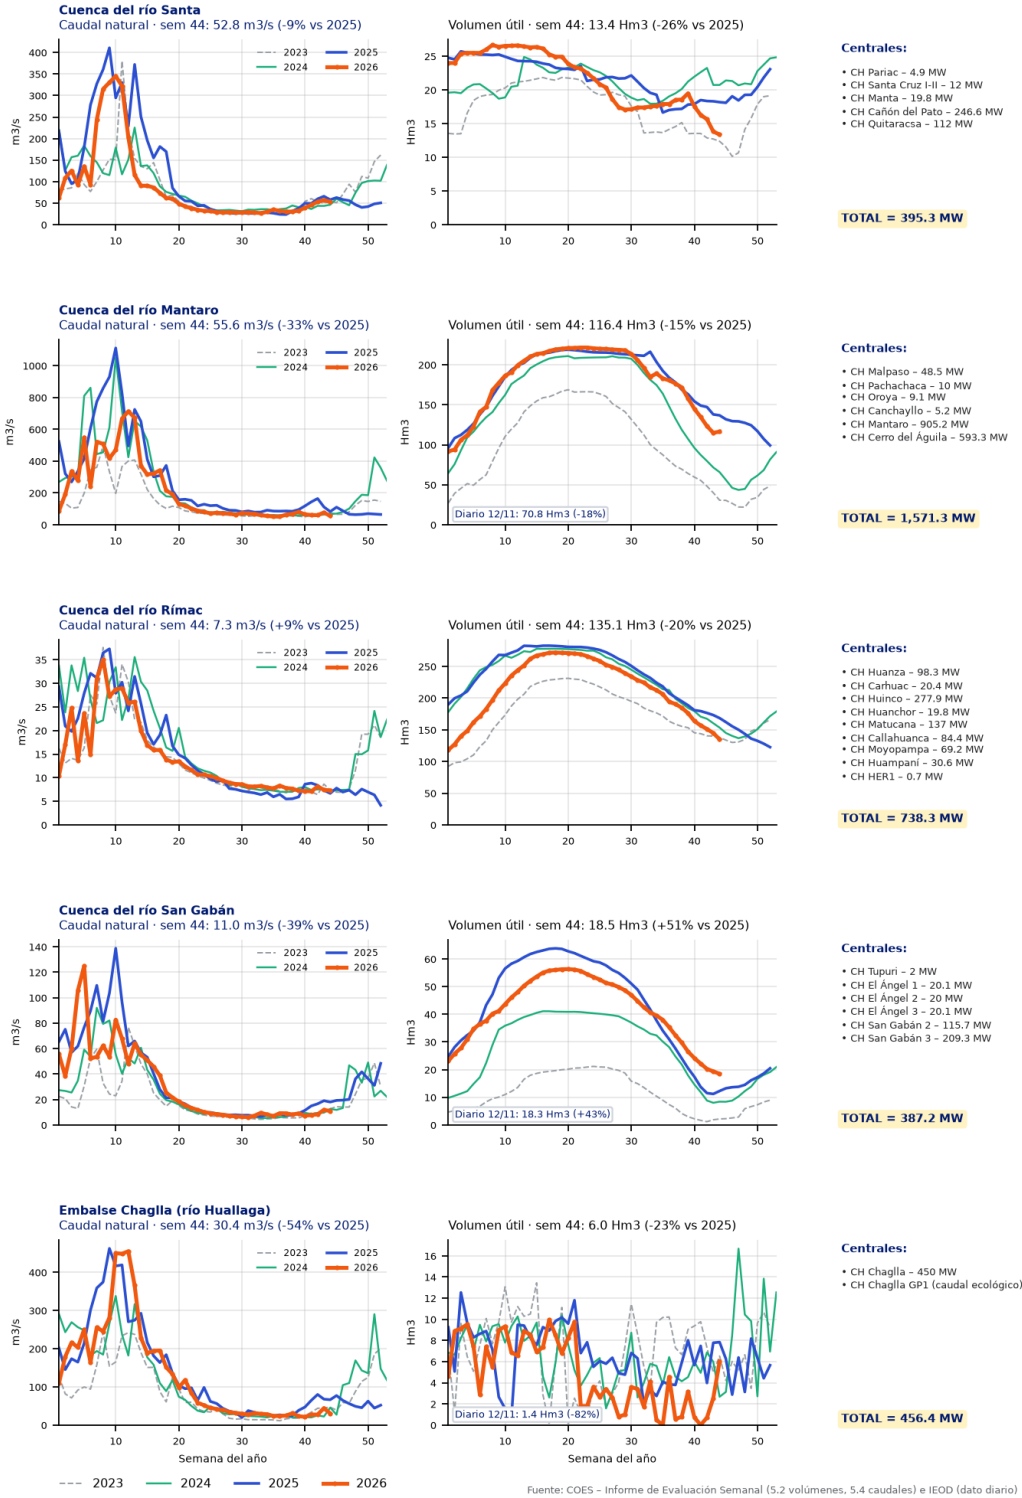

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · viernes 13 de noviembre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (13 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	217.1	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA - OPERACIÓN EXPERIMENTAL
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	23.4	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Egesur	Independencia	INDEP_G3	00:00–24:00	5.7	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	00:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1
Petramas	Ctb Callao	G2 CALLAO	00:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 44250/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5006	500	Transmantaro	Carabayllo - Chimbote 1	05:00–14:00	E/S	LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES FOGONEADOS, CON ALTA CONTAMINACIÓN EN LAS TORRES T241, T279, T281, T282, T379, T380, T3
L-5022	500	Transmantaro	Campas-Carapongo	08:00–17:00	F/S	LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS DE TORRES T-397 Y T398. (R0139044)
L-5022	500	Transmantaro	Campas-Carapongo	08:00–16:00	F/S	FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR R-38. (R0124582)
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2074	220	Minera Cerro Verde	San Luis - Cerro Verde	08:00–24:00	F/S	DESCONEXION LT-2074 POR SEGURIDAD DURANTE CONSTRUCCION ACCEOS ENTRE LOS TRAMOS T-36 Y T-38.
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2137	220	Transmicem S.A.C.	Pachacutec - Unacem	09:00–24:00	E/S	Energización SET UNACEM (Sin carga)
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679)
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	F/S	CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERÍA, SPAT Y PINTADOT47 A T82
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–23:59	E/S	Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea.

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–23:59	E/S	Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2313	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2313 (E144 A E001)
L-2314	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2314 (E144 A E001)
