Resumen · 1 de noviembre 2026

El 1 de noviembre, Santa Rosa promedió 36.50 USD/MWh, 17.5% menos que el día anterior. Para el 2 de noviembre se programan hasta 349 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 2 de noviembre
36.50 USD/MWh	**7,844 MW**	**515 MW**	**349 MW**
Santa Rosa 220 · -17.5% diario	pico a las 11:00 h · +398 MW vs 2025 · mes +2.9% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 347 / forz. 93 MW prom.	Santa Rosa TG7 · 120 MW · 00:00–24:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 36.50 USD/MWh: -17.5% frente a ayer y 0% sobre el promedio del mes (36.50).
- **Demanda.** Energía del mes 165 GWh, +2.9% frente a los mismos 1 días de 2025; máxima del 1 de noviembre 7,844 MW, +398 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 7,844 MW (+398 MW vs 2025).
- **Operación.** Falla en líneas ≥220 kV: L-2217 (Independencia – Aceros Arequipa), L-2249 (Talara – Zorritos); sin desacople relevante de precios.

Qué vigilar · 2 de noviembre

1. Santa Rosa TG7 fuera de servicio (120 MW): 1. reparación de daño estructural a la chimenea de tg7. 2. inspección… (00:00–24:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. Desde el 7 de noviembre: Santa Rosa II TG8 190 MW en mantenimiento

■ **IEOD pendiente:** El IEOD del 01/11 aún no está publicado; se usa el del 31/10.

■ **CMg incompleto:** Solo 34 de 48 intervalos del día tienen CMg publicado.


Huanchor

- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 8.1 m3/s (-3%), volumen 151 Hm3 (-14%) vs año anterior.


Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 01/11	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	36.50	44.24	-17.5%	36.50
Socabaya 220	38.59	46.07	-16.2%	38.59
Piura 220	40.90	48.73	-16.1%	40.90

Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 01/11	Promedio mes
Punta (18-23 h)	42.52	42.52
Media (6-18 h)	27.81	27.81
Base (23-6 h)	49.40	49.40

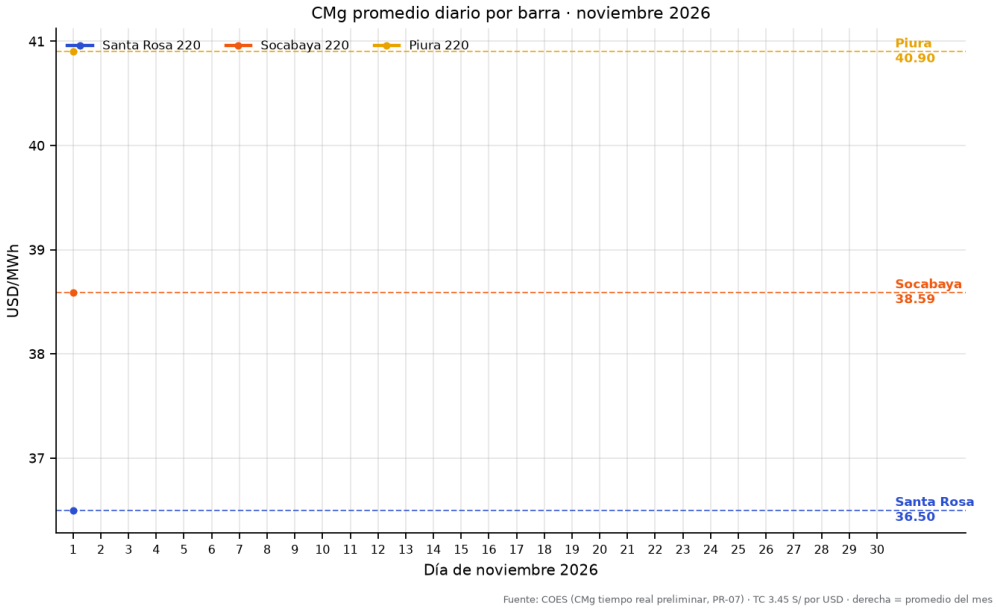

CMg promedio diario por barra · noviembre 2026
Santa Rosa 220
Socabaya 220
Piura 220
Piura
40.90
Socabaya
38.59
Santa Rosa
36.50
USD/MWh
41
40
39
38
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Día de noviembre 2026
Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Precios: detalle

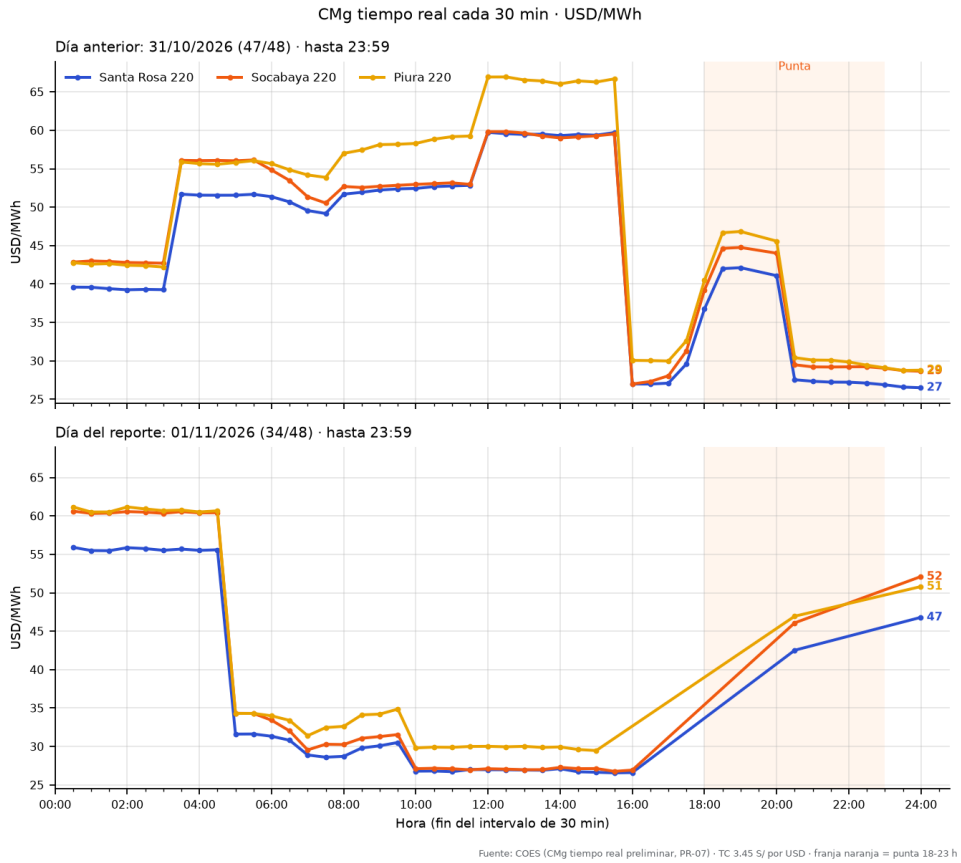


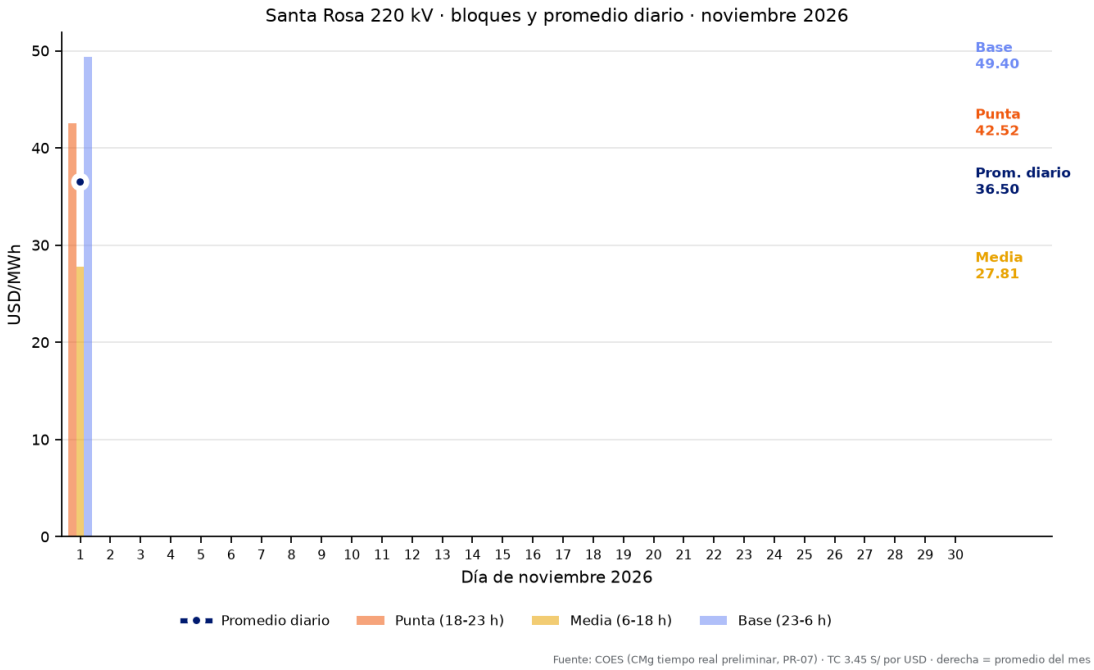

Oferta y demanda

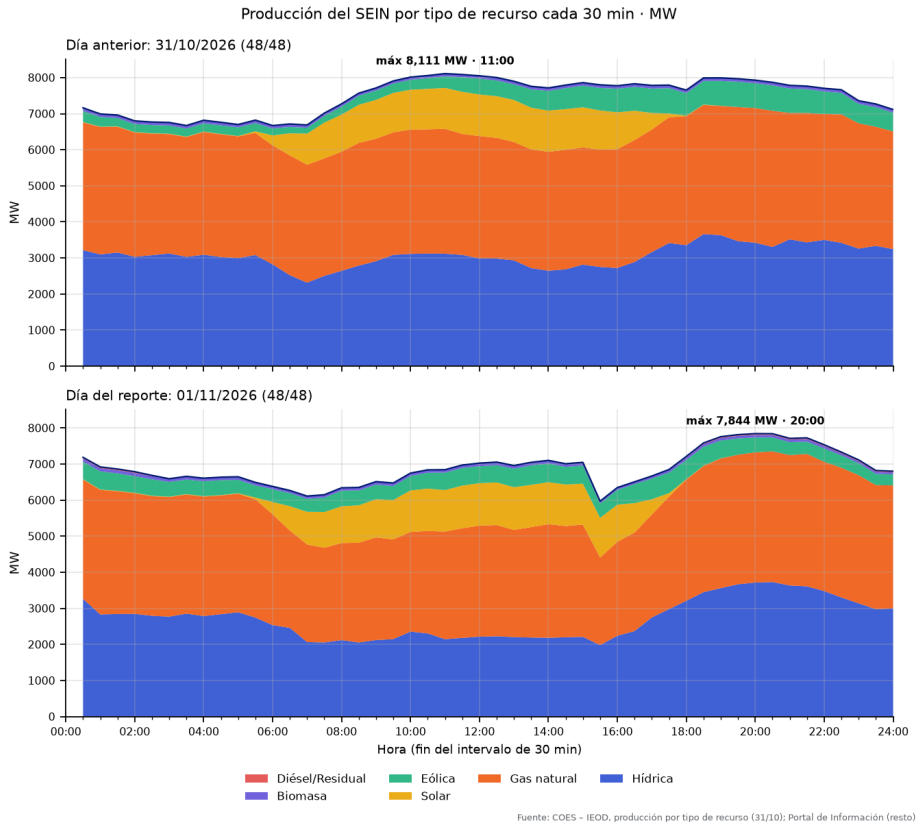

Fuente: COES – IEOD, producción por tipo de recurso (31/10); Portal de Información (resto)

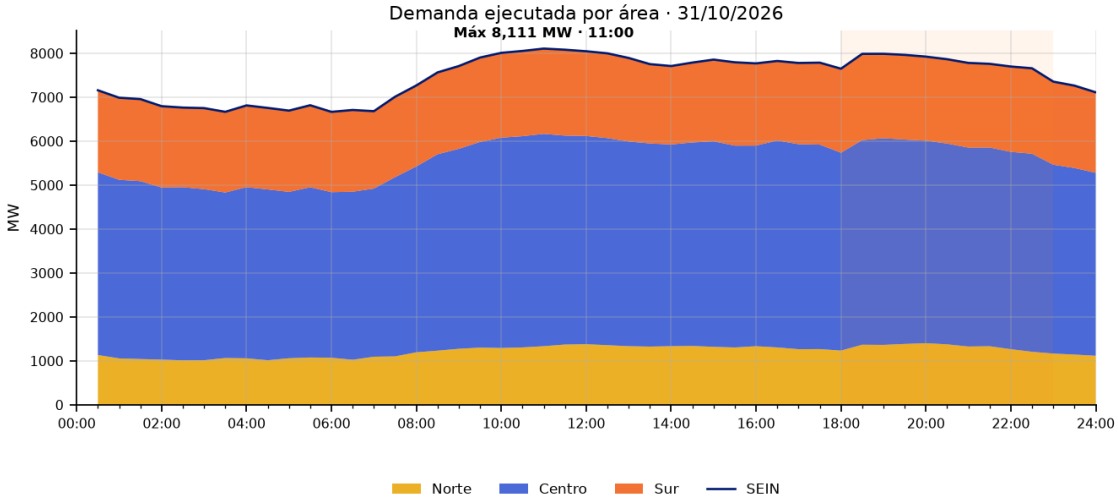



Fuente: COES – IEOD (Anexo A)

Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 31/10/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	42.8	1,006	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

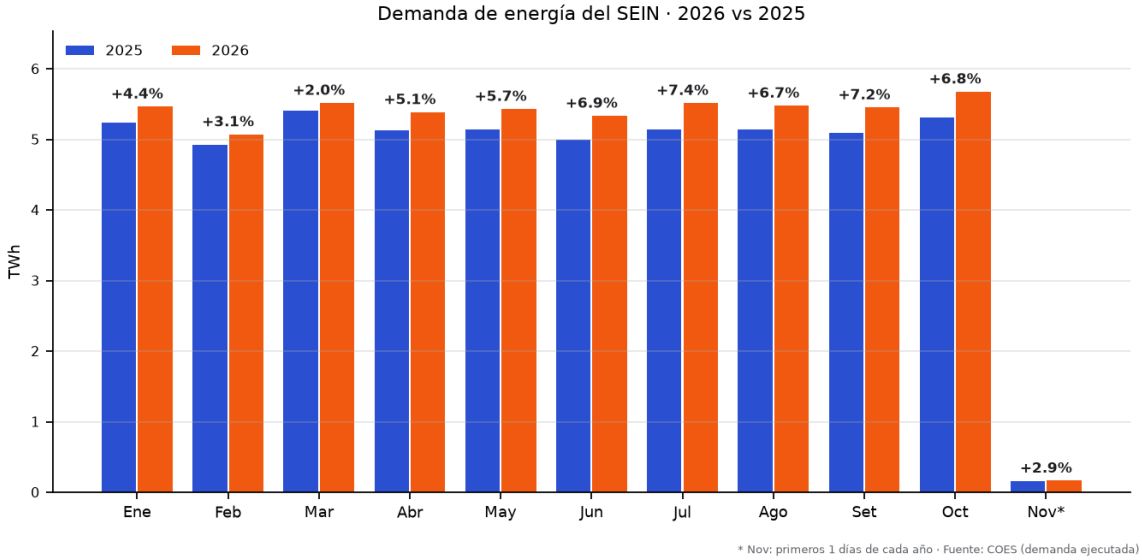


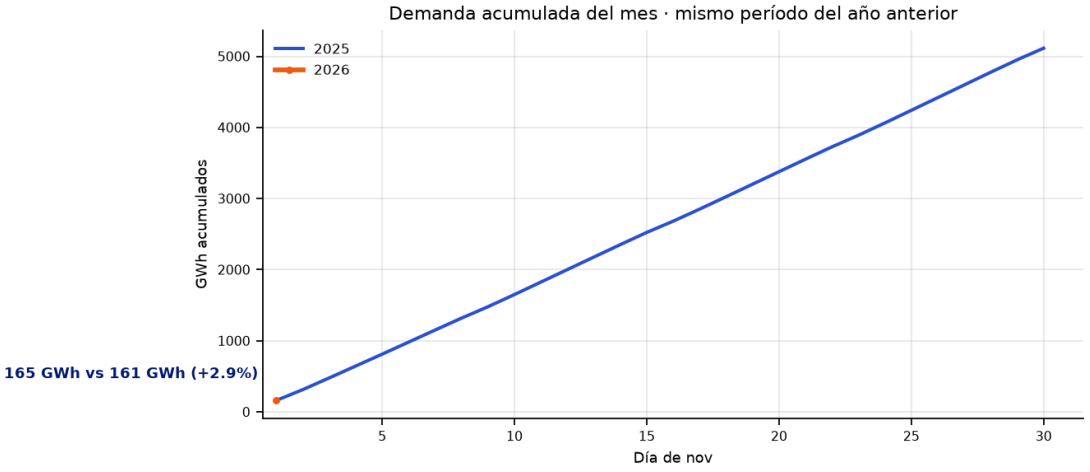


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

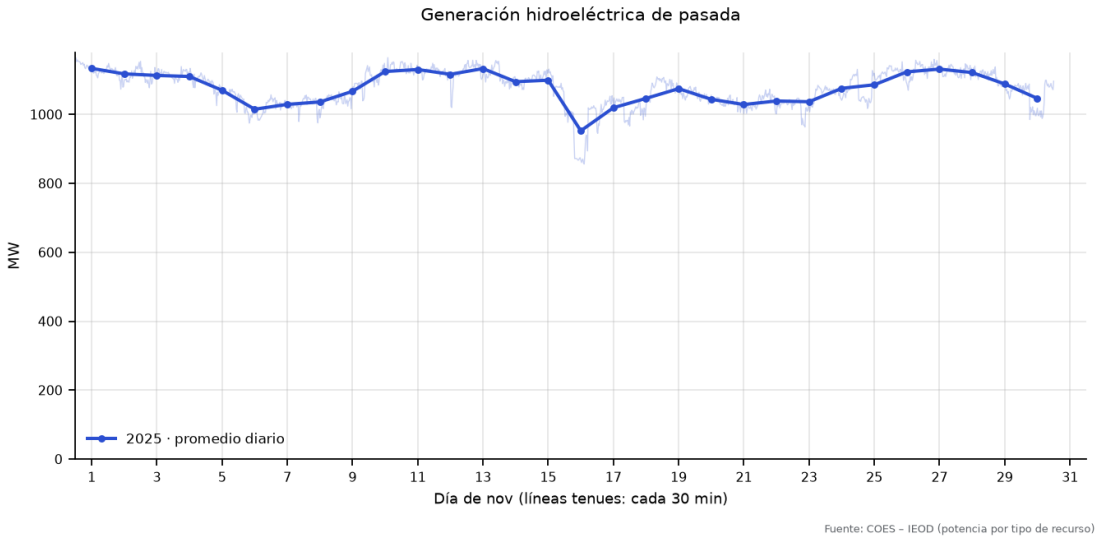

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

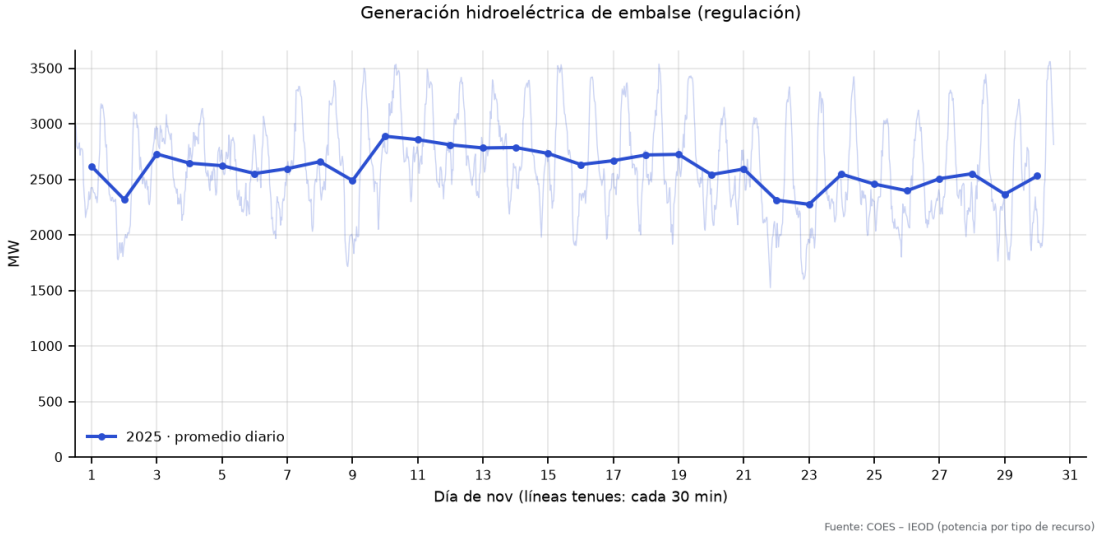

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

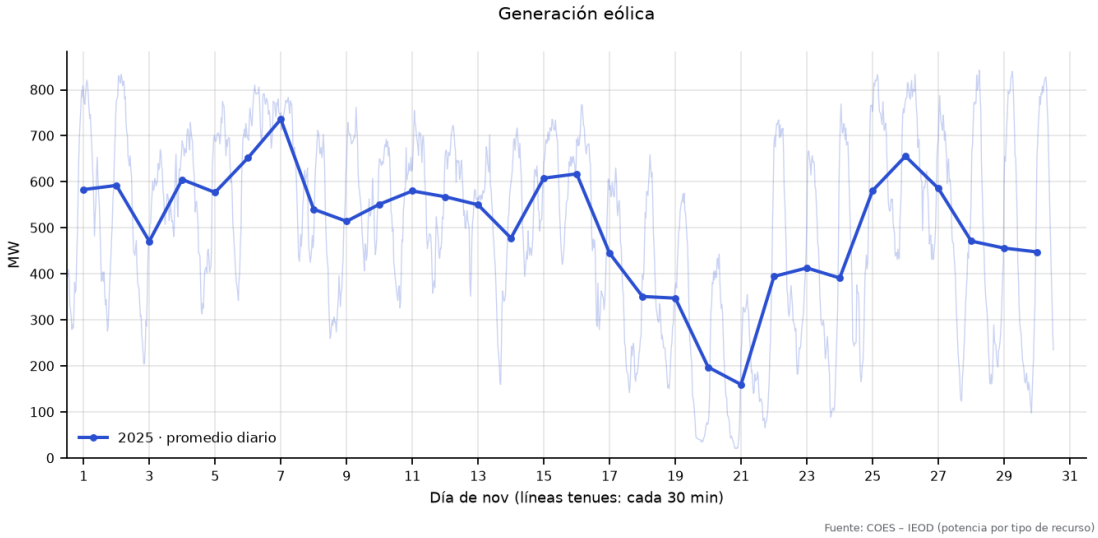

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Indisponibilidades de generación (IEOD del 31/10/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
515 MW	**440 MW**	**347** / **93** MW	**602 MW**
a las 12:00 h	10,563 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (655 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Gas natural 443 MW · Hídrica 194 MW · Eólica 15 MW · Biomasa 3 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa II	TG8	Gas natural	00:00–19:20	**180.0**	Prog.	1. CAMBIO DE FILTROS DE ADMISION POR SATURACION. 2. CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN BUSHINGS DE TRAFO PRINCIPAL TG8. 3.
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	TG7	Gas natural	00:00–16:00	**120.0**	Forzado	Durante el proceso de arranque se produce falla en el motor de arranque.
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	TG7	Gas natural	16:00–24:00	**120.0**	Prog.	1. Reparación de daño estructural a la chimenea de TG7. 2. Inspección Boroscópica de Turbina TG7.
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G1	Hídrica	07:59–14:09	**48.5**	Prog.	Mantenimiento Electromecánico Plan 3 (Segunda parte)
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**44.7**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-11 y TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Parque Eolico Marcona S.A.C.	Parque Eolico Marcona	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	12:13–12:47	**5.7**	Forzado	Desconexión intempestiva por falla de comunicación del sistema WECS de la unidad.
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	16:08–17:05	**5.7**	Forzado	Mantenimiento Correctivo para Inspección, debido a una variación anómala en la temperatura de la camisa del cilindro A5
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	17:06–18:22	**5.7**	Forzado	Mantenimiento Correctivo para Inspección, debido a una variación anómala en la temperatura de la camisa del cilindro A5
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	17:12–17:39	**5.7**	Forzado	Desconexión intempestiva por falla de comunicación del sistema WECS de la unidad.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	06:40–16:47	**3.1**	Forzado	TH-10 Pitch lock retry - waiting Se hizo la reparación del sistema de control pitch pawl y el reemplazo de una electrová
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.4**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G2
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Orazul Energy Perú	Carhuaquero	G2	Hídrica	00:30–04:19	**0.0**	Prog.	Corrección de fuga de aceite en cojinete inferior del generador y limpieza del intercambiador de calor.
Statkraft S.A	Cheves	G1	Hídrica	00:00–17:26	**0.0**	Prog.	Mantenimiento anual G1 (Continuación)
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	217.1	Prog.	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Engie Energia Peru S.A.A.	Ilo 4	TG43	Diésel · excluido	00:00–14:26	200.0	Prog.	TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2037	220	Atn S.A.	Rubi - Montalvo	08:27–16:11	E/S	Medicion de puesta a tierra L-2037.
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL

Eventos relevantes del día

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Aceros Arequipa	L-2217 · Independencia - Aceros Arequipa	11:13–12:26	220	153.0	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2217 (INDEPENDENCIA - ACEROS AREQUIPA) DE 220 kV POR FALLA
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	13:13–24:00			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Falla	Egesur	INDEP_G3 · Independencia	12:13–15:13			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.T. INDEPENDENCIA
Falla	Egesur	INDEP_G3 · Independencia	17:12–18:04			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.T. INDEPENDENCIA
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	00:00–01:31			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	06:44–16:26			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	07:46–16:26		15.7	RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DE LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	17:20–21:58			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Red De Energia Del Peru S.A.	L-2249 · Talara - Zorritos	16:37–16:37	220		RECIERRE EXITOS EN LA LÍNEA L-2249 (TALARA - ZORRITOS) DE 220 kV
Evento	Red De Energia Del Peru S.A.	T47-131 · Quencoro	09:24–22:13		0.6	RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO

Restricciones operativas vigentes


Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
Orazul Energy Perú	C.H. Cañón Del Pato	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de c

…

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 42 · 17/10 al 23/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 42	53.2 -11%	15.6	18.4	-15%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 42	60.5 -63%	123.3	147.2	-16%	105.1 (31/10) -3%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 42	8.1 -3%	151.3	176.6	-14%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 42	8.4 -49%	20.3	11.5	+76%	19.9 (31/10) +75%	387.2 MW
Chaglla	sem. 42	27.5 -66%	0.7	4.0	-82%	2.6 (31/10) -65%	456.4 MW

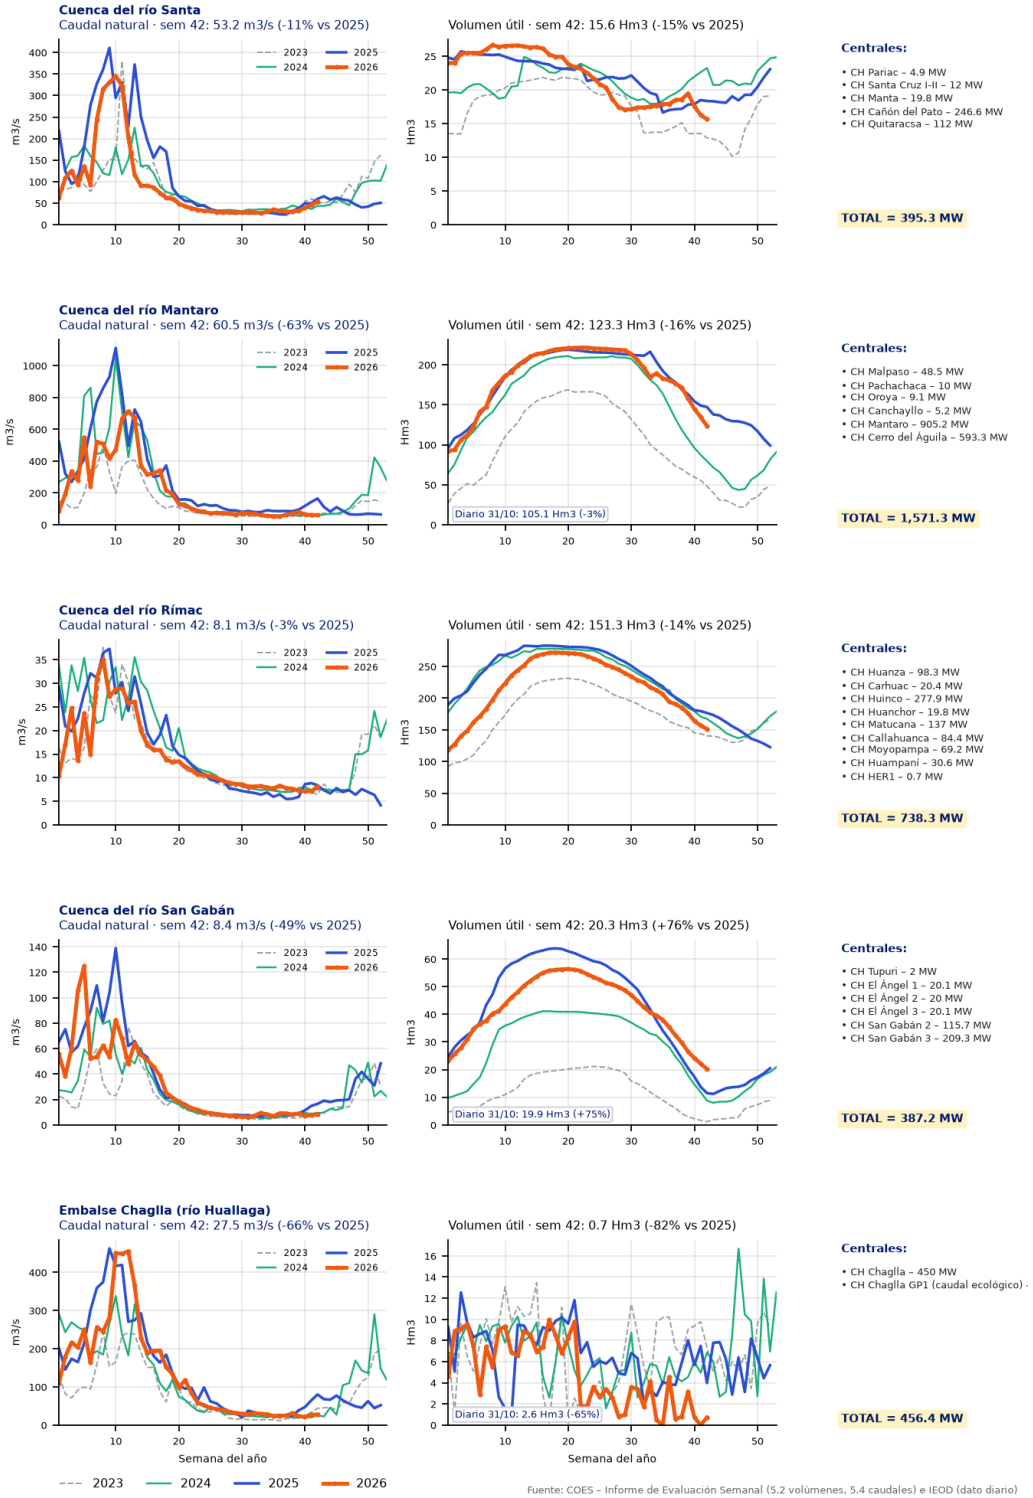

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · lunes 2 de noviembre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (12 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	217.1	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	TG7	00:00–24:00	120.0	1. Reparación de daño estructural a la chimenea de TG7. 2. Inspección Boroscópica de Turbina TG7.
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G2	00:00–24:00	48.0	Instalación de repuestos de interruptor de potencia.
Egasa	Charcani V	G2	07:00–15:00	48.0	Mantenimiento Electromecánico Plan 1
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Statkraft S.A	Yaupi	G4	00:00–18:00	21.0	MANTENIMIENTO UH G4
Agro Industrial Paramonga S.A.	Paramonga	CENTRAL	00:00–24:00	14.0	Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	06:00–24:00	6.0	F/S POR INSPECCION EN RODETE
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
San Gaban	Pch Tupuri	CENTRAL	08:00–17:00	2.1	Mantenimiento del Transformador Principal del Patio de Llaves
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	La Gringa V	G1	06:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 67000 HRS
Petramas	Doña Catalina	G1	06:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 51000 HRS

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
