# Resumen · 8 de noviembre 2026

**El 8 de noviembre, Santa Rosa promedió 32.98 USD/MWh, 27.8% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025. Para el 9 de noviembre se programan hasta 434 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).**

| Precio de referencia | Demanda máxima | Indisponibilidad | Próxima jornada · 9 de noviembre |
|---|---|---|---|
| **32.98 USD/MWh** | **8,236 MW** | **420 MW** | **434 MW** |
| Santa Rosa 220 · -27.8% diario | pico a las 20:00 h · +654 MW vs 2025 · mes +10.5% vs 2025 | máx. simultáneo · prog. 227 / forz. 18 MW prom. | San Gaban Iii G1 · 104 MW · 06:00–21:00 |

## Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 32.98 USD/MWh: -27.8% frente a ayer y 29% bajo el promedio del mes (46.33).
- **Demanda.** Energía del mes 1,456 GWh, +10.5% frente a los mismos 8 días de 2025; máxima del 8 de noviembre 8,236 MW, +654 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,618 MW (+920 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: San Gaban III (-15.9 GWh), Chimay (-12.0 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 426 MW, -28% frente a 2025; el 8 de noviembre promedió 313 MW.
- **Operación.** Se registraron 3 congestiones de transmisión; pueden separar los precios entre barras.

## Qué vigilar · 9 de noviembre

**1.** San Gaban III G1 fuera de servicio (104 MW): mantenimiento preventivo de equipos turbina, inspección de sellos de… (06:00–21:00)

**2.** Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

**3.** Desde el 16 de noviembre: Chaglla G1 235 MW en mantenimiento

■ **CMg incompleto:** Solo 46 de 48 intervalos del día tienen CMg publicado.


## Huanchor

- Huanchor generó **353.3 MWh** (-19% vs mismo día 2025); en el mes 2,880 MWh (-16.8%).
- Precio capturado del día 32.77 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 11,093 USD, cobertura 96% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 45.94 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 98% de la energía; cobertura 98%). Promedio de la misma referencia: 46.05.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 7.4 m3/s (+1%), volumen 145 Hm3 (-16%) vs año anterior.

## Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


| Barra | Día 08/11 | Día anterior | Variación | Promedio mes |
|---|---|---|---|---|
| Santa Rosa 220 | 32.98 | 45.67 | -27.8% | 46.33 |
| Socabaya 220 | 35.23 | 48.87 | -27.9% | 49.24 |
| Piura 220 | 35.29 | 49.75 | -29.1% | 50.77 |


| Santa Rosa 220 kV · bloque | Día 08/11 | Promedio mes |
|---|---|---|
| Punta (18-23 h) | 43.40 | 51.25 |
| Media (6-18 h) | 26.90 | 43.87 |
| Base (23-6 h) | 35.75 | 47.02 |

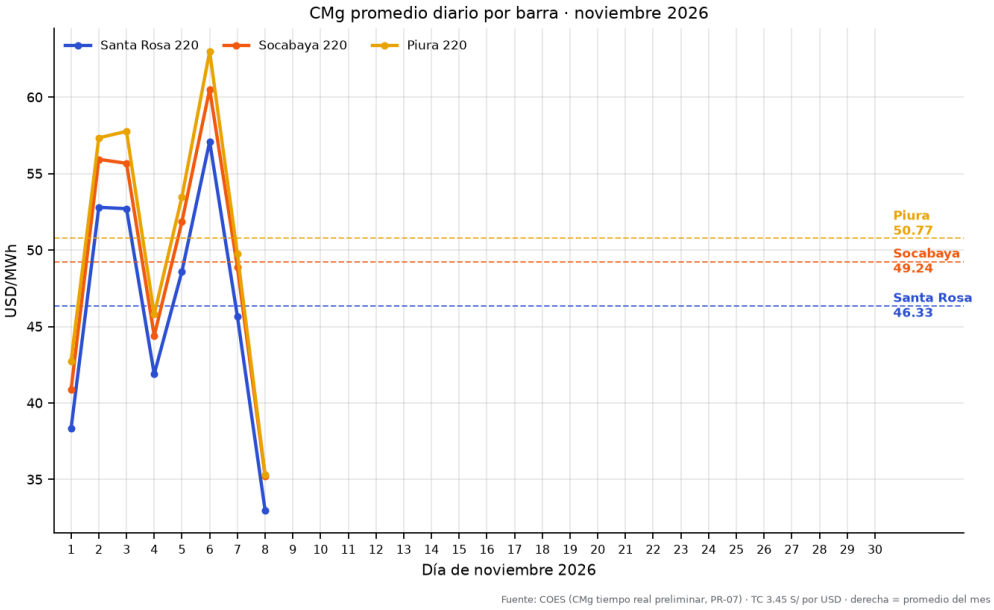



Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

## Precios: detalle

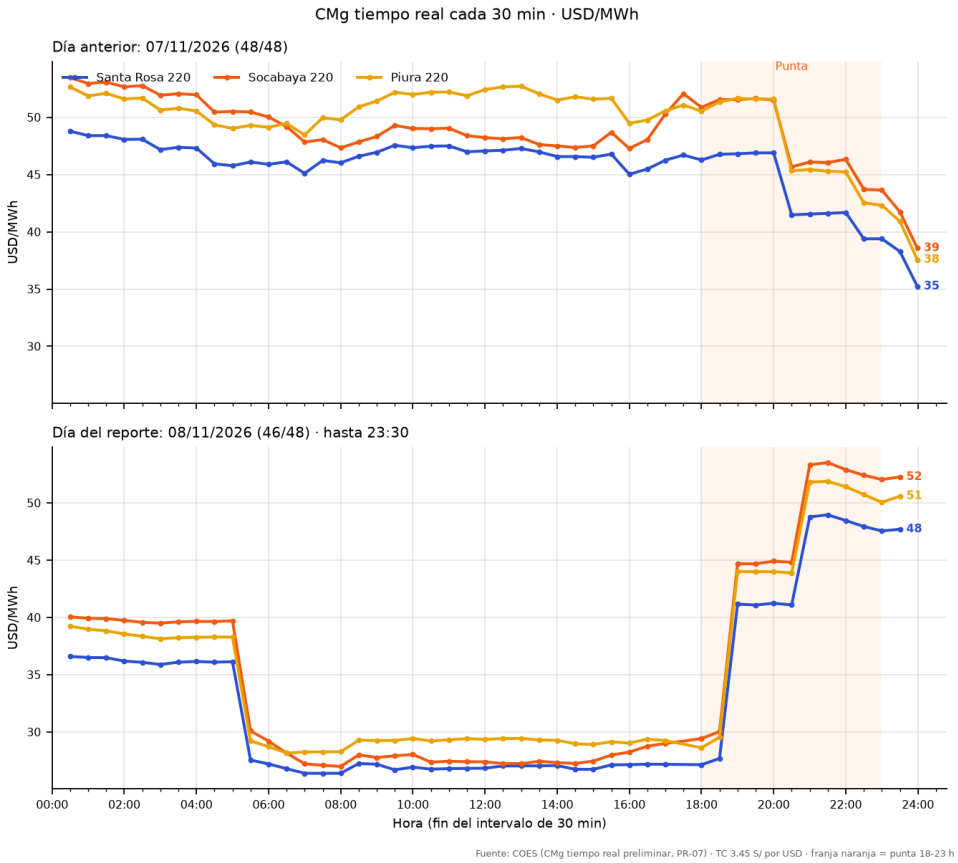

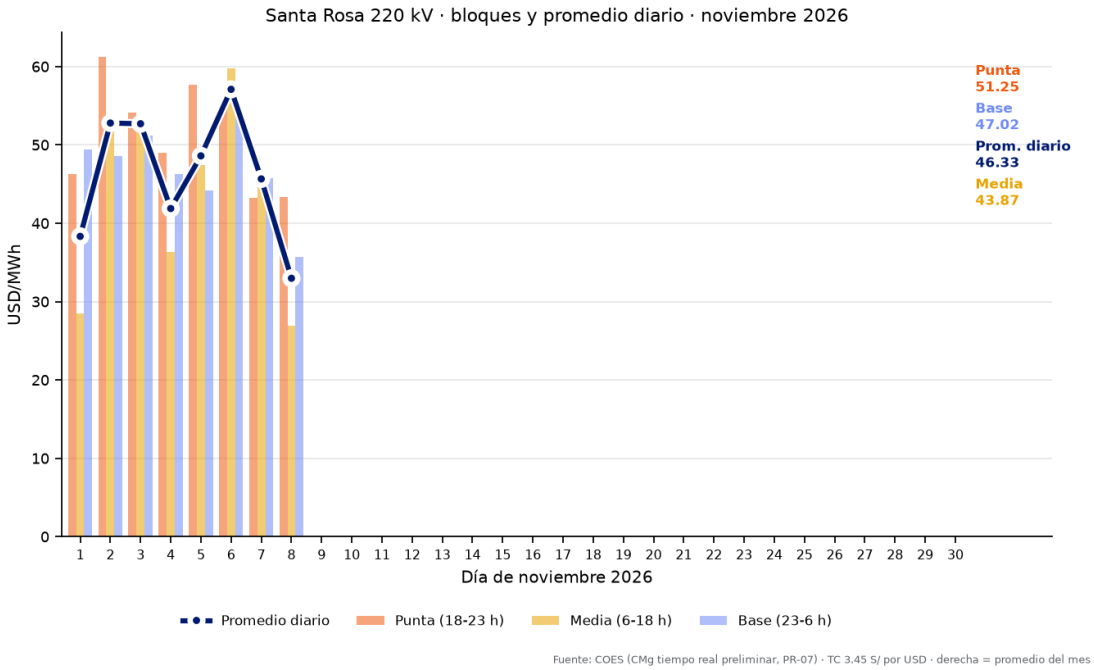
## Oferta y demanda

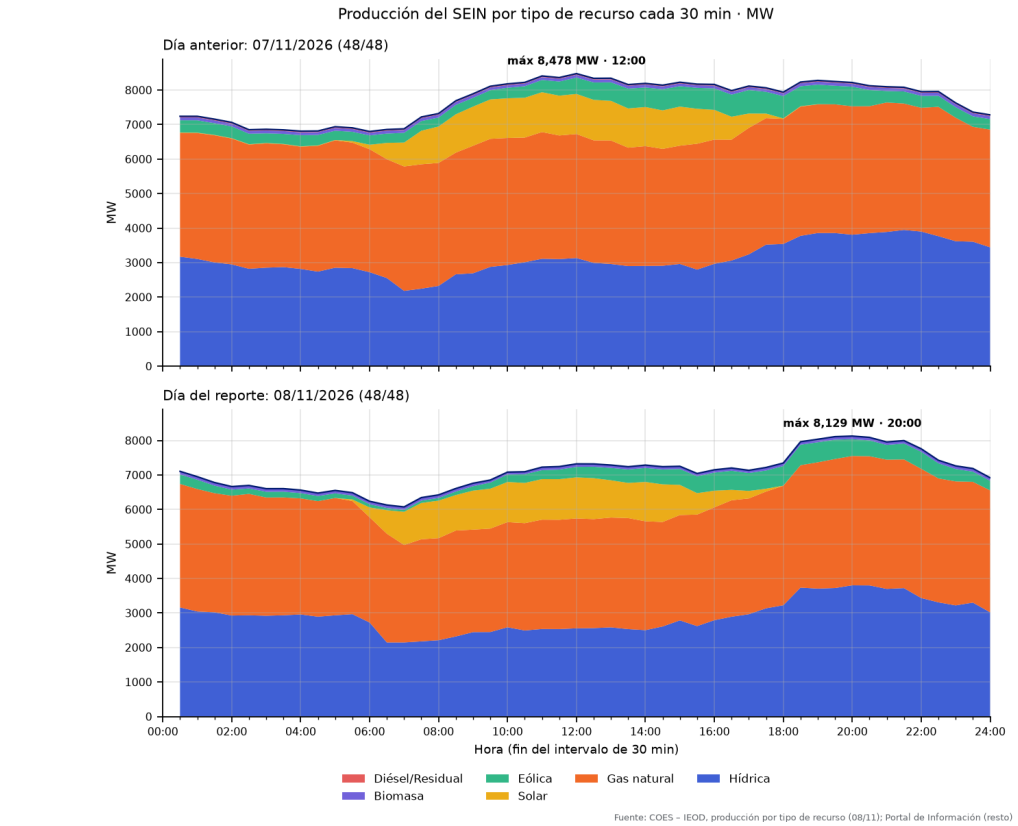


Fuente: COES – IEOD, producción por tipo de recurso (08/11); Portal de Información (resto)

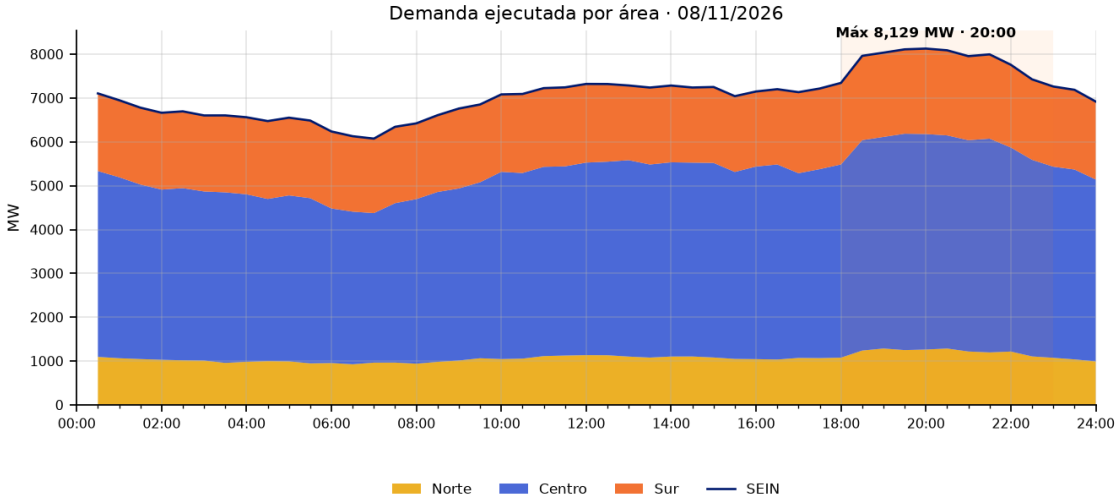




Fuente: COES – IEOD (Anexo A)

## Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 08/11/2026: HOP y despacho ejecutado)


| Central / grupo | Empresa | Clasificación | Combustible | Horario | MW máx. | MWh | Tipo de operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refineria Talara TV1 | Gm Operaciones S.A.C. | – | Gas de refinería (NLH_RFG) | 00:00–00:00 | 43.4 | 1,007 | Por cogeneracion |
| Refineria Talara TV2 | Gm Operaciones S.A.C. | – | Gas de refinería (NLH_RFG) | 12:49–00:00 | 13.1 | 140 | Por cogeneracion |

## Demanda vs. año anterior

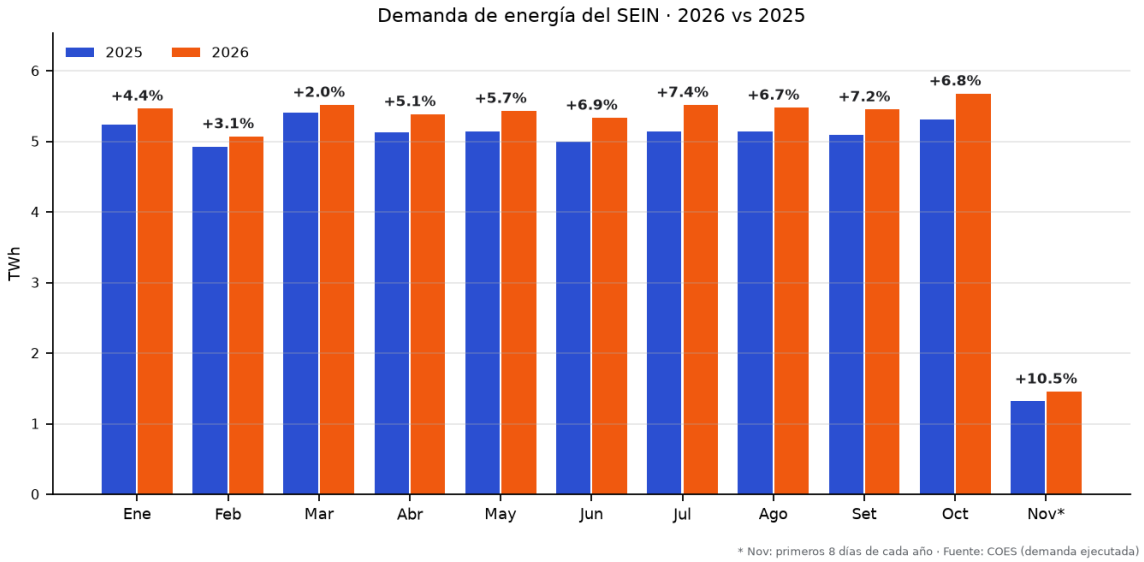


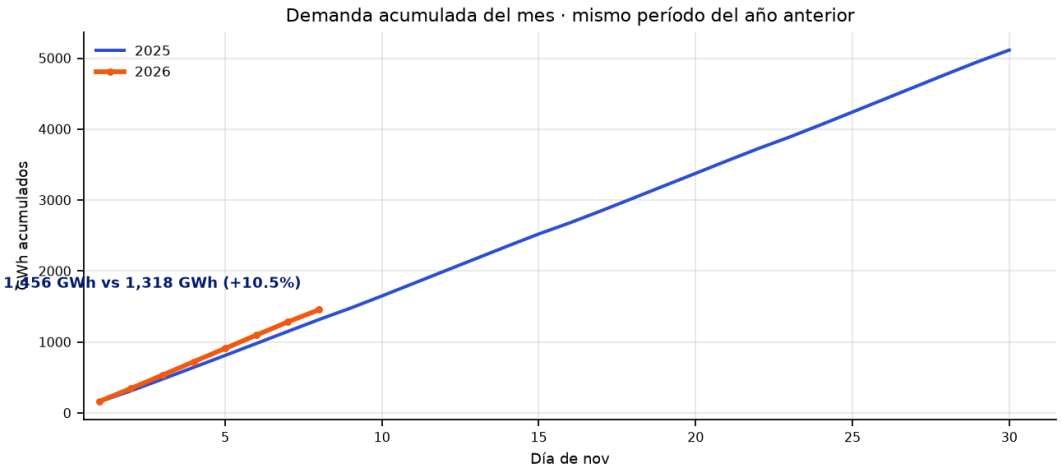
## Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

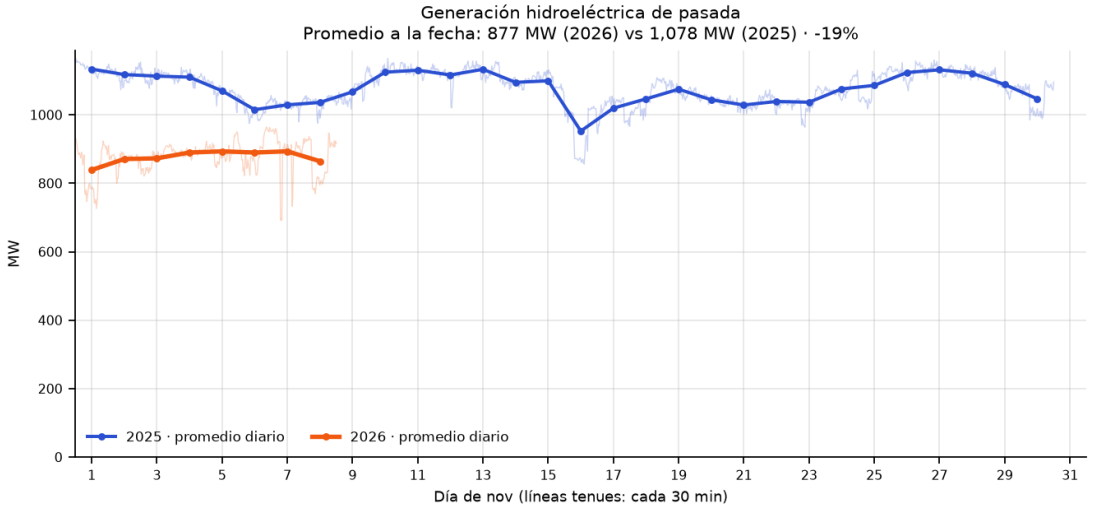


Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

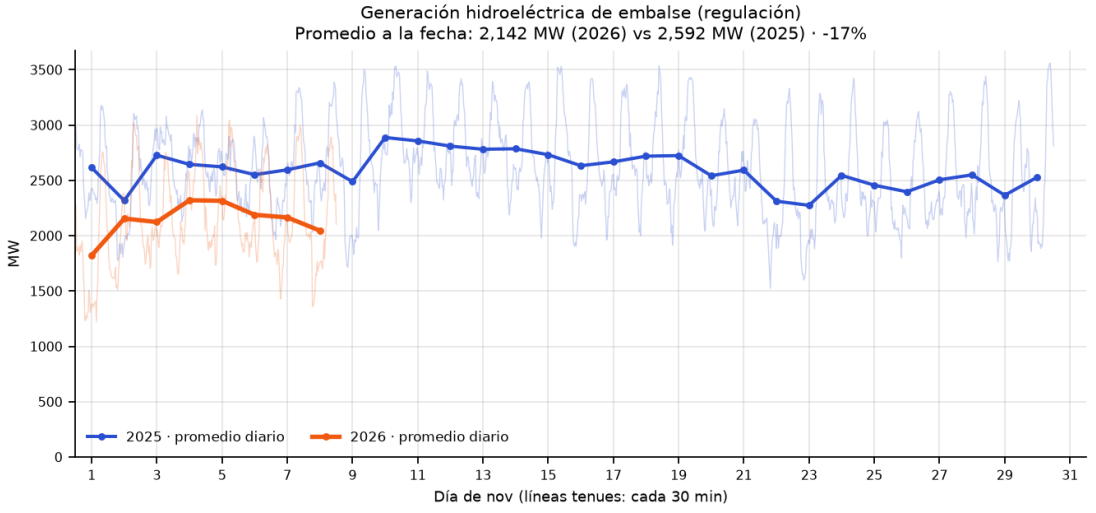


Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

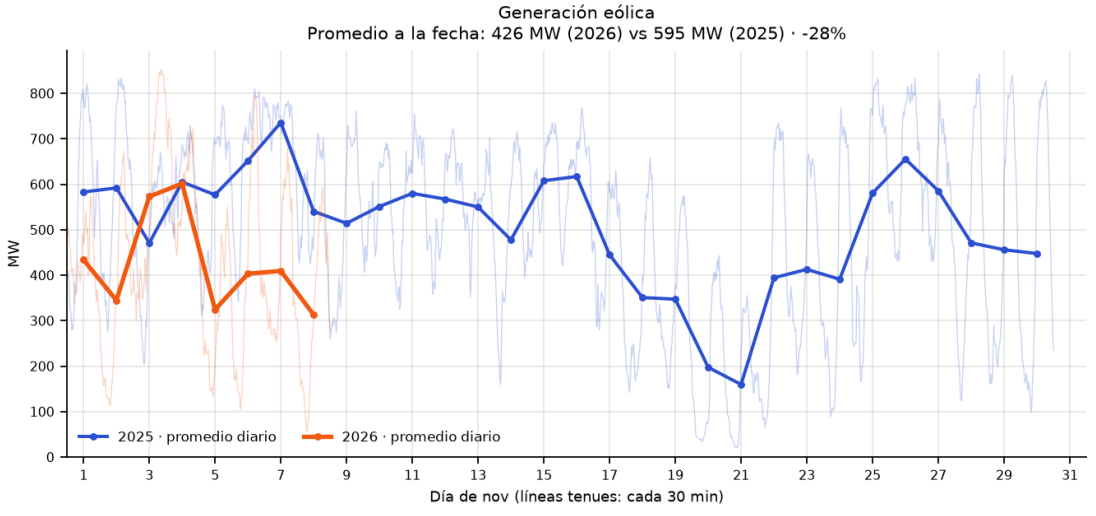


Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

## Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–8 de ambos años, IEOD)

| Central | Empresa | Tipo | GWh 2026 | GWh 2025 | Diferencia | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Gaban III | Hydro Global Perú S.A.C. | Regulación | 19.65 | 35.55 | -15.89 | -45% |
| Chimay | Chinango S.A.C. | Regulación | 13.89 | 25.84 | -11.95 | -46% |
| El Platanal | Celepsa | Regulación | 12.44 | 22.40 | -9.96 | -44% |
| Mantaro | Electroperu | Regulación | 110.11 | 119.05 | -8.94 | -8% |
| Yaupi | Statkraft S.A | Pasada | 14.32 | 20.43 | -6.11 | -30% |
| Yuncan | Engie Energia Peru S.A.A. | Regulación | 11.92 | 17.95 | -6.03 | -34% |
| Machupicchu | Egemsa | Pasada | 22.52 | 28.16 | -5.64 | -20% |
| San Gaban II | San Gaban | Regulación | 14.70 | 20.20 | -5.49 | -27% |
| La Virgen | La Virgen | Regulación | 5.85 | 10.05 | -4.20 | -42% |
| Restitución | Electroperu | Pasada | 36.99 | 40.72 | -3.73 | -9% |
| Santa Teresa | Inland Energy Sac | Pasada | 11.69 | 15.10 | -3.40 | -23% |
| Cheves | Statkraft S.A | Regulación | 11.51 | 14.21 | -2.70 | -19% |
| Charcani IV | Egasa | Pasada | 0.00 | 2.32 | -2.32 | -100% |
| Angel I | Generadora De Energía Del Perú | Pasada | 1.31 | 3.58 | -2.27 | -63% |
| Anashironi | Vari Energia S.A.C. | Pasada | 1.66 | 3.90 | -2.24 | -57% |
| Angel II | Generadora De Energía Del Perú | Pasada | 1.41 | 3.65 | -2.23 | -61% |
| Manta I | Celaris Energy S.A. | Pasada | 1.08 | 3.31 | -2.23 | -67% |
| Angel III | Generadora De Energía Del Perú | Pasada | 1.40 | 3.61 | -2.21 | -61% |
| Yanango | Chinango S.A.C. | Pasada | 3.27 | 5.10 | -1.83 | -36% |
| Runatullo III | Egejunin | Pasada | 1.41 | 2.88 | -1.47 | -51% |
| Cahua | Statkraft S.A | Pasada | 6.66 | 8.04 | -1.38 | -17% |
| Huasahuasi I | Egejunin | Pasada | 0.90 | 2.05 | -1.15 | -56% |
| Matucana | Orygen Peru S.A.A. | Regulación | 13.81 | 14.88 | -1.07 | -7% |
| Runatullo II | Egejunin | Pasada | 0.99 | 2.03 | -1.03 | -51% |
| Rucuy | Sinersa | Pasada | 1.96 | 2.96 | -1.00 | -34% |

Total hidro: 522.4 GWh vs. 607.2 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

## Indisponibilidades de generación (IEOD del 08/11/2026)

| Máximo simultáneo sin diésel | Promedio del día | Programado / forzado (prom.) | Diésel (excluido, máx.) |
|---|---|---|---|
| **420 MW** | **245 MW** | **227** / **18** MW | **398 MW** |
| a las 08:30 h | 5,870 MWh de capacidad | | |

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (511 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 477 MW · Gas natural 17 MW · Eólica 14 MW · Biomasa 3 MW

| Empresa | Central | Unidad | Tecnología | Horario | MW | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinango S.A.C. | Chimay | CENTRAL | Hídrica | 08:24–11:22 | **150.0** | Prog. | NORMALIZACION DE LA REDUNDANCIA DE LOS SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA TARJETAS DE CONTROL |
| Electroperu | Mantaro | G7 | Hídrica | 00:00–24:00 | **101.0** | Prog. | REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA |
| Chinango S.A.C. | Chimay | G2 | Hídrica | 08:24–15:47 | **75.0** | Prog. | ALISADO DE ANILLOS ROTORICOS DEL GENERADOR |
| Electroperu | Restitución | G1 | Hídrica | 06:00–17:37 | **66.0** | Prog. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS |
| Egasa | Charcani V | G3 | Hídrica | 00:00–24:00 | **48.0** | Prog. | Instalación de repuestos de interruptor de potencia. |
| Egesur | Aricota I | G1 | Hídrica | 06:10–14:00 | **11.0** | Prog. | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / GRUPO DE GENERACIÓN EN RESERVA POR MANTENIMIENTO SE ARICOTA 1 |
| Egesur | Aricota I | G2 | Hídrica | 06:28–14:03 | **11.0** | Prog. | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / GRUPO DE GENERACIÓN EN RESERVA POR MANTENIMIENTO SE ARICOTA 1 |
| Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C. | Parque Eolico 3 Hermanas | CENTRAL | Eólica | 00:00–24:00 | **9.4** | Forzado | TH-11, TH-04 y TH-05 - TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención |
| Energia Renovable Del Sur S.A. | San Juan | CENTRAL | Hídrica | 00:00–24:00 | **5.9** | Forzado | A7.3 Fuera de servicio hasta intervención |
| Egesur | Independencia | INDEP_G2 | Gas natural | 00:00–08:24 | **5.7** | Forzado | Mantenimiento correctivo por baja temperatura del cilindro A3 |
| Egesur | Independencia | INDEP_G2 | Gas natural | 08:44–09:30 | **5.7** | Forzado | Mantenimiento correctivo por baja temperatura del cilindro A3 |
| Egesur | Independencia | INDEP_G4 | Gas natural | 23:23–24:00 | **5.7** | Forzado | Desconexión intempestiva de la unidad por rotura de manguera flexible de agua en el sistema HT. La unidad queda indispon |
| Egasa | Charcani III | CENTRAL | Hídrica | 07:03–15:47 | **4.7** | Prog. | FS Charcani 1, 2,3 |
| Parque Eolico Marcona S.A.C. | Parque Eolico Marcona | CENTRAL | Eólica | 22:09–24:00 | **2.3** | Forzado | M-04 fuera de servicio por alarma GrdInv: 241 Delta 1 DIB +15v |
| Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C. | Parque Eolico 3 Hermanas | CENTRAL | Eólica | 00:00–24:00 | **2.3** | Forzado | TH-23 fuera de servicio por alarma 63302 - IO module 1 powerdown detected |
| Inversiones Shaqsha S.A.C. | Misapuquio | G1 | Hídrica | 08:00–18:00 | **1.9** | Prog. | Mantenimiento del sistema de protecciones G1 y TR |
| Egasa | Charcani I | CENTRAL | Hídrica | 07:12–16:02 | **1.6** | Prog. | FS Charcani 1, 2,3 |
| Petramas | Huaycoloro | G1 | Biomasa | 00:00–24:00 | **1.5** | Prog. | MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR |
| Petramas | Ctb Callao | G1 CALLAO | Biomasa | 00:00–24:00 | **1.2** | Prog. | MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS |
| Egasa | Charcani II | CENTRAL | Hídrica | 06:49–15:32 | **0.6** | Prog. | FS Charcani 1, 2,3 |
| Egemsa | Machupicchu | G2 | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | Cambio de sistema de control G2 |
| Egemsa | Machupicchu | G3 | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | Cambio de sistema de control SCADA del G3 |
| Kallpa Generacion S.A. | Cerro Del Aguila | G2 | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | MANTENIMIENTO PARCIAL (MENOR) U2 |
| Orazul Energy Perú | Cañón Del Pato | G5 | Hídrica | 00:00–24:00 | **0.0** | Prog. | OVERHAUL GENERADOR U5 |
| Vari Energia S.A.C. | Anashironi | G1 | Hídrica | 08:00–13:00 | **0.0** | Prog. | Reemplazo de Relé de Protección Primaria 7UM85 (Supeditado a la conformidad de SNP) |

| Empresa | Central | Unidad | Tecnología | Horario | MW | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A. | Reserva Fria De Generacion Eten | RF-ETE NGT1 | Diésel · excluido | 00:00–24:00 | 213.7 | Prog. | REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1 |
| Minera Cerro Verde | Recka | CENTRAL | Diésel · excluido | 00:00–24:00 | 175.9 | Prog. | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA |
| Electroperu | Tumbes | MAK2 | Diésel · excluido | 00:00–24:00 | 8.5 | Prog. | Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026) |

# Transmisión ≥220 kV y eventos

## Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

| Línea | kV | Empresa | Tramo | Horario | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-5012 | 500 | Concesionaria Linea De Transmision La Ni?A S.A.C. | La Ni?A - Miguel Grau | 07:01–17:31 | F/S | Linea L-5012, Limpieza y siliconado de cadenas; cantidad 60 cadenas de la T098-T103, T122, T128, T147 y T149. |
| L-5033 | 500 | Transmantaro | Poroma - Yarabamba | 00:00–24:00 | E/S | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA. |
| L-2015 | 220 | Conelsur Lt Sac | Chavarria - Cajamarquilla | 07:01–17:42 | F/S | DESCONEXION POR MANTENIMIENTO EN CELDA CAJAMARQUILLA |
| L-2020 | 220 | Compa?Ia Minera Antapaccay S.A. | Tintaya Nueva - Antapacay | 07:04–13:42 | F/S | - Mantenimiento rutinario y Limpieza manual de aisladores y ferreteria de las estructuras. LT 2020 - 220kV (T3, T4, T6, |
| L-2021 | 220 | Compa?Ia Minera Antapaccay S.A. | Tintaya Nueva - Antapacay | 14:02–17:44 | F/S | Pruebas END TO END |
| L-2036 | 220 | Transmisora Electrica Del Sur 3 S.A.C. -Tesur 3 | Montalvo - Los Heroes | 07:39–15:57 | F/S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. |
| L-2037 | 220 | Atn S.A. | Rubi - Montalvo | 07:08–13:28 | E/S | Medicion SPAT |
| L-2091 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Desierto | 00:00–24:00 | F/S | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON |
| L-2091 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Desierto | 09:49–15:46 | F/S | FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL BAIPÀS L-2091/L-2305 A SOLICITUD DE UNIDAD MINERA CERRO LINDO POR TRABAJOS EN S.E. DESIERTO. |
| L-2120 | 220 | Inti Joya S.A.C. | San Jose - America | 00:00–24:00 | E/S | Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas |
| L-2130 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Huancavelica - Chiribamba | 00:00–24:00 | E/S | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS |
| L-2166 | 220 | Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A. | Eten - Reque | 06:42–11:05 | F/S | DESCONEXION DE LA LINEA L-2166 A SOLICITUD DE ISA ENERGIA DEBIDO A MANTENIMIENTO DE CL-2166 . |
| L-2211 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Ica - Derivacion | 00:00–24:00 | E/S | SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE |
| L-2232 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chimu - Chimbote 1 | 00:00–24:00 | F/S | POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE |
| L-2234 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Guadalupe - Trujillo Norte | 07:30–17:28 | F/S | A SOLICITUD DE CONELSUR, POR EL CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2260, SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LAS LINEAS L-2235 |
| L-2235 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Guadalupe - Trujillo Norte | 07:30–17:27 | F/S | A SOLICITUD DE CONELSUR, POR EL CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2260, SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LAS LINEAS L-2235 |
| L-2254 | 220 | Isa Peru | Vizcarra - Paragsha 2 | 10:31–16:26 | F/S | POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE ANTAMINA EL CORTE INICA |
| L-2260 | 220 | Conelsur Lt Sac | Trujillo Norte - Cajamarca Norte | 00:00–24:00 | F/S | CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERIA, SPAT Y PINTADOT47 A T82 |
| L-2280 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Alipio Rosales - Machala | 00:00–24:00 | E/S | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. |
| L-2303 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San Jose - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. |
| L-2304 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San Jose - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. |
| L-2305 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Independencia | 00:00–24:00 | E/S | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL |
| L-2305 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Independencia | 09:49–15:46 | F/S | BKL: CAMBIO PERFILES EN LAS TORRES T8, T201, T202 Y T208. REQUIERE CL-2091 EN SE DESIERTO CON RECIERRES DESHABILITADOS. |
| L-2305 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Independencia | 09:49–15:46 | F/S | FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL BAIPÀS L-2091/L-2305 A SOLICITUD DE UNIDAD MINERA CERRO LINDO POR TRABAJOS EN S.E. DESIERTO. |

| Línea | kV | Empresa | Tramo | Horario | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-2307 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Desierto-Chincha | 08:57–19:59 | F/S | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE UNIDAD MINERA CERRO LINDO POR TRABAJOS EN S.E. DESIERTO. |
| L-2312 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Derivacion - Cahuachi | 08:21–17:35 | F/S | A SOLICITUD DE ENGIE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2312 SE DERIVACION. |
| L-2313 | 220 | Engie Energia Peru S.A.A. | Derivacion - Punta Lomitas | 07:46–18:06 | F/S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2313 SE PUNTA LOMITAS |

## Eventos relevantes del día

| Tipo | Empresa | Equipo | Horario | kV | MW | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | Conelsur Lt Sac | SS.EE. · Portillo | 00:00–01:08 | | | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |
| Falla | Egesur | INDEP_G4 · Independencia | 23:23–23:23 | | | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA C.T. INDEPENDENCIA POR FALLA |
| Evento | Electro Oriente | L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto | 18:14–21:42 | | | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |
| Falla | Electronoroeste S.A. | BARRA33KV · Tumbes | 15:02–16:16 | 33 | | DESCONEXION DE LA BARRA DE 33 KV DE LA S.E. ZORRITOS |
| Falla | Empresa De Generacion Electrica Santa Ana S.A.C. | CENTRAL · Renovandes H1 | 05:36–08:51 | 14 | | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. RENOVANDES |
| Falla | Empresa De Generacion Electrica Santa Ana S.A.C. | G1 · Renovandes H1 | 19:24–24:00 | 14 | | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH RENOVANDES H1 POR FALLA |
| Falla | Minera Buenaventura | L-6017 · Ares - Huancarama | 14:05–14:10 | 66 | | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6017 (ARES - HUANCARAMA) DE 60 KV POR FALLA |
| Falla | San Gaban | L-1010 · Azángaro - San Gabán II | 08:22–09:19 | 138 | 1.6 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1010 (AZÁNGARO - SAN GABÁN) DE 138 KV |
| Falla | Sinersa | L-6668 · Poechos - Sullana | 11:27–24:00 | 60 | | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6668 (POECHOS - SULLANA) EN 60 KV POR FALLA |
| Evento | Atlantica Transmision Sur S.A. | L-5034 · Poroma - Ocona | 17:39–19:59 | | | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |
| Falla | Transmantaro | L-2154 · Tingo María - Chaglla | 19:34–24:00 | 220 | | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2154 (TINGO MARÍA - CHAGLLA) DE 220 kV POR FALLA |

## Restricciones operativas vigentes


| Empresa | Ubicación | Equipo | Horario | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Chinango S.A.C. | C.H. Chimay | CENTRAL | 00:00–24:00 | .Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en |
| Egasa | S.E. Convertidor | BARRA138 KV | 00:00–24:00 | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento. |
| Empresa De Generacion Huallaga | C.H. Chaglla | CENTRAL | 00:00–24:00 | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas | TG4 | 00:00–24:00 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18 |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas | TG4 | 00:00–24:00 | Según correo del 03/11, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Malacas 1 | TG6 | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo informado por correo el 01.10.2026 la CT Malacas TG6 presenta una limitación de 40 MW por te |
| Enel Generacion Piura S.A. | C.T. Reserva Fria De Generacion Talara | TG5 | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas. |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Quitaracsa | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Yuncán | G2 | 00:00–24:00 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Yuncán | G3 | 00:00–24:00 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.H. Yuncán | G3 | 00:00–24:00 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 1 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho. |

| Empresa | Ubicación | Equipo | Horario | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 1 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 1 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera |
| Engie Energia Peru S.A.A. | C.T. Chilca 2 | CENTRAL | 00:00–24:00 | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera |
| Fenix Power Perú | C.T. Fenix | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s |
| Kallpa Generacion S.A. | C.H. Cerro Del Aguila | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = |
| Kallpa Generacion S.A. | C.H. Mini Central Cerro Del Aguila | CENTRAL | 00:00–24:00 | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre. |
| Kallpa Generacion S.A. | C.H. Mini Central Cerro Del Aguila | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Kallpa | CENTRAL | 00:00–24:00 | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Kallpa | CENTRAL | 00:00–24:00 | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Kallpa | CENTRAL | 00:00–24:00 | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho. |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Las Flores | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h |
| Kallpa Generacion S.A. | C.T. Las Flores | CENTRAL | 00:00–24:00 | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas |

…

## Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 43 · 24/10 al 30/10/2026 · dato diario: IEOD)

| Cuenca | Semana | Caudal natural (m3/s) y var. | Volumen (Hm3) | Año ant. | Var. | Dato diario IEOD (Hm3) | Potencia instalada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa | sem. 43 | 57.3 -13% | 13.8 | 18.3 | -24% | solo semanal | 395.3 MW |
| Mantaro | sem. 43 | 76.9 -31% | 114.9 | 138.0 | -17% | 83.9 (08/11) -7% | 1,571.3 MW |
| Rímac | sem. 43 | 7.4 +1% | 144.9 | 173.3 | -16% | solo semanal | 738.3 MW |
| San Gabán | sem. 43 | 11.8 -38% | 19.4 | 11.2 | +73% | 18.4 (08/11) +62% | 387.2 MW |
| Chaglla | sem. 43 | 44.3 -35% | 2.5 | 7.8 | -67% | 6.4 (08/11) -20% | 456.4 MW |

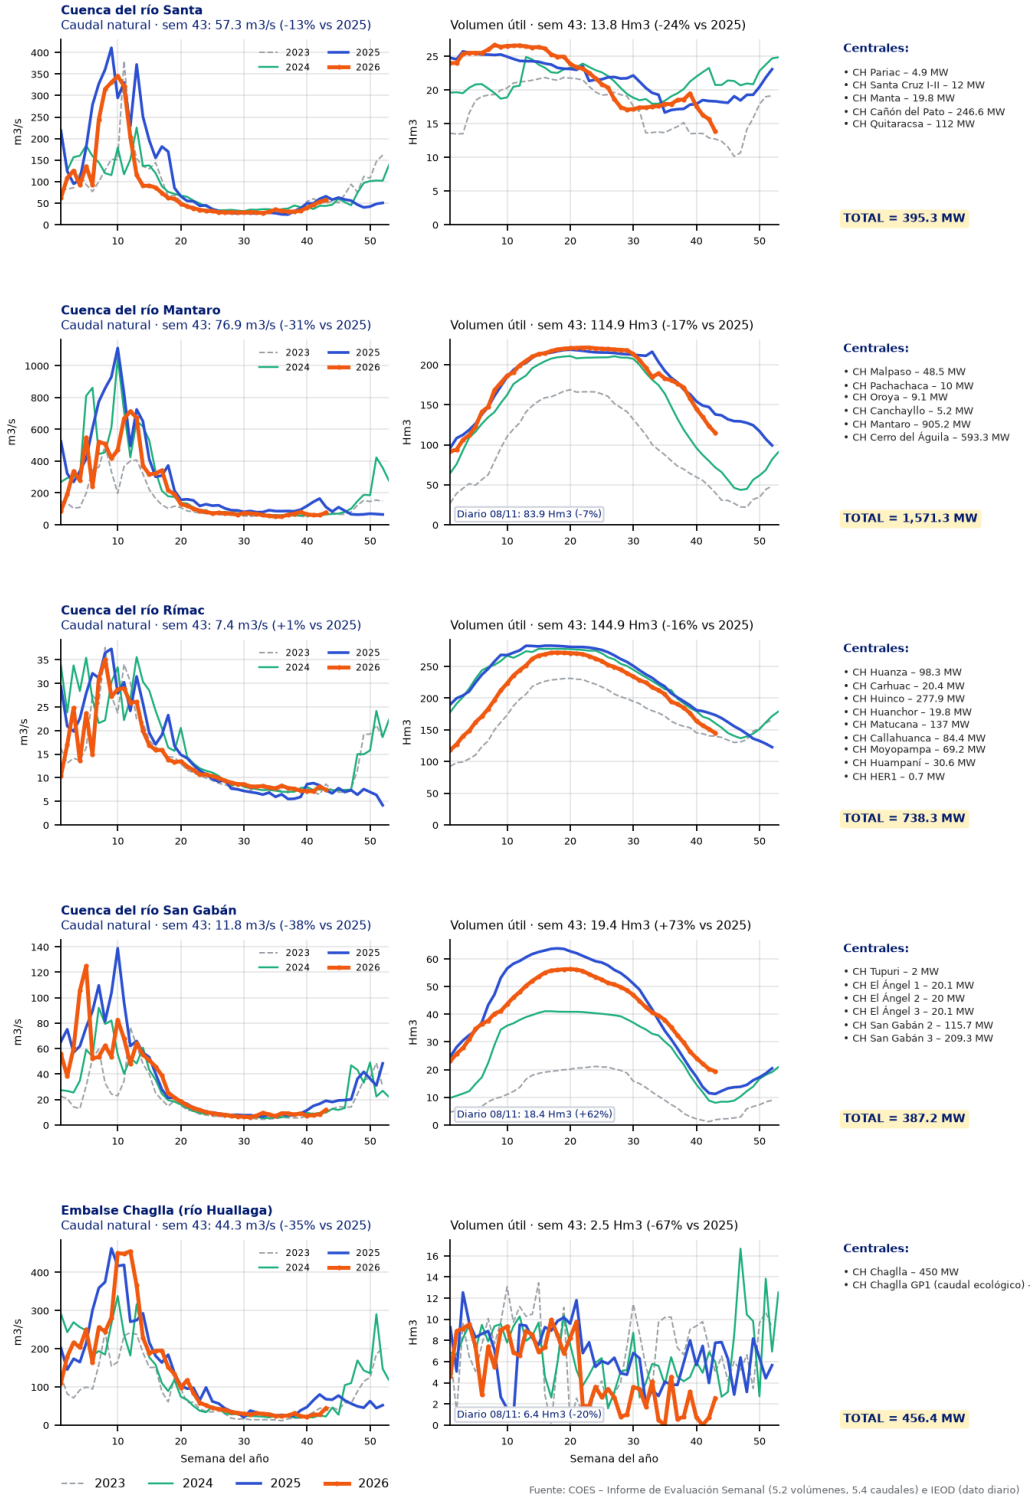


Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

# Programación · lunes 9 de noviembre de 2026

## Generación · intervenciones con MW indisponibles (11 sin MW no se muestran)

| Empresa | Central | Unidad | Horario | MW | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A. | Reserva Fria De Generacion Eten | RF-ETENG T1 | 00:00–24:00 | 217.1 | REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1 |
| Minera Cerro Verde | Recka | CENTRAL | 00:00–24:00 | 175.9 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA |
| Hydro Global Perú S.A.C. | San Gaban III | G1 | 06:00–21:00 | 104.5 | Mantenimiento preventivo de equipos turbina, inspección de sellos de agua y aceite, reemplazo de inyector (Preparativos para la temporada de avenida) |
| Electroperu | Mantaro | G7 | 00:00–24:00 | 101.0 | REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA |
| Chinango S.A.C. | Chimay | G2 | 08:00–16:00 | 75.0 | ALISADO DE ANILLOS ROTORICOS DEL GENERADOR |
| Orygen Peru S.A.A. | Huinco | G1 | 07:00–18:00 | 65.0 | CAMBIO DE POLO DE RESERVA CON POLO 1V |
| Egasa | Charcani V | G3 | 00:00–24:00 | 48.0 | Instalación de repuestos de interruptor de potencia. |
| Egasa | Charcani V | G3 | 07:00–15:00 | 48.0 | Mantenimiento Electromecánico Plan 3 (Primera parte) |
| Engie Energia Peru S.A.A. | Punta Lomitas | CENTRAL | 00:00–24:00 | 23.4 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS |
| Electroperu | Tumbes | MAK2 | 00:00–24:00 | 8.5 | Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026) |
| Egesur | Independencia | INDEP_G3 | 08:00–24:00 | 5.7 | Mantenimiento por 4,000 horas de operación |
| Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada | Central Eolica Duna | CENTRAL | 00:00–24:00 | 2.6 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR |
| Inversiones Shaqsha S.A.C. | Misapuquio | G2 | 08:00–18:00 | 1.9 | Mantenimiento del sistema de protecciones G2 y TR |
| Petramas | Huaycoloro | G1 | 00:00–24:00 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR |
| Petramas | Huaycoloro | G2 | 06:00–24:00 | 1.5 | CALIBRACION DE VALVULAS |
| Petramas | La Gringa V | G2 | 06:00–24:00 | 1.5 | MANTENIMIENTO DE 66000 HRS |
| Petramas | Ctb Callao | G1 CALLAO | 00:00–24:00 | 1.2 | MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS/MANTENIMEINTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1 |
| Petramas | Ctb Callao | G2 CALLAO | 06:00–24:00 | 1.2 | MANTENIMIENTO DE 44250/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1 |

## Líneas de transmisión ≥220 kV

| Línea | kV | Empresa | Tramo | Horario | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-5006 | 500 | Transmantaro | Carabayllo - Chimbote1 | 05:00–14:00 | E/S | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES FOGONEADOS, CON ALTA CONTAMINACIÓN EN LAS TORRES T241, T279, T281, T282, T379, T380, T3 |
| L-5033 | 500 | Transmantaro | Poroma - Yarabamba | 00:00–24:00 | E/S | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA. |
| L-2013 | 220 | Luz Del Sur | San Juan - Balnearios | 07:00–17:00 | E/S | Poda con tensión |
| L-2074 | 220 | Minera Cerro Verde | San Luis - Cerro Verde | 08:00–24:00 | F/S | L-2074 F/S POR SEGURIDAD DURANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN ZONA DE HUAYRONDO |
| L-2091 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Desierto | 00:00–24:00 | F/S | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON |
| L-2091 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Desierto | 07:30–17:00 | F/S | BACKLOG: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS DE TORRES T-8, T-201, T-202 Y T-208, REQUIERE L2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS. |
| L-2120 | 220 | Inti Joya S.A.C. | San Jose - America | 00:00–24:00 | E/S | Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas |
| L-2130 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Huancavelica - Chiribamba | 00:00–24:00 | E/S | RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS |
| L-2211 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Ica - Derivacion | 00:00–24:00 | E/S | SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE |

| Línea | kV | Empresa | Tramo | Horario | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-2211 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Ica - Derivacion | 07:00–17:00 | E/S | A SOLICITUD DE ENGIE POR LAVADO 6M EN CALIENTE ESTRUCTURA T748-A L-2211 SE DERIVACION |
| L-2232 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chimu - Chimbote 1 | 00:00–24:00 | F/S | POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE |
| L-2232 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chimu - Chimbote 1 | 08:00–16:00 | F/S | LIMPIAR AISLADORES CONTAMINADOS EN EL POSTE P115, CAMBIAR AISLADOR PIN DOBLADO EN POSTE P163, LIMPIAR AISLADORES CON ALT |
| L-2254 | 220 | Isa Peru | Vizcarra - Paragsha 2 | 08:00–17:00 | F/S | POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679) |
| L-2260 | 220 | Conelsur Lt Sac | Trujillo Norte - Cajamarca Norte | 00:00–24:00 | F/S | CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERÍA, SPAT Y PINTADOT47 A T82 |
| L-2280 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Alipio Rosales - Machala | 00:00–24:00 | E/S | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. |
| L-2303 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San José - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea. |
| L-2304 | 220 | Energia Renovable La Joya S.A. | San José - Jade | 00:00–24:00 | E/S | Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea. |
| L-2305 | 220 | Red De Energia Del Peru S.A. | Chilca - Independencia | 00:00–24:00 | E/S | BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL |
| L-2314 | 220 | Engie Energia Peru S.A.A. | Derivacion - Punta Lomitas | 07:00–17:00 | F/S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2314 SE PUNTA LOMITAS |
