Resumen · 10 de noviembre 2026

El 10 de noviembre, Santa Rosa promedió 55.11 USD/MWh, 32.9% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -13% frente al mismo período de 2025. Para el 11 de noviembre se programan hasta 292 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 10:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 11 de noviembre
55.11 USD/MWh	**8,752 MW**	**179 MW**	**292 MW**
Santa Rosa 220 · -32.9% diario	pico a las 15:30 h · +987 MW vs 2025 · mes +11.2% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 112 / forz. 29 MW prom.	San Gaban Iii G2 · 104 MW · 06:00–21:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 55.11 USD/MWh: -32.9% frente a ayer y 9% sobre el promedio del mes (50.76).
- **Demanda.** Energía del mes 1,835 GWh, +11.2% frente a los mismos 10 días de 2025; máxima del 10 de noviembre 8,752 MW, +987 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,752 MW (+987 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -13% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: San Gaban III (-18.5 GWh), Chimay (-13.0 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 418 MW, -28% frente a 2025; el 10 de noviembre promedió 454 MW.
- **Operación.** Falla en líneas ≥220 kV: L-2051 (Campo Armiño – Cotaruse); sin desacople relevante de precios.

Qué vigilar · 11 de noviembre

1. San Gaban III G2 fuera de servicio (104 MW): mantenimiento preventivo de equipos turbina, inspección de sellos de… (06:00–21:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. Desde el 16 de noviembre: Chaglla G1 235 MW en mantenimiento


Huanchor

- Huanchor generó **367.4 MWh** (-15% vs mismo día 2025); en el mes 3,602 MWh (-16.8%).
- Precio capturado del día 54.72 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 19,607 USD, cobertura 98% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 49.95 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 98% de la energía; cobertura 98%). Promedio de la misma referencia: 50.44.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 7.3 m3/s (+9%), volumen 135 Hm3 (-20%) vs año anterior.


Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 10/11	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	55.11	82.18	-32.9%	50.76
Socabaya 220	58.30	87.36	-33.3%	53.93
Piura 220	59.65	88.73	-32.8%	55.43

Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 10/11	Promedio mes
Punta (18-23 h)	60.13	61.84
Media (6-18 h)	53.10	45.76
Base (23-6 h)	54.95	51.42

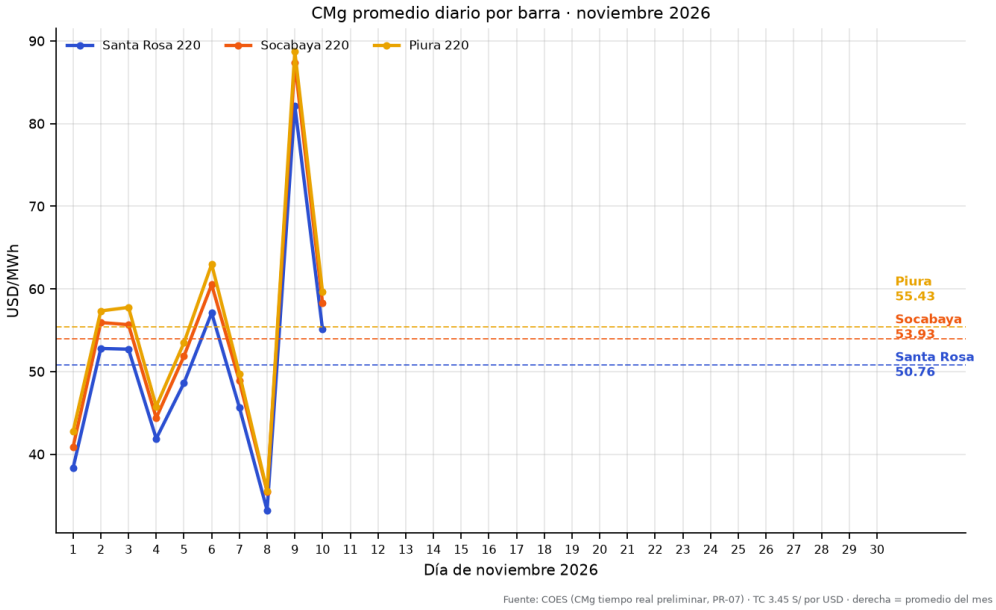

CMg promedio diario por barra · noviembre 2026
Santa Rosa 220
Socabaya 220
Piura 220
USD/MWh
90
80
70
60
50
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Día de noviembre 2026
Piura
55.43
Socabaya
53.93
Santa Rosa
50.76
Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes


Precios: detalle

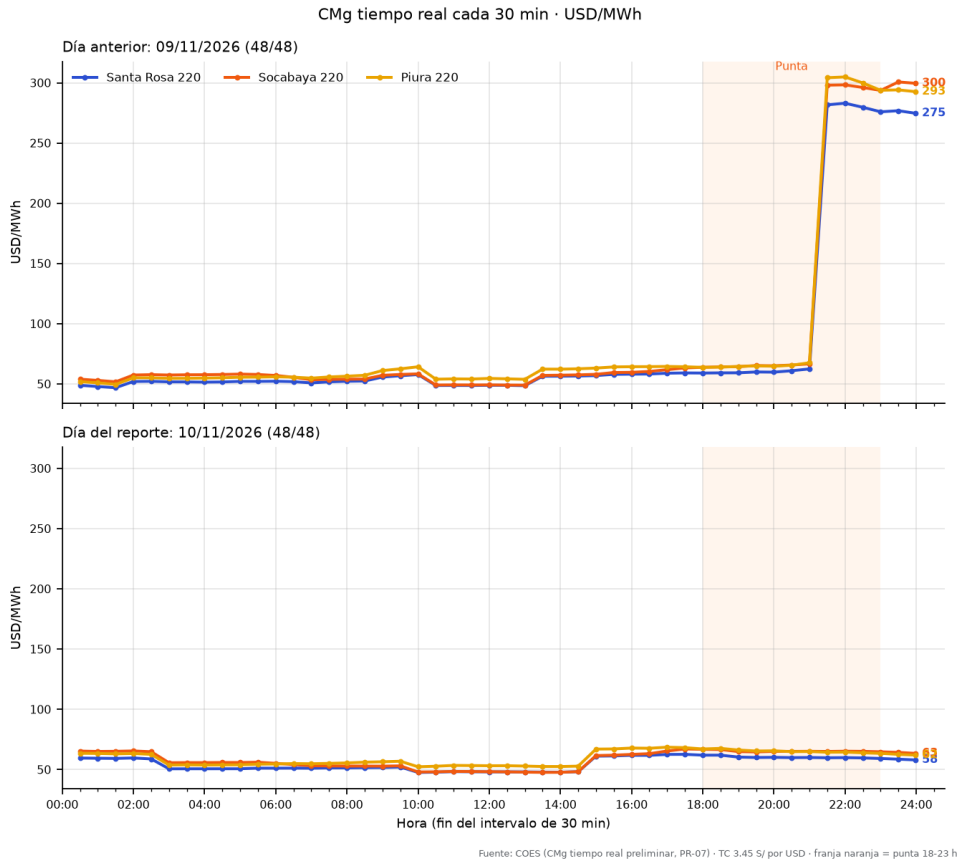

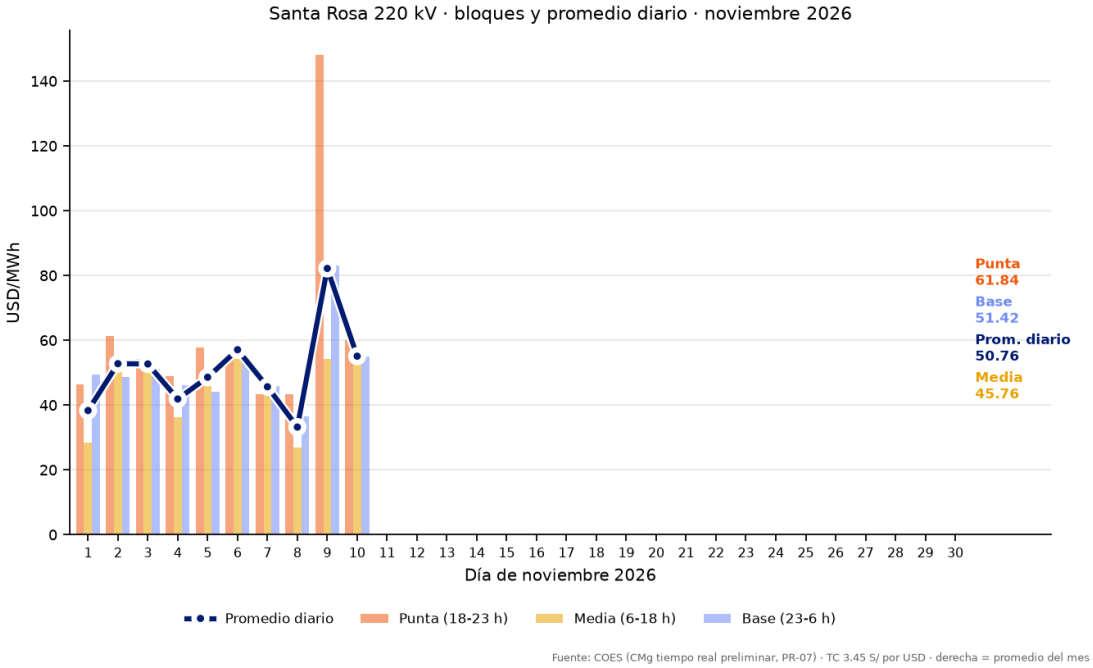

Oferta y demanda

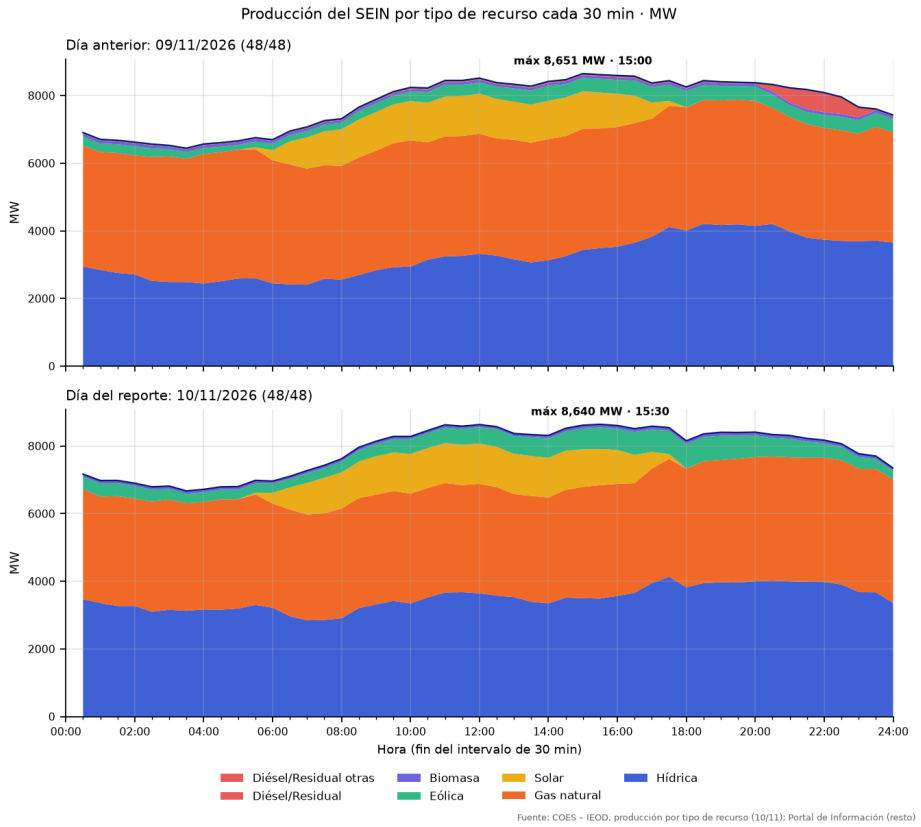


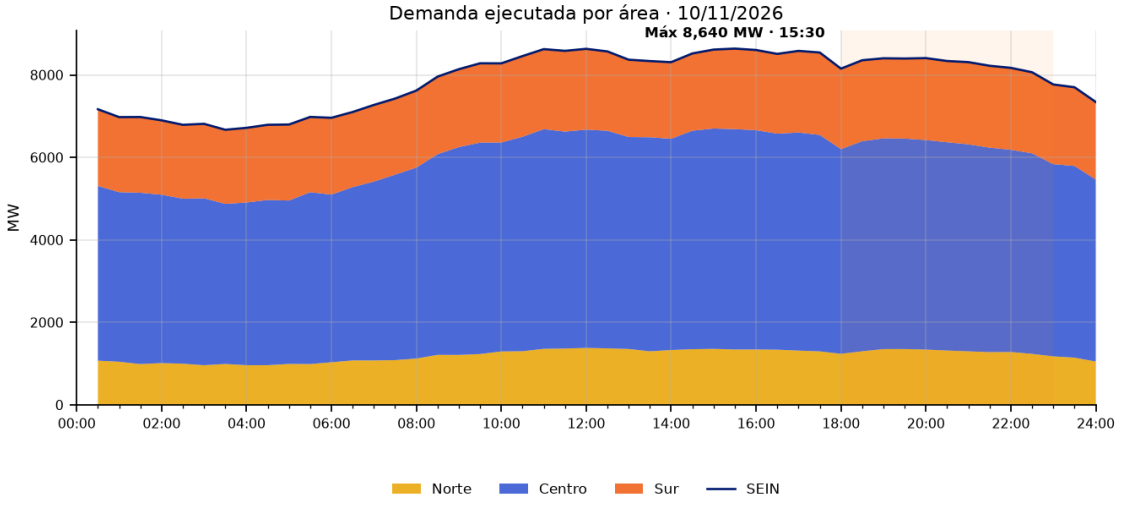


Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 10/11/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
San Nicolas TV1	Shougesa	–	Residual (R500)	04:31–00:00	–	–	A minima carga
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	43.5	1,024	Por cogeneracion
Refineria Talara TV2	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	12.1	286	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

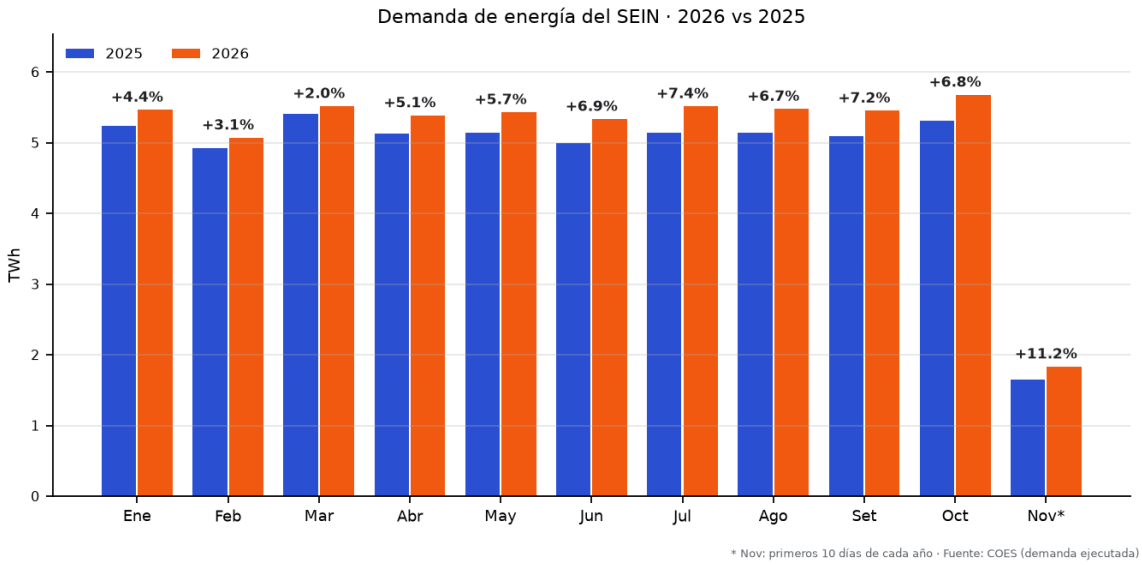


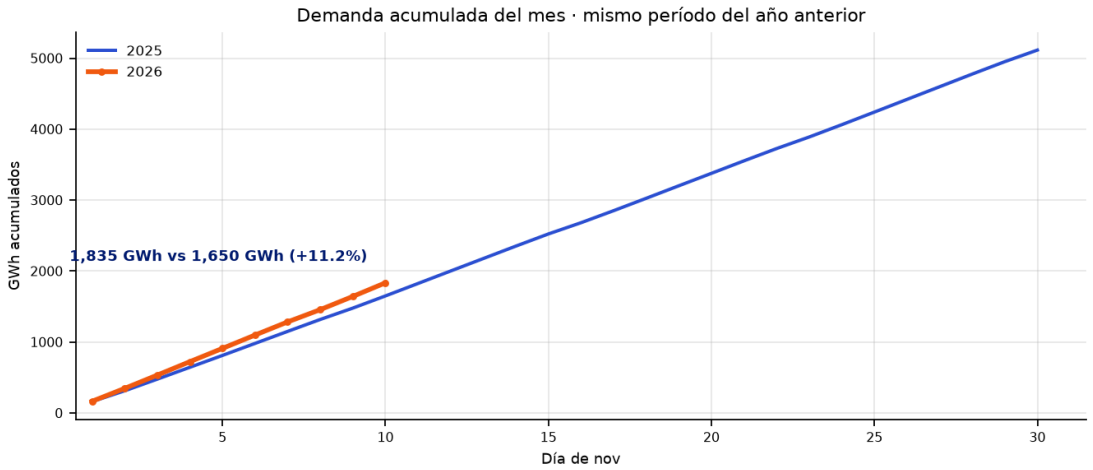


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

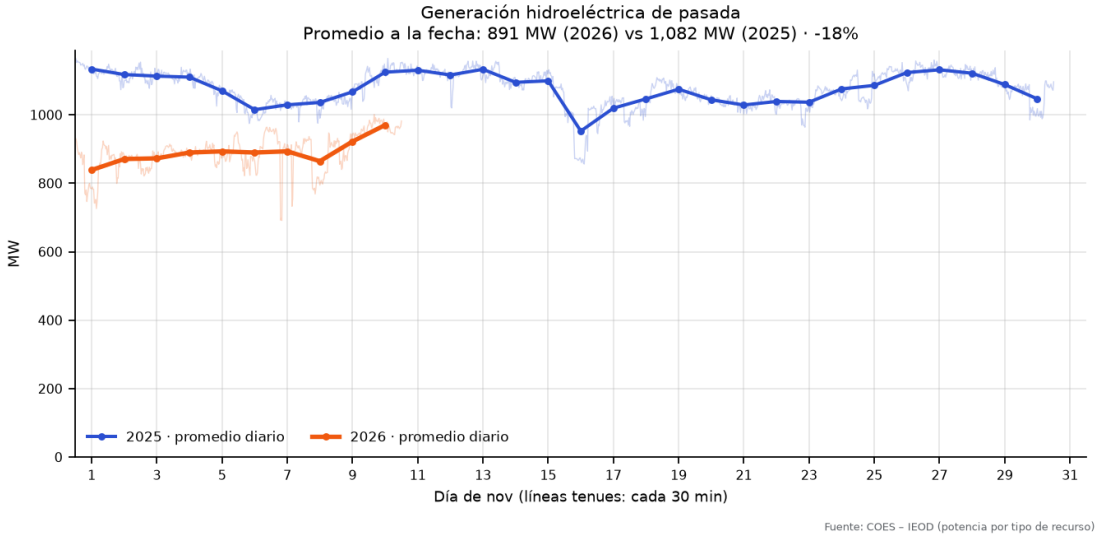

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

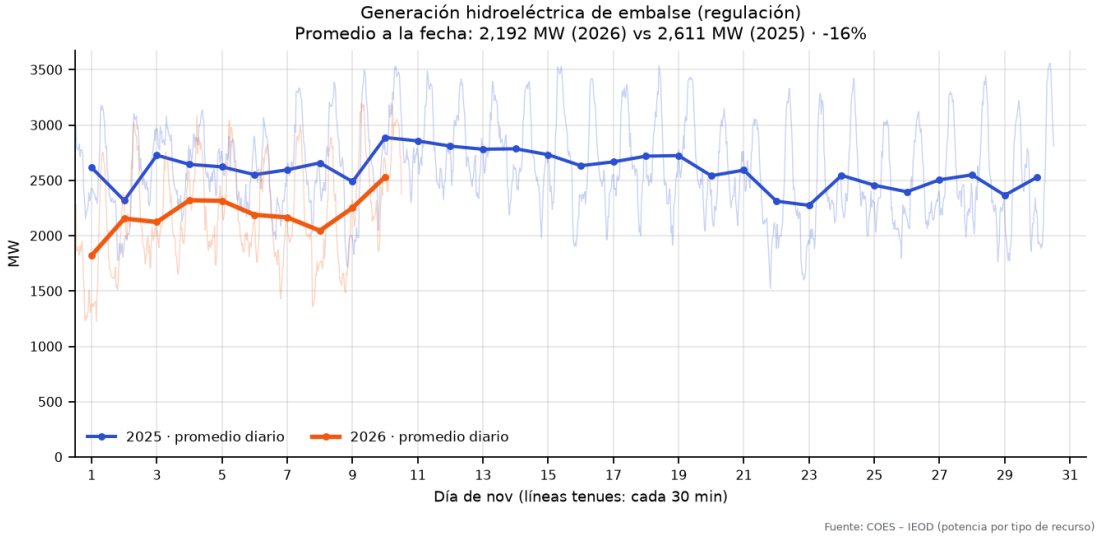

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

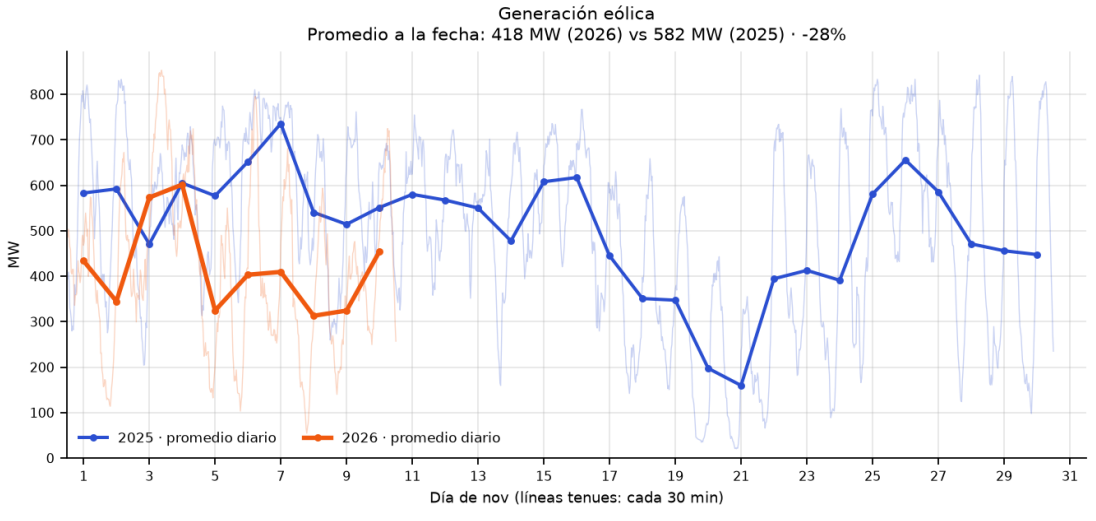

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–10 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	24.77	43.29	-18.52	-43%
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	19.34	32.36	-13.01	-40%
El Platanal	Celepsa	Regulación	15.96	28.85	-12.89	-45%
Mantaro	Electroperu	Regulación	138.89	148.38	-9.49	-6%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	28.60	35.77	-7.17	-20%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	18.43	25.48	-7.04	-28%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	19.04	25.59	-6.55	-26%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	16.53	23.07	-6.54	-28%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	14.90	19.21	-4.31	-22%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	14.73	18.85	-4.12	-22%
La Virgen	La Virgen	Regulación	8.24	12.33	-4.10	-33%
Restitución	Electroperu	Pasada	46.75	50.74	-3.99	-8%
Manta I	Celaris Energy S.A.	Pasada	1.36	4.27	-2.90	-68%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	1.68	4.51	-2.84	-63%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	2.00	4.78	-2.77	-58%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	1.81	4.58	-2.77	-60%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	2.75	-2.75	-100%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	1.79	4.51	-2.73	-60%
Matucana	Orygen Peru S.A.A.	Regulación	17.16	19.23	-2.08	-11%
Cahua	Statkraft S.A	Pasada	8.26	10.18	-1.92	-19%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	1.91	3.67	-1.76	-48%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	4.65	6.41	-1.76	-27%
Rucuy	Sinersa	Pasada	2.44	3.79	-1.35	-36%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	1.35	2.61	-1.26	-48%
Malpaso	Statkraft S.A	Regulación	5.10	6.35	-1.25	-20%

Total hidro: 660.7 GWh vs. 763.8 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 10/11/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
179 MW	**141 MW**	**112** / **29** MW	**398 MW**
a las 14:00 h	3,391 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (187 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 156 MW · Eólica 14 MW · Gas natural 11 MW · Biomasa 5 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G2	Hídrica	08:46–14:32	**48.0**	Forzado	Corrección del parámetro "Carrera de contacto" en el interruptor de potencia
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**9.4**	Forzado	TH-04, TH-05 y TH-11 - TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	00:00–24:00	**5.7**	Prog.	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Egesur	Independencia	INDEP_G4	Gas natural	17:58–19:09	**5.7**	Forzado	Mantenimiento Correctivo por baja temperatura de gases de escape en el cilindro B4 de la unidad de generación
Parque Eolico Marcona S.A.C.	Parque Eolico Marcona	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**2.3**	Forzado	M-04 fuera de servicio por alarma GrdInv: 241 Delta 1 DIB +15v.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–16:00	**2.3**	Forzado	TH-23 - Alarma IO module 1 powerdown detected. Se hizo reemplazo de main computer y actualización de software
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	La Gringa V	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 66000 HRS
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	Biomasa	00:00–24:00	**1.2**	Prog.	MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS/MANTENIMEINTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1
Petramas	Ctb Callao	G2 CALLAO	Biomasa	00:00–24:00	**1.2**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 44250/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1
Atria Energia S.A.C.	Purmacana	CENTRAL	Hídrica	11:00–18:20	**0.6**	Forzado	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA, INTERRUPTOR DE LÍNEA E INTERRUPTOR DE GRUPO
Inversiones Shaqsha S.A.C.	San Ignacio	G1	Hídrica	14:00–19:00	**0.4**	Prog.	Mantenimiento del sistema de protecciones G1 y TR1
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control G2
Egemsa	Machupicchu	G3	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G3
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL (MENOR) U2
Kallpa Generacion S.A.	Kallpa	TG1	Gas natural	00:00–14:09	**0.0**	Forzado	Unidad indisponible por falla.
Kallpa Generacion S.A.	Kallpa	TG2	Gas natural	00:00–24:00	**0.0**	Forzado	Unidad indisponible por falla.
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Vari Energia S.A.C.	Anashironi	G1	Hídrica	00:00–03:19	**0.0**	Forzado	Revisión de sistema HPU. El día 08/11/2026 se intento sincronizar el G1 de la C.H. Anashironi y al abrirse la Válvula Ma
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5006	500	Transmantaro	Carabayllo - Chimbote 1	07:42–11:42	E/S	LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES FOGONEADOS, CON ALTA CONTAMINACION EN LAS TORRES T241, T279, T281, T282, T379, T380, T3
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2013	220	Luz Del Sur	San Juan - Balnearios	07:00–17:00	E/S	Poda con tension
L-2061	220	Minera Cerro Verde	Socabaya - Cerro Verde	10:05–17:18	F/S	LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062
L-2062	220	Minera Cerro Verde	Socabaya - Cerro Verde	10:07–17:19	F/S	LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062
L-2074	220	Minera Cerro Verde	San Luis - Cerro Verde	00:00–09:50	F/S	L-2074 F/S POR SEGURIDAD DURANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN ZONA DE HUAYRONDO
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	07:00–17:00	E/S	A SOLICITUD DE ENGIE POR LAVADO 6M EN CALIENTE ESTRUCTURA T748-A L-2211 SE DERIVACION
L-2232	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chimu - Chimbote 1	07:34–18:25	F/S	POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	F/S	CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERIA, SPAT Y PINTADOT47 A T82
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2313	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2313 (E144 A E001)
L-2314	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2314 (E144 A E001)

Eventos relevantes del día

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Aruntani S.A.C.	L-6007 · Puno - Tucari	13:30–15:31	60		DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6007 (PUNO - TUCARI) DE 60 kV
Falla	Conelsur Lt Sac	L-1047 · Ares - Talta	16:29–16:29	138		RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1047 (TALTA - ARES) DE 138 kV
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	00:00–02:43			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	08:50–24:00			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Falla	Conenhua	L-1048 · Talta - Tambomayo	16:06–16:19	138	6.7	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1048 (TALTA - TAMBOMAYO) DE 138 kV
Falla	Egasa	L-3104 · Charcani IV - Chilina	05:23–05:43	33		DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-3104 (CHILINA - CHARCANI IV) DE 33 KV

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Electro Dunas	L-6630/2 · Nazca - Puquio	13:47–13:47	60	6.6	RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-6630-2 (NAZCA - PUQUIO) DE 60 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	10:09–22:02			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Electro Puno	L-6024 · Azángaro - Putina	13:12–13:15	60	16.4	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6024 (AZÁNGARO - PUTINA) DE 60 kV
Evento	Red De Energia Del Peru S.A.	T47-131 · Quencoro	16:01–22:05			RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO
Falla	Red De Energia Del Peru S.A.	SVC-1 · Trujillo Norte	23:55–11/11 01:36			DESCONEXIÓN DEL SVC DE LA S.E. TRUJILLO NORTE 220 KV
Falla	Transmantaro	L-2051 · Mantaro - Cotaruse	14:11–14:11	220		RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-2051 (CAMPO ARMIÑO - COTARUSE) DE 220 KV
Falla	Transmantaro	AT91-523 · La Niña	23:54–12/11 00:00			DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR AT91-523 DE 500/220 KV DE LA S.E. LA NIÑA


Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 03/11, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas 1	TG6	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por correo el 01.10.2026 la CT Malacas TG6 presenta una limitación de 40 MW por te
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 44 · 31/10 al 06/11/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 44	52.8 -9%	13.4	18.2	-26%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 44	55.6 -33%	116.4	136.8	-15%	79.1 (10/11) -11%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 44	7.3 +9%	135.1	168.5	-20%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 44	11.0 -39%	18.5	12.3	+51%	18.4 (10/11) +43%	387.2 MW
Chaglla	sem. 44	30.4 -54%	6.0	7.8	-23%	4.1 (10/11) -46%	456.4 MW

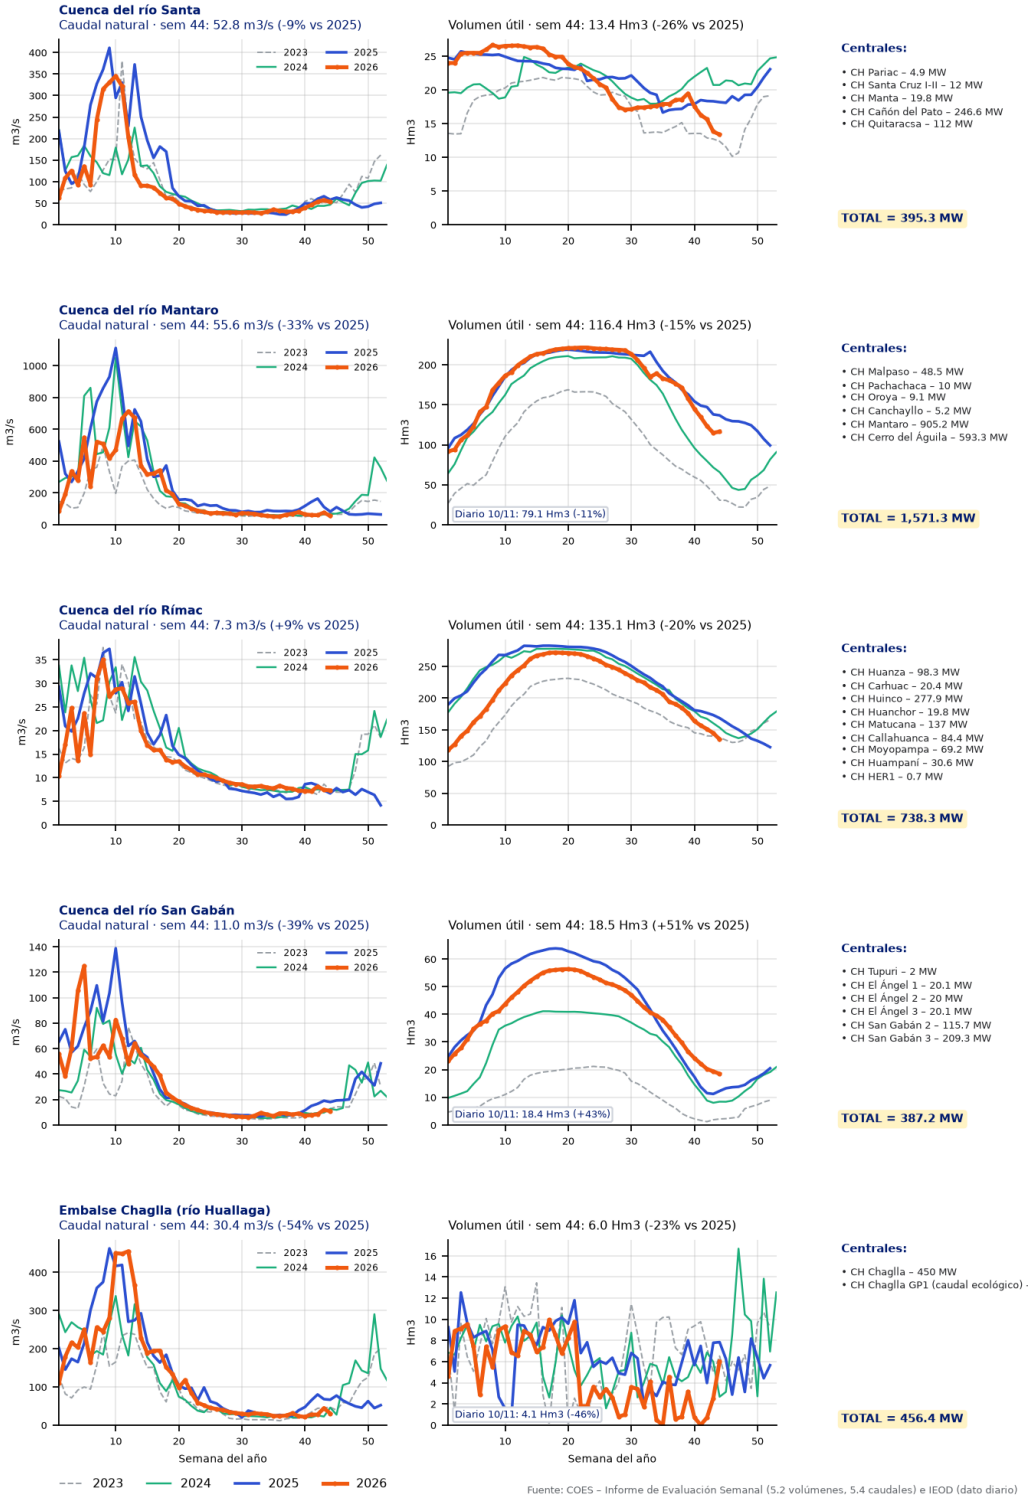

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · miércoles 11 de noviembre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (12 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	217.1	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Hydro Global Perú S.A.C.	San Gaban III	G2	06:00–21:00	104.5	Mantenimiento preventivo de equipos turbina, inspección de sellos de agua y aceite, reemplazo de inyector (Preparativos para la temporada de avenida)
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G1	07:00–15:00	48.5	Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT+ Bahia acoplamiento
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	23.4	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Egesur	Independencia	INDEP_G3	00:00–24:00	5.7	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	La Gringa V	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 66000 HRS
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	00:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1
Petramas	Ctb Callao	G2 CALLAO	00:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 44250/MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1
Inversiones Shaqsha S.A.C.	San Antonio	G1	10:00–19:00	0.6	Mantenimiento del sistema de protecciones G1 y TR1
Inversiones Shaqsha S.A.C.	San Ignacio	G1	07:00–09:00	0.4	Mantenimiento del sistema de protecciones G1 y TR1

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5006	500	Transmantaro	Carabayllo - Chimbote 1	05:00–14:00	E/S	LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES FOGONEADOS, CON ALTA CONTAMINACIÓN EN LAS TORRES T241, T279, T281, T282, T379, T380, T3
L-5021	500	Transmantaro	Colcabamba - Campas	08:00–17:00	F/S	REPARACIÓN DE HEBRAS ROTAS EN CABLE DE FIBRA ÓPTICA OPGW EN LA TORRE T65. (R0140272)
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2061	220	Minera Cerro Verde	Socabaya - Cerro Verde	08:30–17:00	F/S	LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062
L-2062	220	Minera Cerro Verde	Socabaya - Cerro Verde	08:30–17:00	F/S	LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062
L-2076	220	Minera Cerro Verde	San Luis - San Carlos	08:00–17:00	F/S	DESCONEXION DE LINEA POR SEGURIDADDURANTE TRABAJOS EN NUEVA LT-2075/2076 (Trabajos preliminares - No se va a energizar n
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199 Y CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS T200-T209. REQUIERE L-2305 CON RECIERRES
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–08:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	08:00–18:00	F/S	Se realizará la comprobación y verificación funcional de la trampa de onda instalada en la Línea de Transmisión 220 kV L
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	18:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2232	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chimu - Chimbote 1	07:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE
L-2232	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chimu - Chimbote 1	08:00–16:00	F/S	LIMPIAR AISLADORES CONTAMINADOS EN EL POSTE P115, CAMBIAR AISLADOR PIN DOBLADO EN POSTE P163, LIMPIAR AISLADORES CON ALT
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679).
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	F/S	CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERÍA, SPAT Y PINTADOT47 A T82
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2313	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2313 (E144 A E001)
L-2314	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	06:00–15:00	E/S	LAVADO 1A EN CALIENTE DE AISLADORES L-2314 (E144 A E001)
