Resumen · 2 de noviembre 2026

El 2 de noviembre, Santa Rosa promedió 52.80 USD/MWh, 37.7% más que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025. Para el 3 de noviembre se programan hasta 370 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 3 de noviembre
52.80 USD/MWh	**8,426 MW**	**330 MW**	**370 MW**
Santa Rosa 220 · +37.7% diario	pico a las 11:30 h · +1,246 MW vs 2025 · mes +10.9% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 275 / forz. 12 MW prom.	Santa Rosa TG7 · 120 MW · 00:00–20:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 52.80 USD/MWh: +37.7% frente a ayer y 16% sobre el promedio del mes (45.56).
- **Demanda.** Energía del mes 347 GWh, +10.9% frente a los mismos 2 días de 2025; máxima del 2 de noviembre 8,426 MW, +1,246 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,426 MW (+980 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: Chimay (-4.1 GWh), San Gaban III (-4.0 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 389 MW, -34% frente a 2025; el 2 de noviembre promedió 345 MW.
- **Operación.** Hasta 330 MW fuera de servicio a la vez (08:00 h), de los cuales 12 MW forzados.

Qué vigilar · 3 de noviembre

1. Santa Rosa TG7 fuera de servicio (120 MW): 1. reparación de daño estructural a la chimenea de tg7. 2. inspección… (00:00–20:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. Desde el 7 de noviembre: Santa Rosa II TG8 190 MW en mantenimiento


Huanchor

- Huanchor generó **353.4 MWh** (-18% vs mismo día 2025); en el mes 707 MWh (-18.5%).
- Precio capturado del día 52.23 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 18,078 USD, cobertura 98% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 45.10 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 98% de la energía; cobertura 98%). Promedio de la misma referencia: 45.27.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 7.4 m3/s (+1%), volumen 145 Hm3 (-16%) vs año anterior.

Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 02/11	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	52.80	38.33	+37.7%	45.56
Socabaya 220	55.93	40.87	+36.9%	48.40
Piura 220	57.34	42.74	+34.2%	50.20


Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 02/11	Promedio mes
Punta (18-23 h)	61.28	53.80
Media (6-18 h)	51.73	40.13
Base (23-6 h)	48.57	49.00

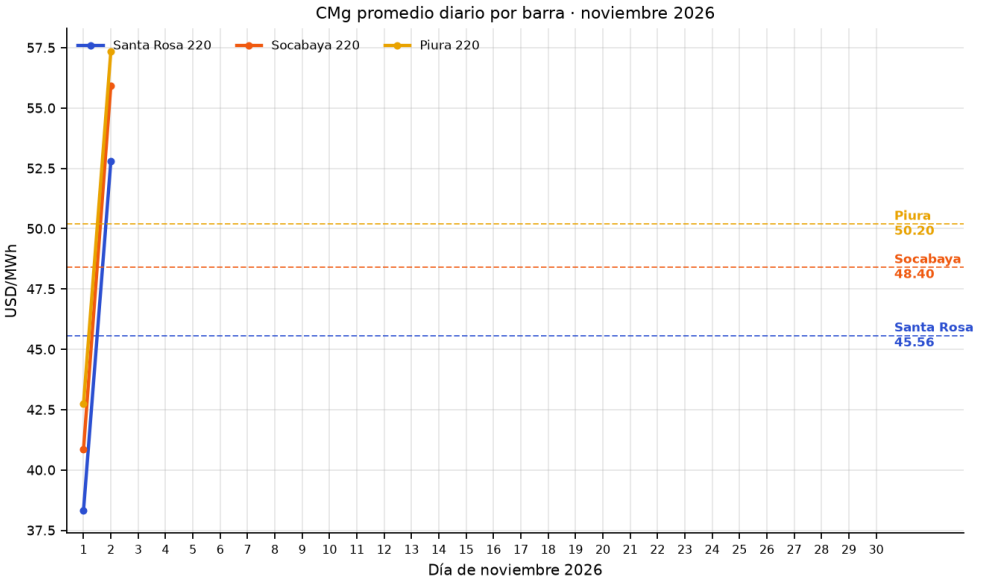


Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes


Precios: detalle

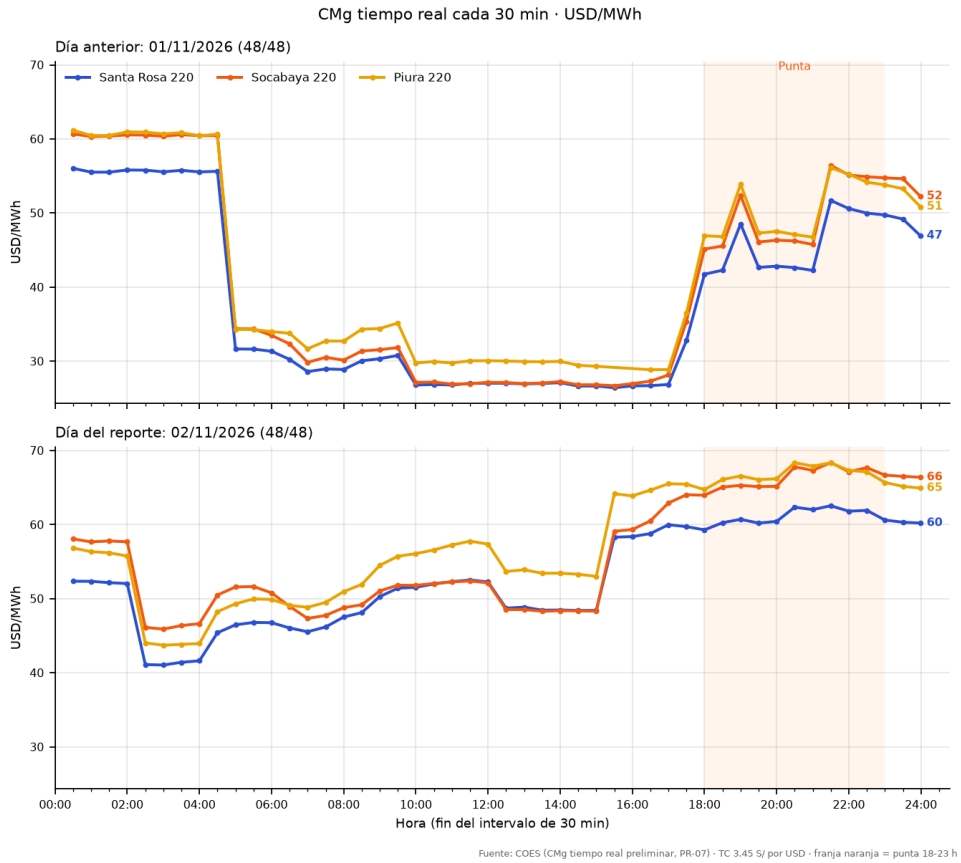

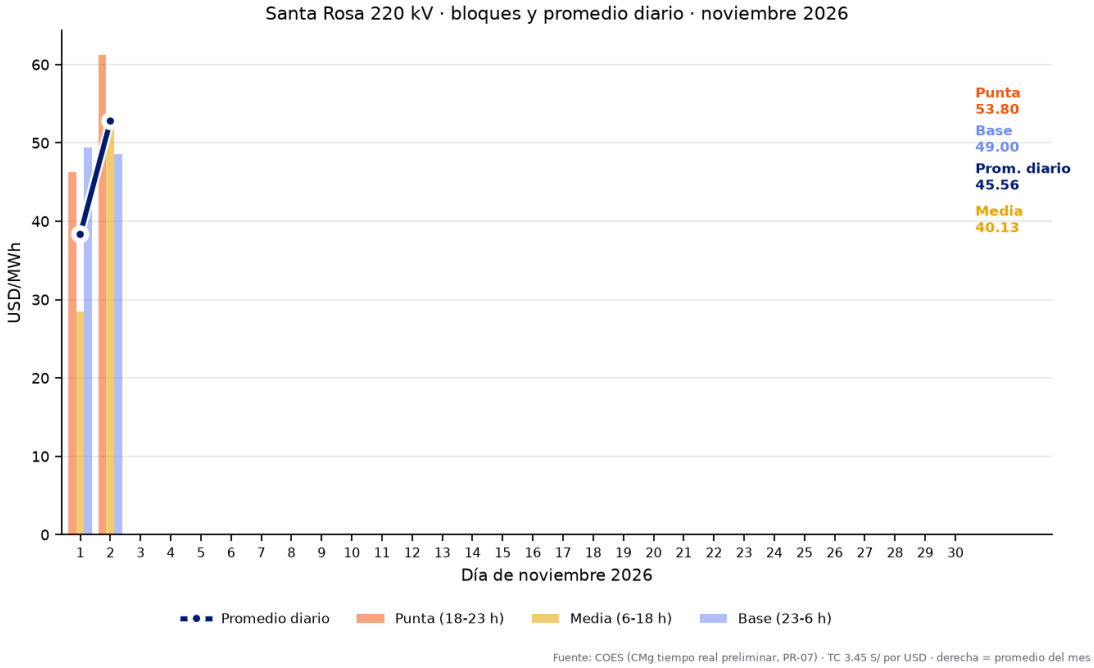



Oferta y demanda

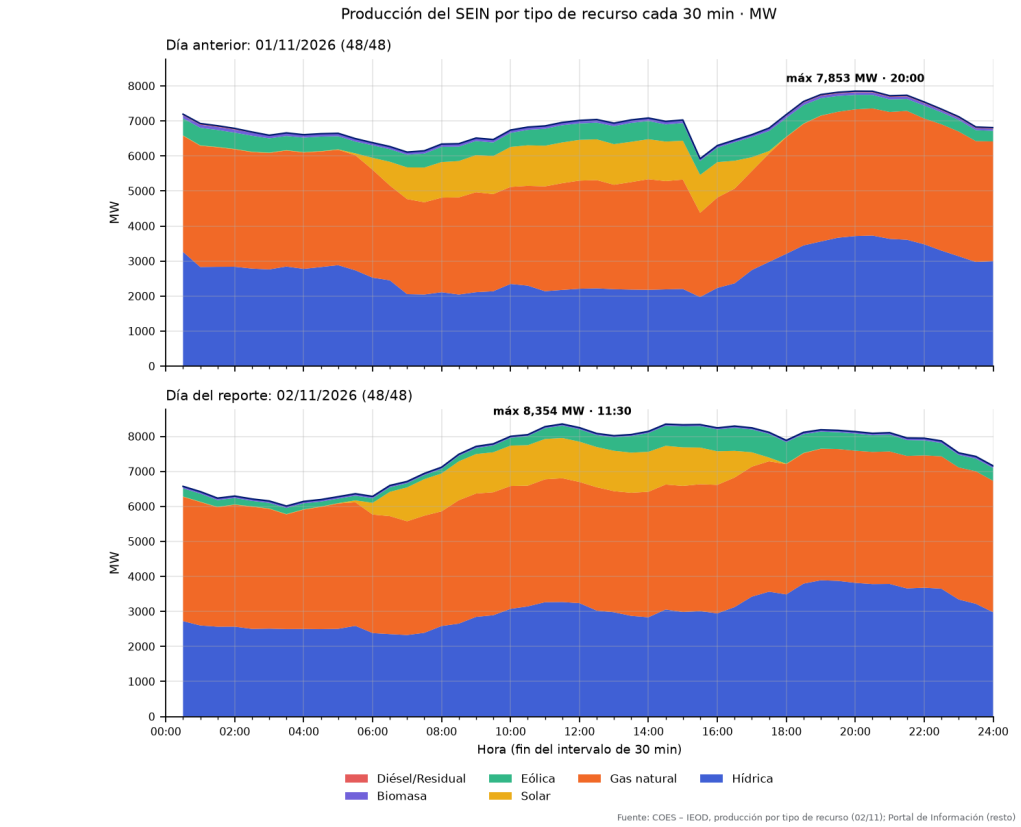

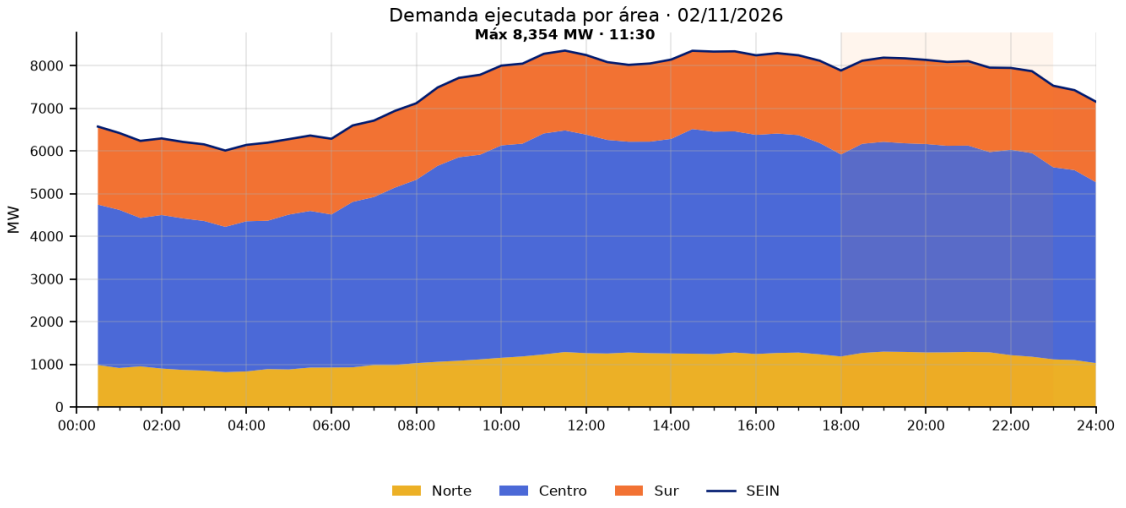


Demanda vs. año anterior

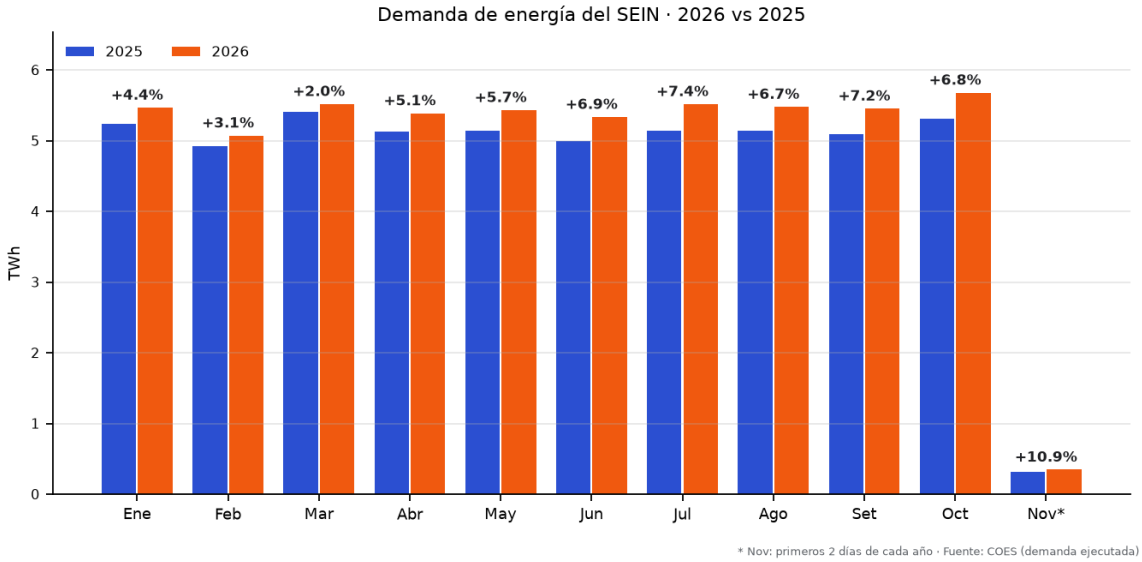


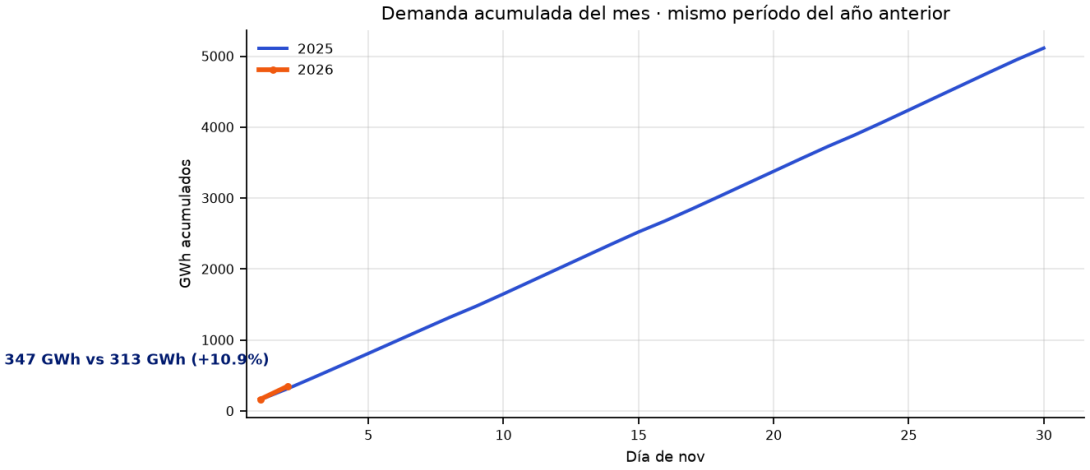


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

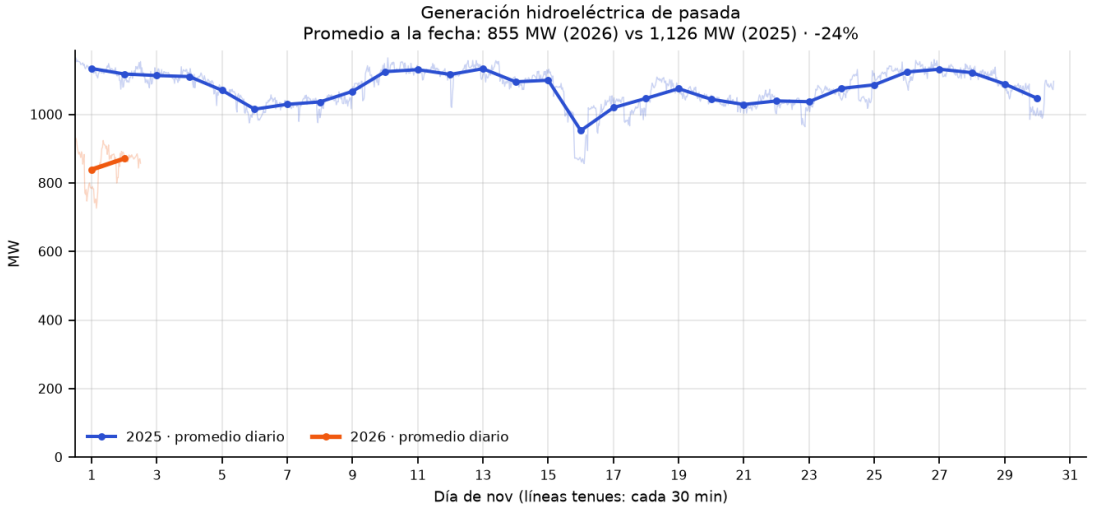

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

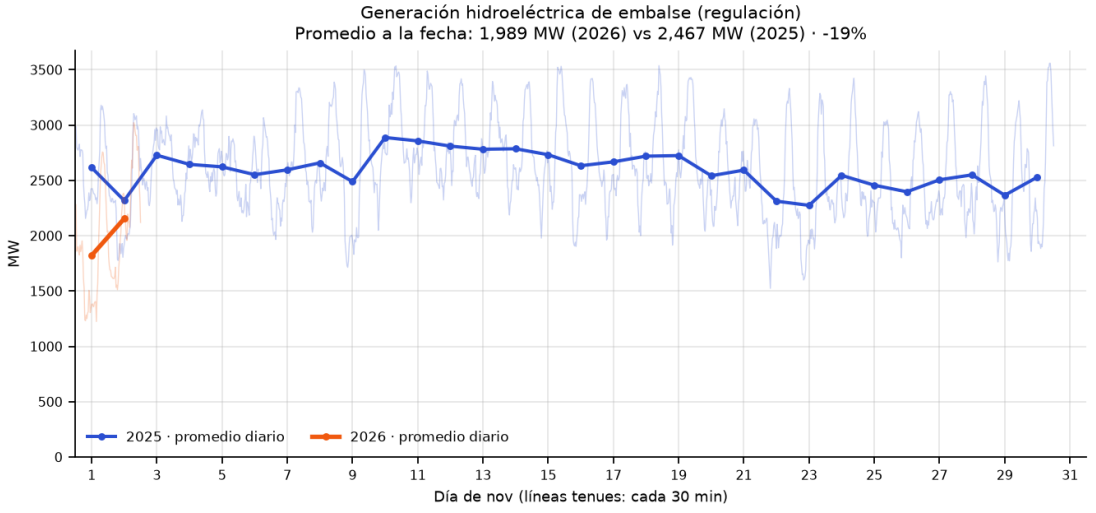

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

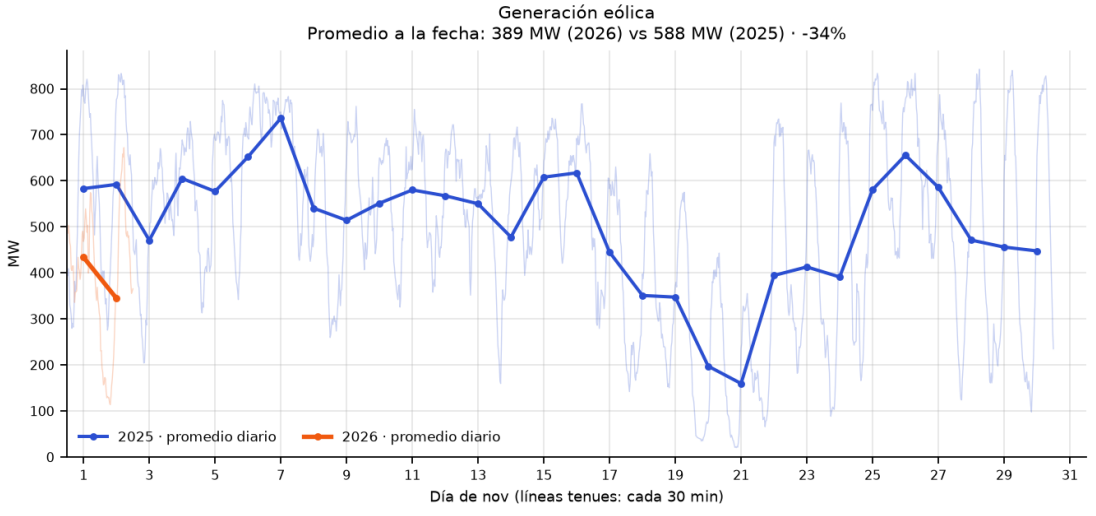

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–2 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	3.18	7.25	-4.08	-56%
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	5.78	9.74	-3.96	-41%
El Platanal	Celepsa	Regulación	2.86	5.73	-2.87	-50%
Mantaro	Electroperu	Regulación	27.07	29.29	-2.22	-8%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	5.78	7.94	-2.15	-27%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	2.59	4.69	-2.10	-45%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	3.09	4.92	-1.83	-37%
La Virgen	La Virgen	Regulación	1.26	2.70	-1.44	-53%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	3.89	5.31	-1.42	-27%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	3.04	4.33	-1.29	-30%
Restitución	Electroperu	Pasada	9.06	9.98	-0.92	-9%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	0.24	0.96	-0.72	-75%
Manta I	Celaris Energy S.A.	Pasada	0.18	0.88	-0.70	-79%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	0.59	-0.59	-100%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	0.75	1.35	-0.59	-44%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	2.60	3.17	-0.57	-18%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	0.43	0.99	-0.57	-57%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.43	0.98	-0.55	-56%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.48	0.98	-0.50	-51%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.48	0.96	-0.48	-50%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	0.31	0.76	-0.45	-60%
Carhuaquero	Orazul Energy Perú	Regulación	3.88	4.31	-0.43	-10%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	0.21	0.54	-0.33	-61%
Huasahuasi I	Egejunin	Pasada	0.22	0.54	-0.33	-60%
Huampani	Orygen Peru S.A.A.	Pasada	1.09	1.41	-0.32	-22%

Total hidro: 126.6 GWh vs. 147.9 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 02/11/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
330 MW	**284 MW**	**275** / **12** MW	**402 MW**
a las 08:00 h	6,822 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (339 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 190 MW · Gas natural 120 MW · Biomasa 20 MW · Eólica 9 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	TG7	Gas natural	00:00–24:00	**120.0**	Prog.	1. Reparación de daño estructural a la chimenea de TG7. 2. Inspección Boroscópica de Turbina TG7.
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G2	Hídrica	07:18–14:15	**48.0**	Prog.	Mantenimiento Electromecánico Plan 1
Statkraft S.A	Yaupi	G4	Hídrica	00:00–15:45	**21.0**	Prog.	MANTENIMIENTO UH G4
Agro Industrial Paramonga S.A.	Paramonga	CENTRAL	Biomasa	00:00–24:00	**14.0**	Prog.	Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, e
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-11 y TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	Hídrica	06:27–24:00	**6.0**	Prog.	F/S POR INSPECCION EN RODETE
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	10:53–17:55	**5.9**	Prog.	A3.2 Rot Alu grease Flow failure - Pit Alu Race grease Flow failure.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	09:13–15:30	**3.1**	Prog.	TH-31 Mantenimiento 11vo Anual
San Gaban	Pch Tupuri	CENTRAL	Hídrica	08:05–24:00	**2.1**	Prog.	Mantenimiento del Transformador Principal del Patio de Llaves
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	La Gringa V	G1	Biomasa	06:11–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 67000 HRS
Petramas	Doña Catalina	G1	Biomasa	06:09–18:09	**1.2**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 51000 HRS
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio del sistema de control SCADA de la I Fase de la Central
Enel Generacion Piura S.A.	Malacas 1	TG6	Gas natural	00:00–24:00	**0.0**	Forzado	BLOQUEO DE ROTOR POR DISPARO DE UNIDAD TG6 (POR PERTURBACION DE SEIN, SALIDA DE L-5008)
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	217.1	Prog.	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2037	220	Atn S.A.	Rubi - Montalvo	07:24–15:55	E/S	Medida de la Resistencia de Puesta a tierra.
L-2076	220	Minera Cerro Verde	San Luis - San Carlos	12:17–18:28	F/S	Por motivos de seguridad del personal
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL

Eventos relevantes del día

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Agrolmos Sociedad Anonima - Agrolmos S.A.	CENTRAL · Agrolmos	10:29–10:56			DESCONEXIÓN DE LA C.T. AGROLMOS
Falla	Celaris Energy S.A.	G2 · Manta I	18:53–03/11 20:05	6		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MANTA
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	14:47–24:00			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	09:28–21:50			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Electro Puno	L-6027 · Puno - Pomata - Ilave	20:36–20:38	60	6.1	DESCONEXION DE LA LINEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) EN 60 KV
Falla	Electronoroeste S.A.	L-6662 · Sullana - Valle Del Chira	03:08–04:28	60	10.0	DESCONXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6698 (PIURA OESTE - SULLANA) Y L-6662 (VALLE DEL CHIRA - SULLANA) DE 60 KV
Falla	Lineas Andinas Secundarias S.A.C.	L-6527 · Mahr Túnel - Andaychagua	18:04–18:15		7.0	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6527 (MAHR TUNEL - ANDAYCHAGUA) DE 60 KV

Restricciones operativas vigentes


Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Atlantica Transmision Sur S.A.	S.E. Montalvo	INT-5600	12:47–24:00	No maniobrar interruptor de acoplamiento SE Montalvo 220 kV.
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h

…

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 43 · 24/10 al 30/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 43	57.3 -13%	13.8	18.3	-24%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 43	76.9 -31%	114.9	138.0	-17%	103.7 (02/11) -5%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 43	7.4 +1%	144.9	173.3	-16%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 43	11.8 -38%	19.4	11.2	+73%	19.2 (02/11) +69%	387.2 MW
Chaglla	sem. 43	44.3 -35%	2.5	7.8	-67%	4.2 (02/11) -50%	456.4 MW

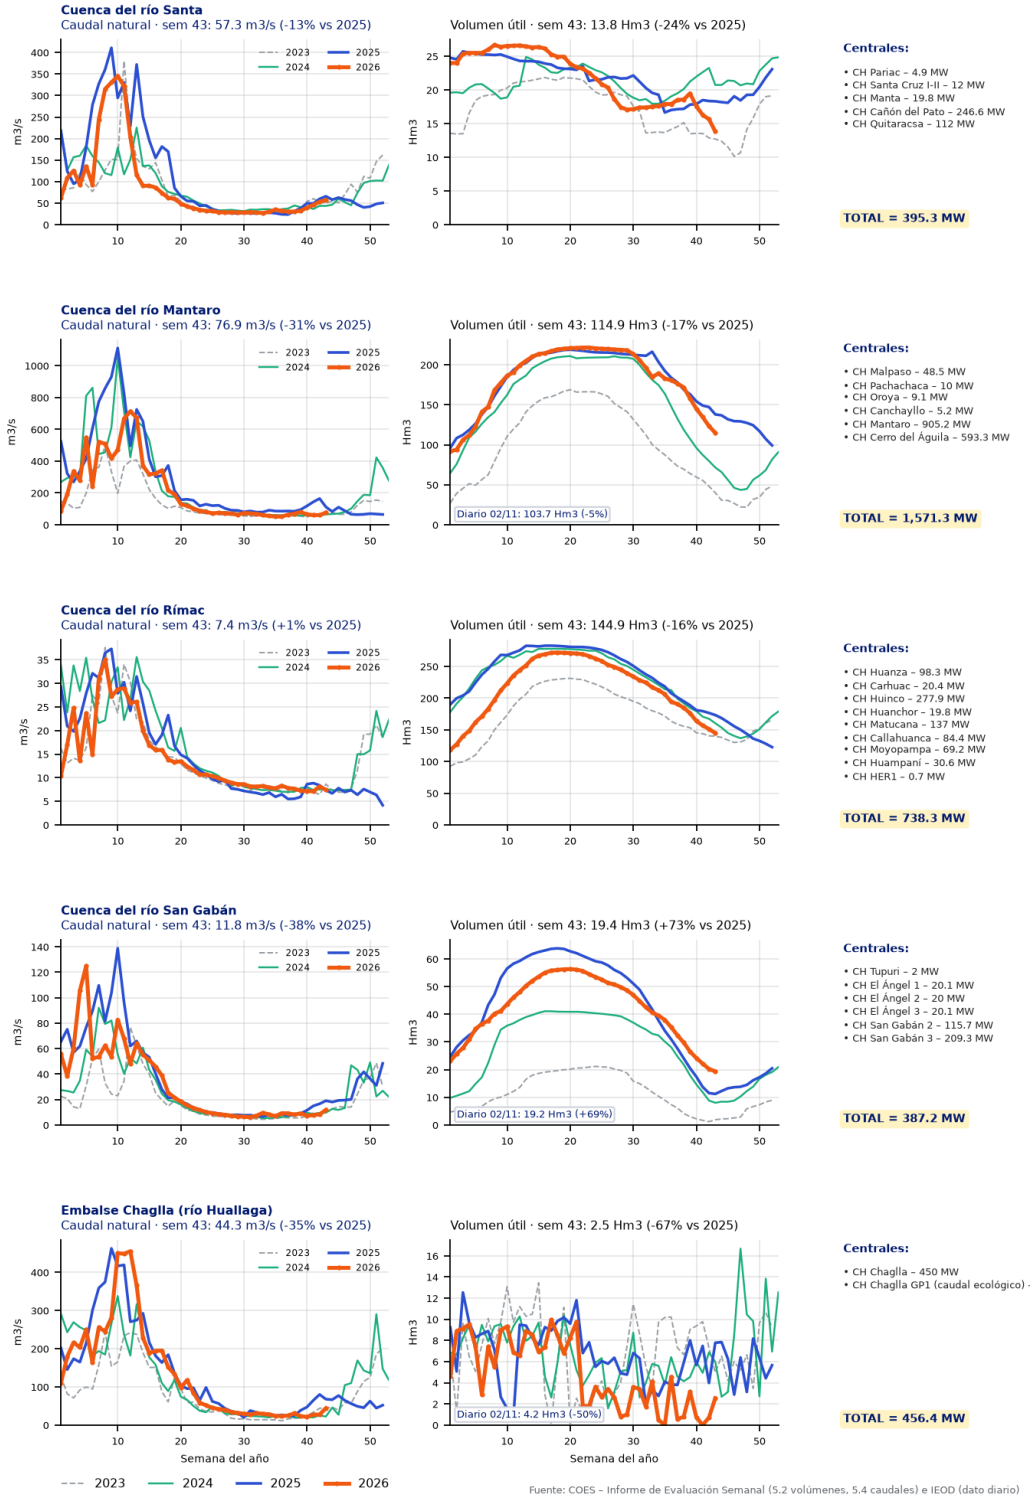

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · martes 3 de noviembre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (10 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	217.1	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	TG7	00:00–20:00	120.0	1. Reparación de daño estructural a la chimenea de TG7. 2. Inspección Boroscópica de Turbina TG7.
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G2	07:00–24:00	48.0	Instalación de repuestos de interruptor de potencia.
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Statkraft S.A	Yaupi	G5	08:00–24:00	21.0	MANTENIMIENTO UH G5
Empresa De Generacion Electrica Santa Ana S.A.C.	Renovandes H1	G1	00:00–24:00	20.0	Mantenimiento del Generador grupo G1 Renovandes H1: cambio de inyector Nº2.
Empresa De Generacion Electrica Santa Ana S.A.C.	Renovandes H1	G1	00:00–24:00	20.0	Mantenimiento del generador del grupo G1 de Renovandes H1: inspección de las descargas parciales y pruebas eléctricas en el generador.
Agro Industrial Paramonga S.A.	Paramonga	CENTRAL	00:00–24:00	14.0	Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	00:00–18:00	6.4	F/S POR INSPECCION EN RODETE
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Egasa	Charcani I	CENTRAL	06:00–24:00	1.6	Mantenimiento Canal CH I a CH II
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	La Gringa V	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 67000 HRS
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Doña Catalina	G1	00:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 51000 HRS
Egasa	Charcani II	CENTRAL	06:00–17:00	0.6	Mantenimiento Canal CH I a CH II

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2076	220	Minera Cerro Verde	San Luis - San Carlos	07:30–17:00	F/S	Por motivos de seguridad del personal (debido a los trabajos de reubicación de las líneas L-2075 y L-2076) y eliminar to
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2112	220	Pluz Energía Perú S.A.A.	Carabayllo - Mirador 220 (Terna 1)	08:00–17:00	F/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679)
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
